


Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2


BA12			BA13			B14			BA15			BA16			BA17			BA18		
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13	D 7	R8	D 8	K17	D 9	R10	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2
K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		B1
R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7		K15		R9		K19		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7		

✓ 14 Kelchstützen, 20 Kelchfüße, 6 Restkelche ✓

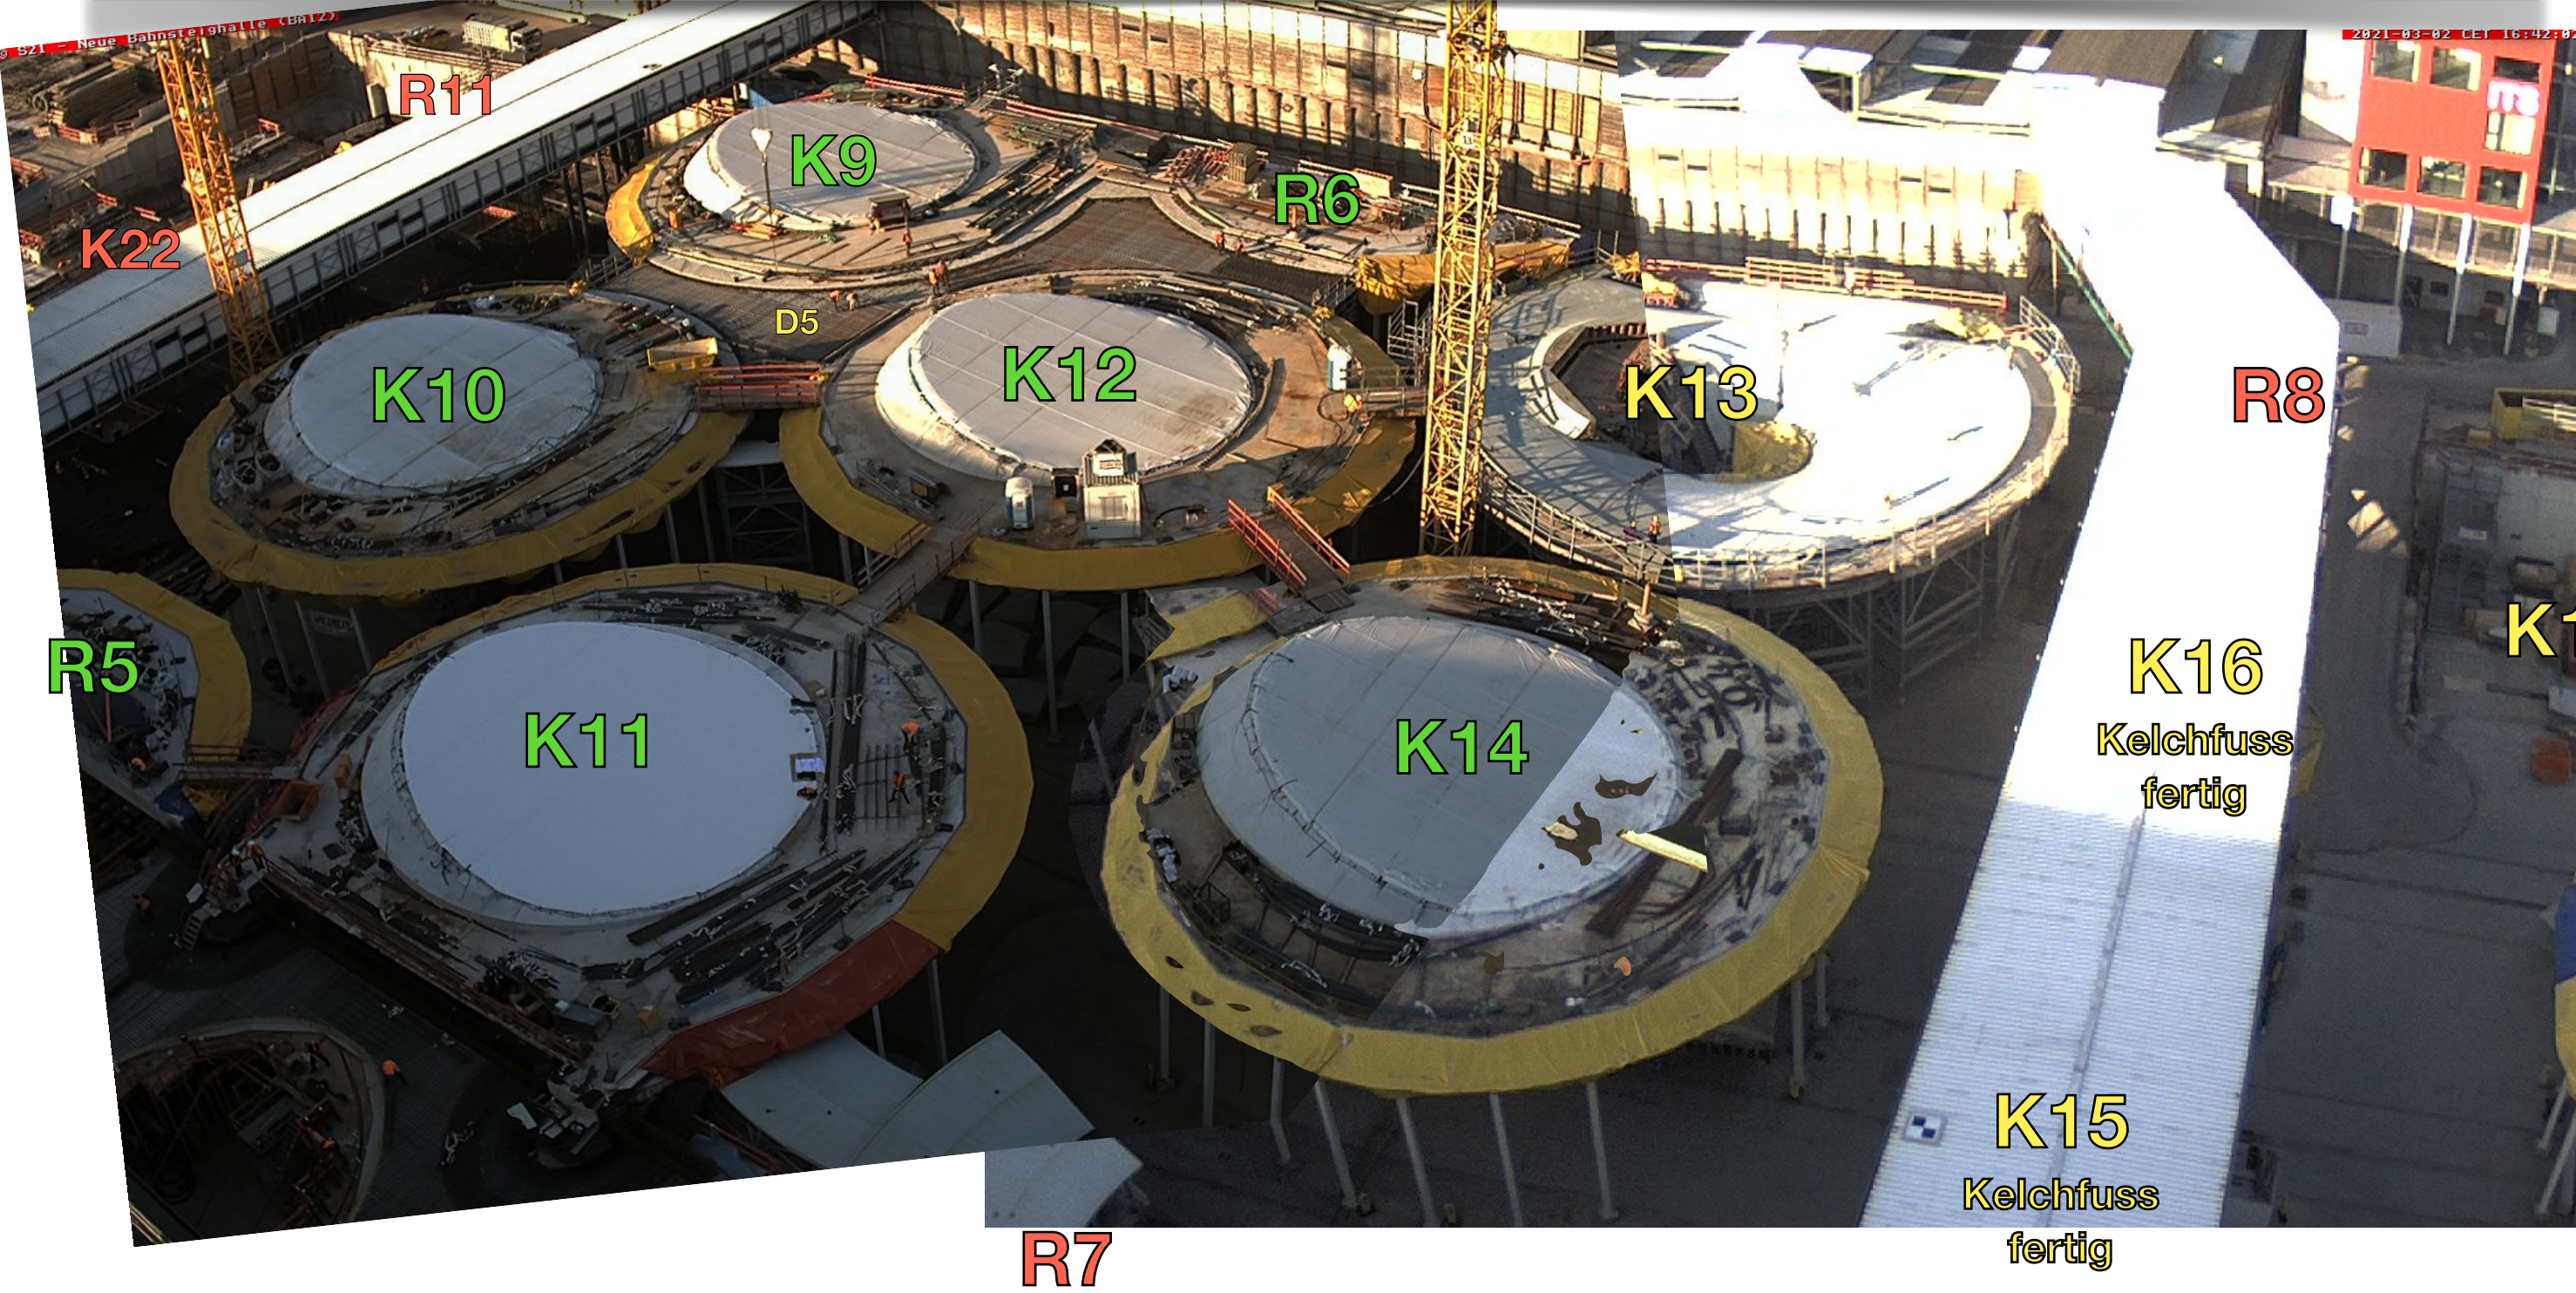

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

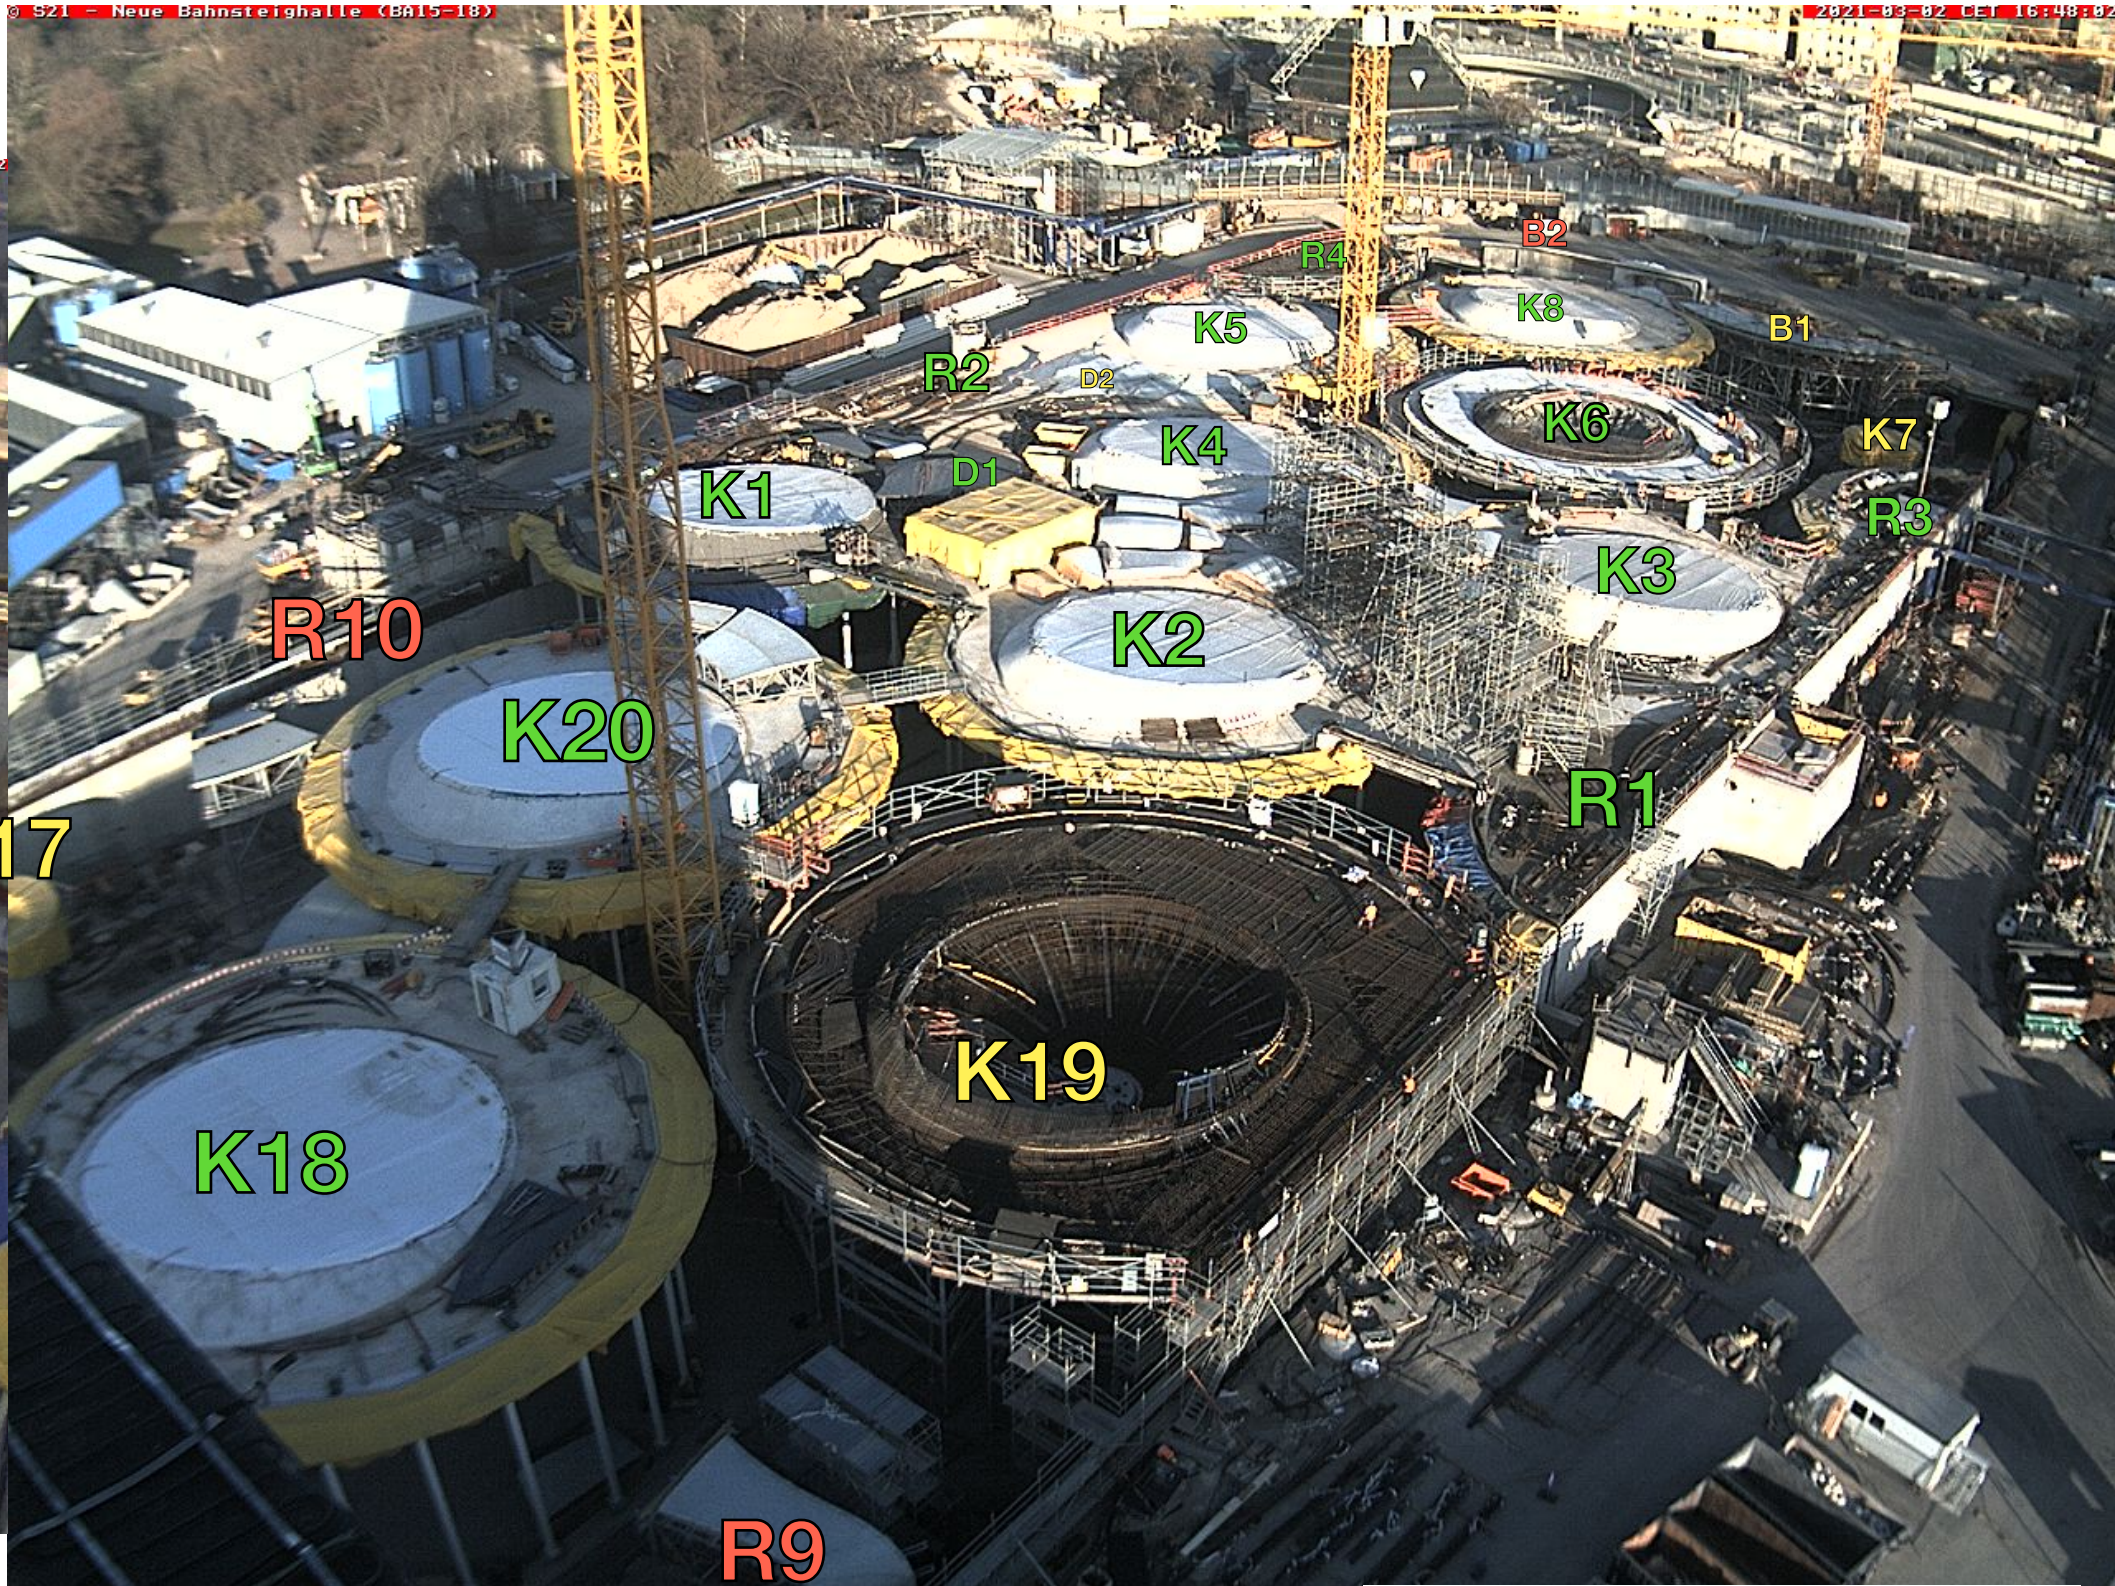

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch

03. März 2021



Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 K21-K28 R11-R14 B3 u. B4

BA11: Spannbetonbrücken

Gleis:	8		7	6		5	4		3	2		1
Bahnsteig:												
		4			3		2				1	

D11				
R11		K22		K21
D12				
K23		SK24		R12
D13				
R13		K26		K25
D14				
K27		K28		R14
D15				
	B4		B3	



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>



Beschriftung durch S21Bau.TV

08. März 2021

🤫 **Rot: nicht begonnen**

 **Gelb: wird gebaut**

 **Grün: ist betoniert**

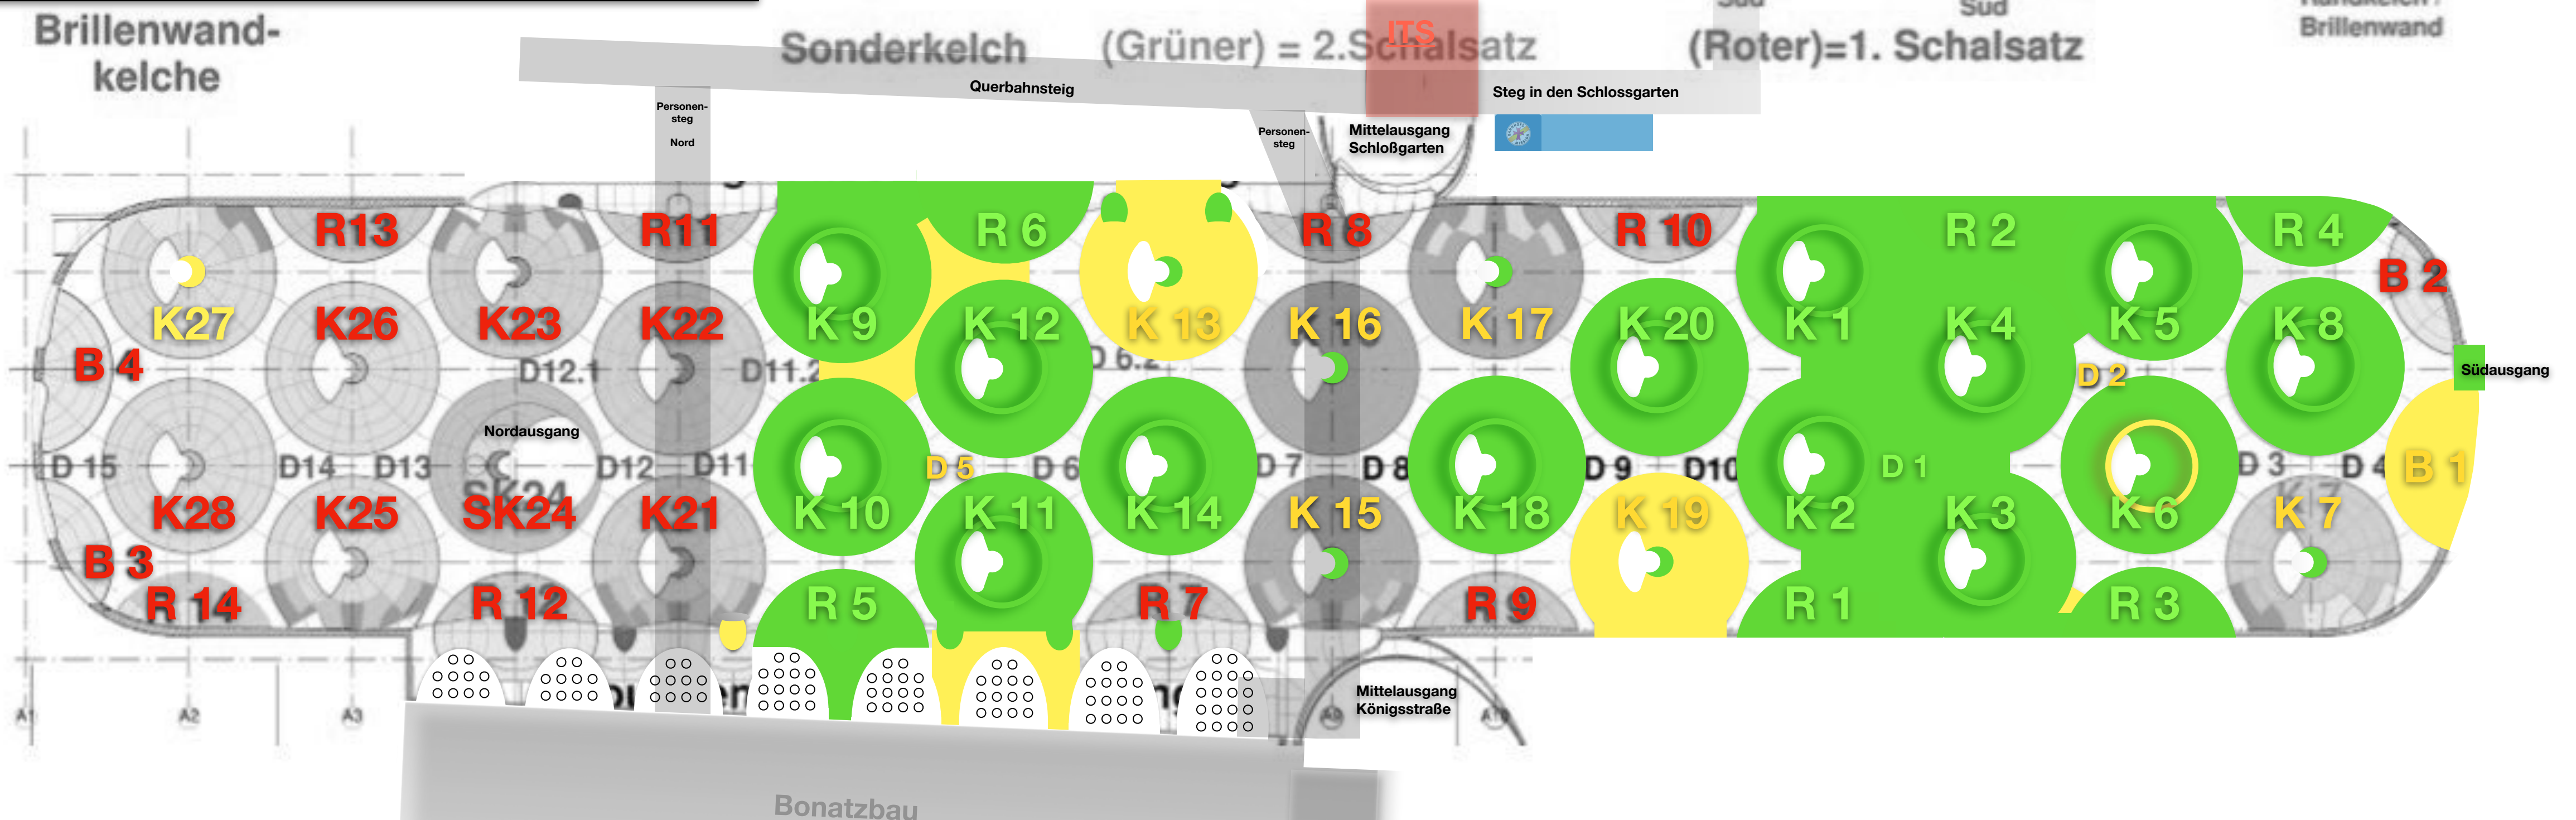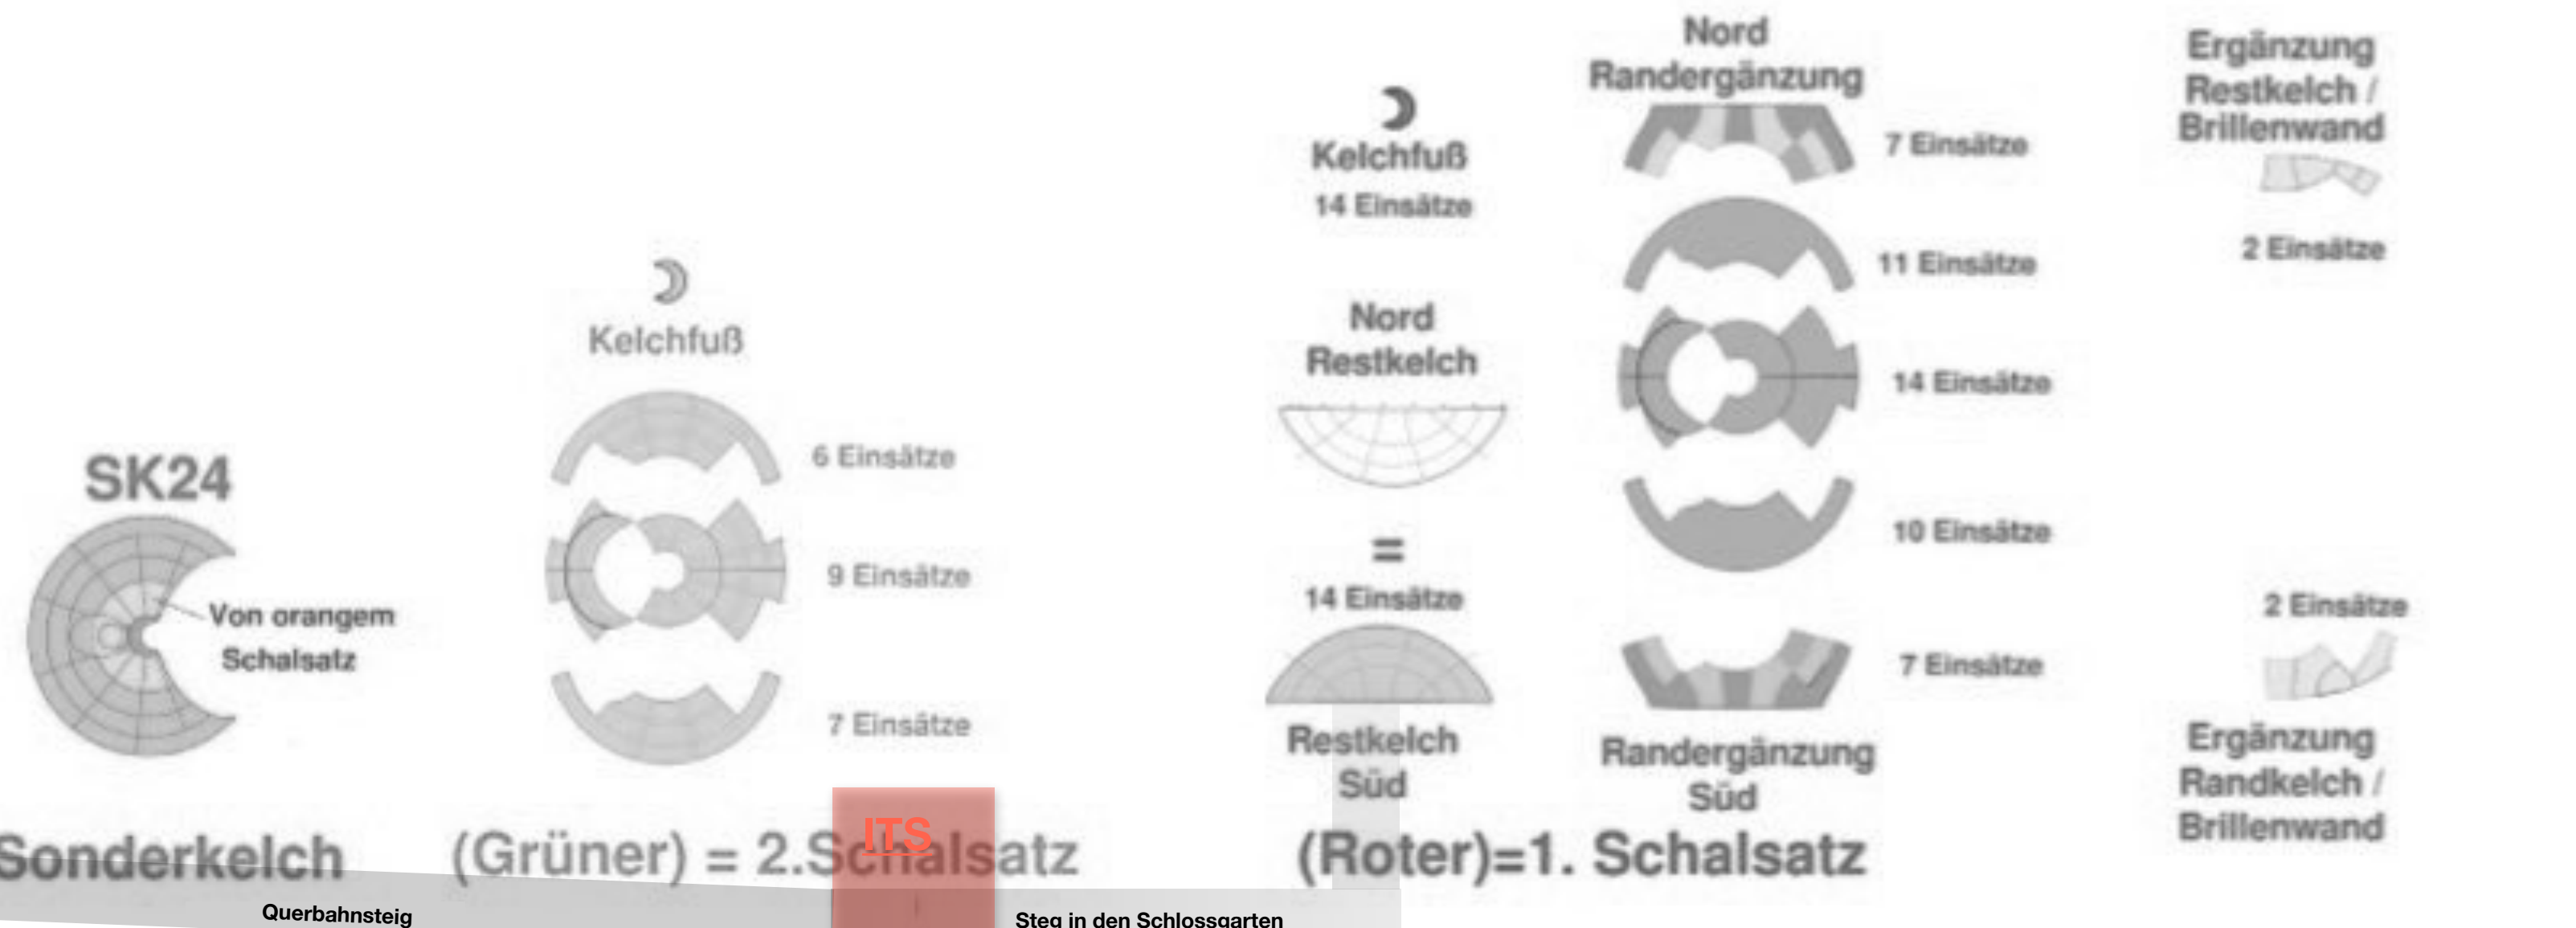

Betonage der Kelchblüten, Restkelche und Schwindgassen

	Kelchblüte		Kelchfuß / Hutze		Restkelch			Schwindgasse	
1	K1	20. Oktober 2018	✓ / ✓	1	R1	30. Juni 2018	1	D1	20. Januar 2021
2	K10	9. März 2019	✓ / ✓	2	R2	8. Dezember 2018	2	D2	
3	K2	16. April 2019	✓ / ✓	3	R6	15. Februar 2020	3	D5	
4	K3	7. September 2019	✓ / ✓	4	R3	11. Juli 2020	4		
5	K9	26. Oktober 2019	✓ / ✓	5	R5	30. Oktober 2020	5		
6	K14	14. Dezember 2019	✓ / ✓	6	R4	3. März 2021	6		
7	K4	1. Februar 2020	✓ / ✓	7			7		
8	K8	2. Mai 2020	✓ / ✓	8			8		
9	K12	30. Mai 2020	✓ / ✓	9			9		
10	K18	27. Juni 2020	✓ / ✓	10			10		
11	K5	5. September 2020	✓ / ✓	11					
12	K20	18. November 2020	✓ / ✓	12					
13	K11	16. Dezember 2020	✓ / ✓ 29.1.2021	13					
14	K6	Bergfest !!! 27. Februar 2021	✓ / → SOON	14					
15	K19		✓						
16	K13		✓						
17	K7		✓						
18	K17		✓		Brillenwandkelch				
19	K27		→ SOON						
20	K16		✓	1	B1				
21	K15		✓	2	B2				
22	K28			3					
23	K25			4					
24									
25									
26							08. März 2021		
27									
28									

Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:

08. März 2021



	BA 1	Südliche Hälfte fertig ☒ Nördlicher Teil: Deckenplatte ist gebaut ☒ Anschluss ans Runde und Schwallbauwerk braucht noch.
☒	BA 2	
☒	BA 3	
☒	BA 4-7	...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.
☒	BA 8	

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:

	BA 9	Bodenplatte fertig, eine Seitenwand fehlt noch.
	BA 10	Baulogrampe, Armierung auf Seite Bonatzbau hat begonnen.
	BA 11	liegt über der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig. Die Spannbronbrücken werden gebaut. Bodenplatte südlicher Teil wird armiert.
	BA 12	
	BA 13	
	BA 14	
	BA 15	
☒	BA 16	
	BA 17	
	BA 18	

Südkopf: Bauabschnitt 19-25:

☒	BA 19/20	Ausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden. (Südausgang und Notausgänge)
	BA 21	Im Aushub.
☒	BA 22	...liegt unter der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (und deren Zugangstunnel) und komplett ist fertig.
	BA 23	...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel. Diese werden gerade abgebrochen.
☒	BA 24	Zugangstunnel sind fertig. Schwallbauwerk fehlt noch.
☒	BA 25	



K5

R4

K8


B2

B1

K6

K7

R3

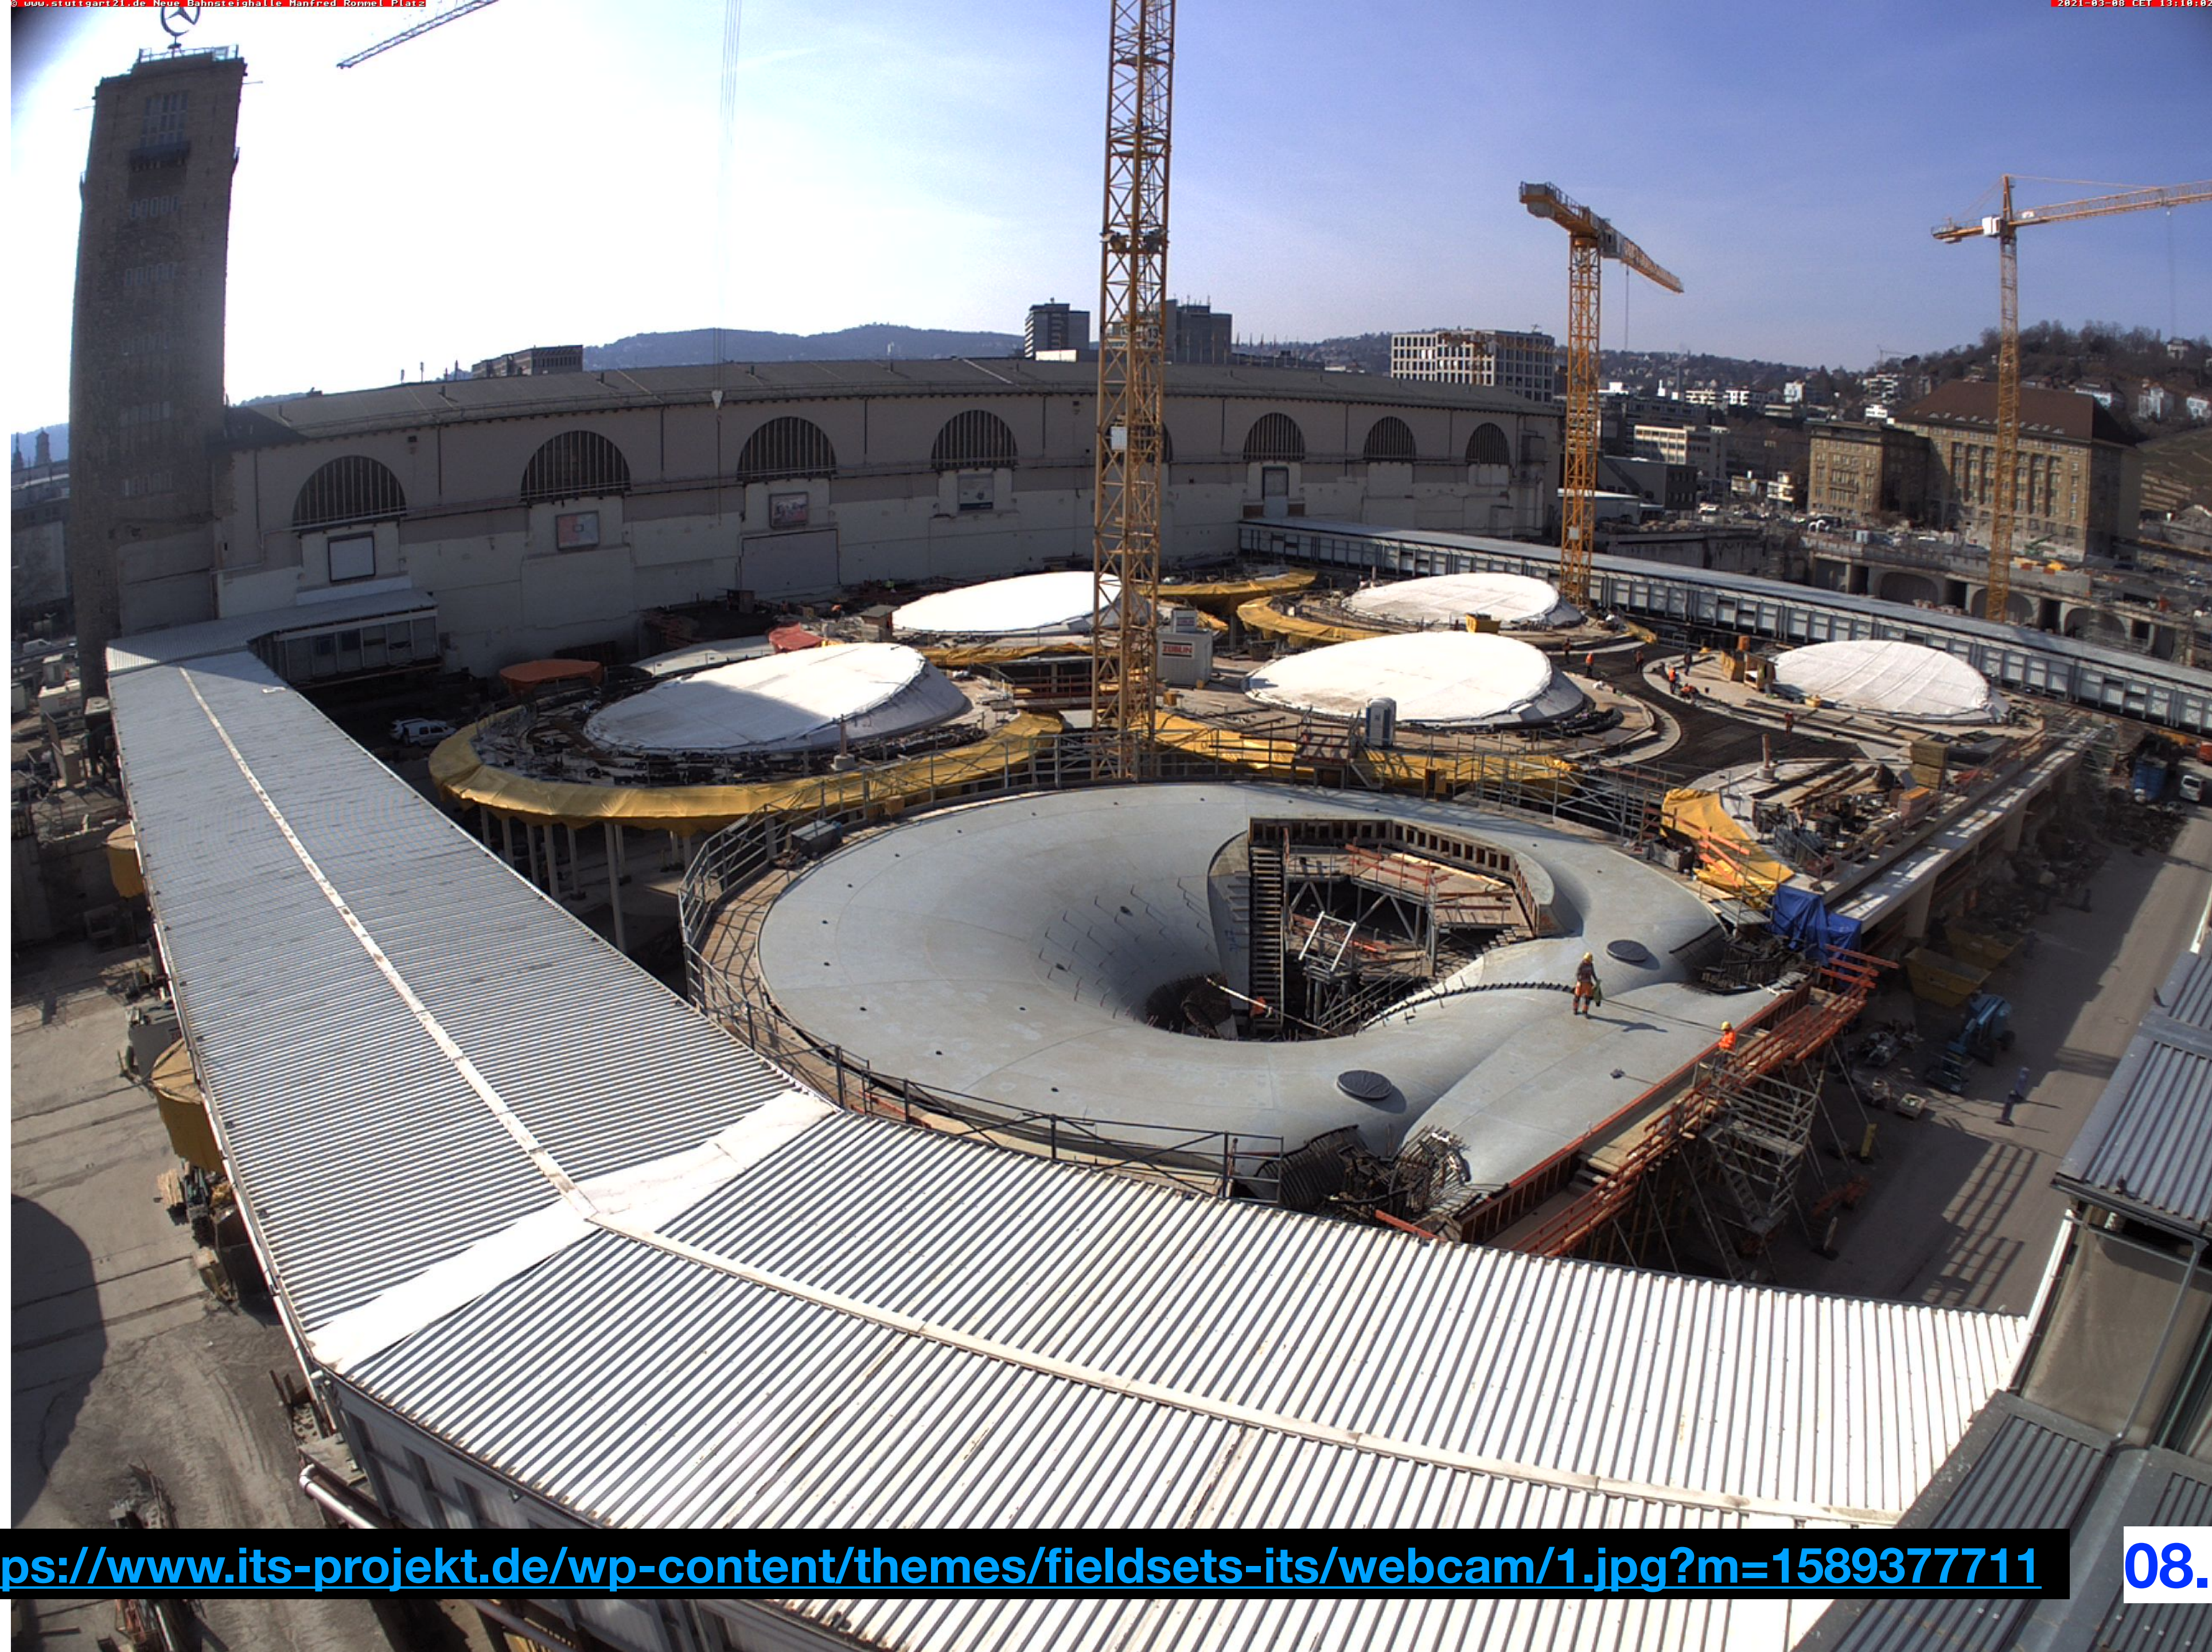


<https://www.its-projekt.de/wp-content/themes/fieldsets-its/webcam/1.jpg?m=1589377711>

08. März 2021





08. März 2021

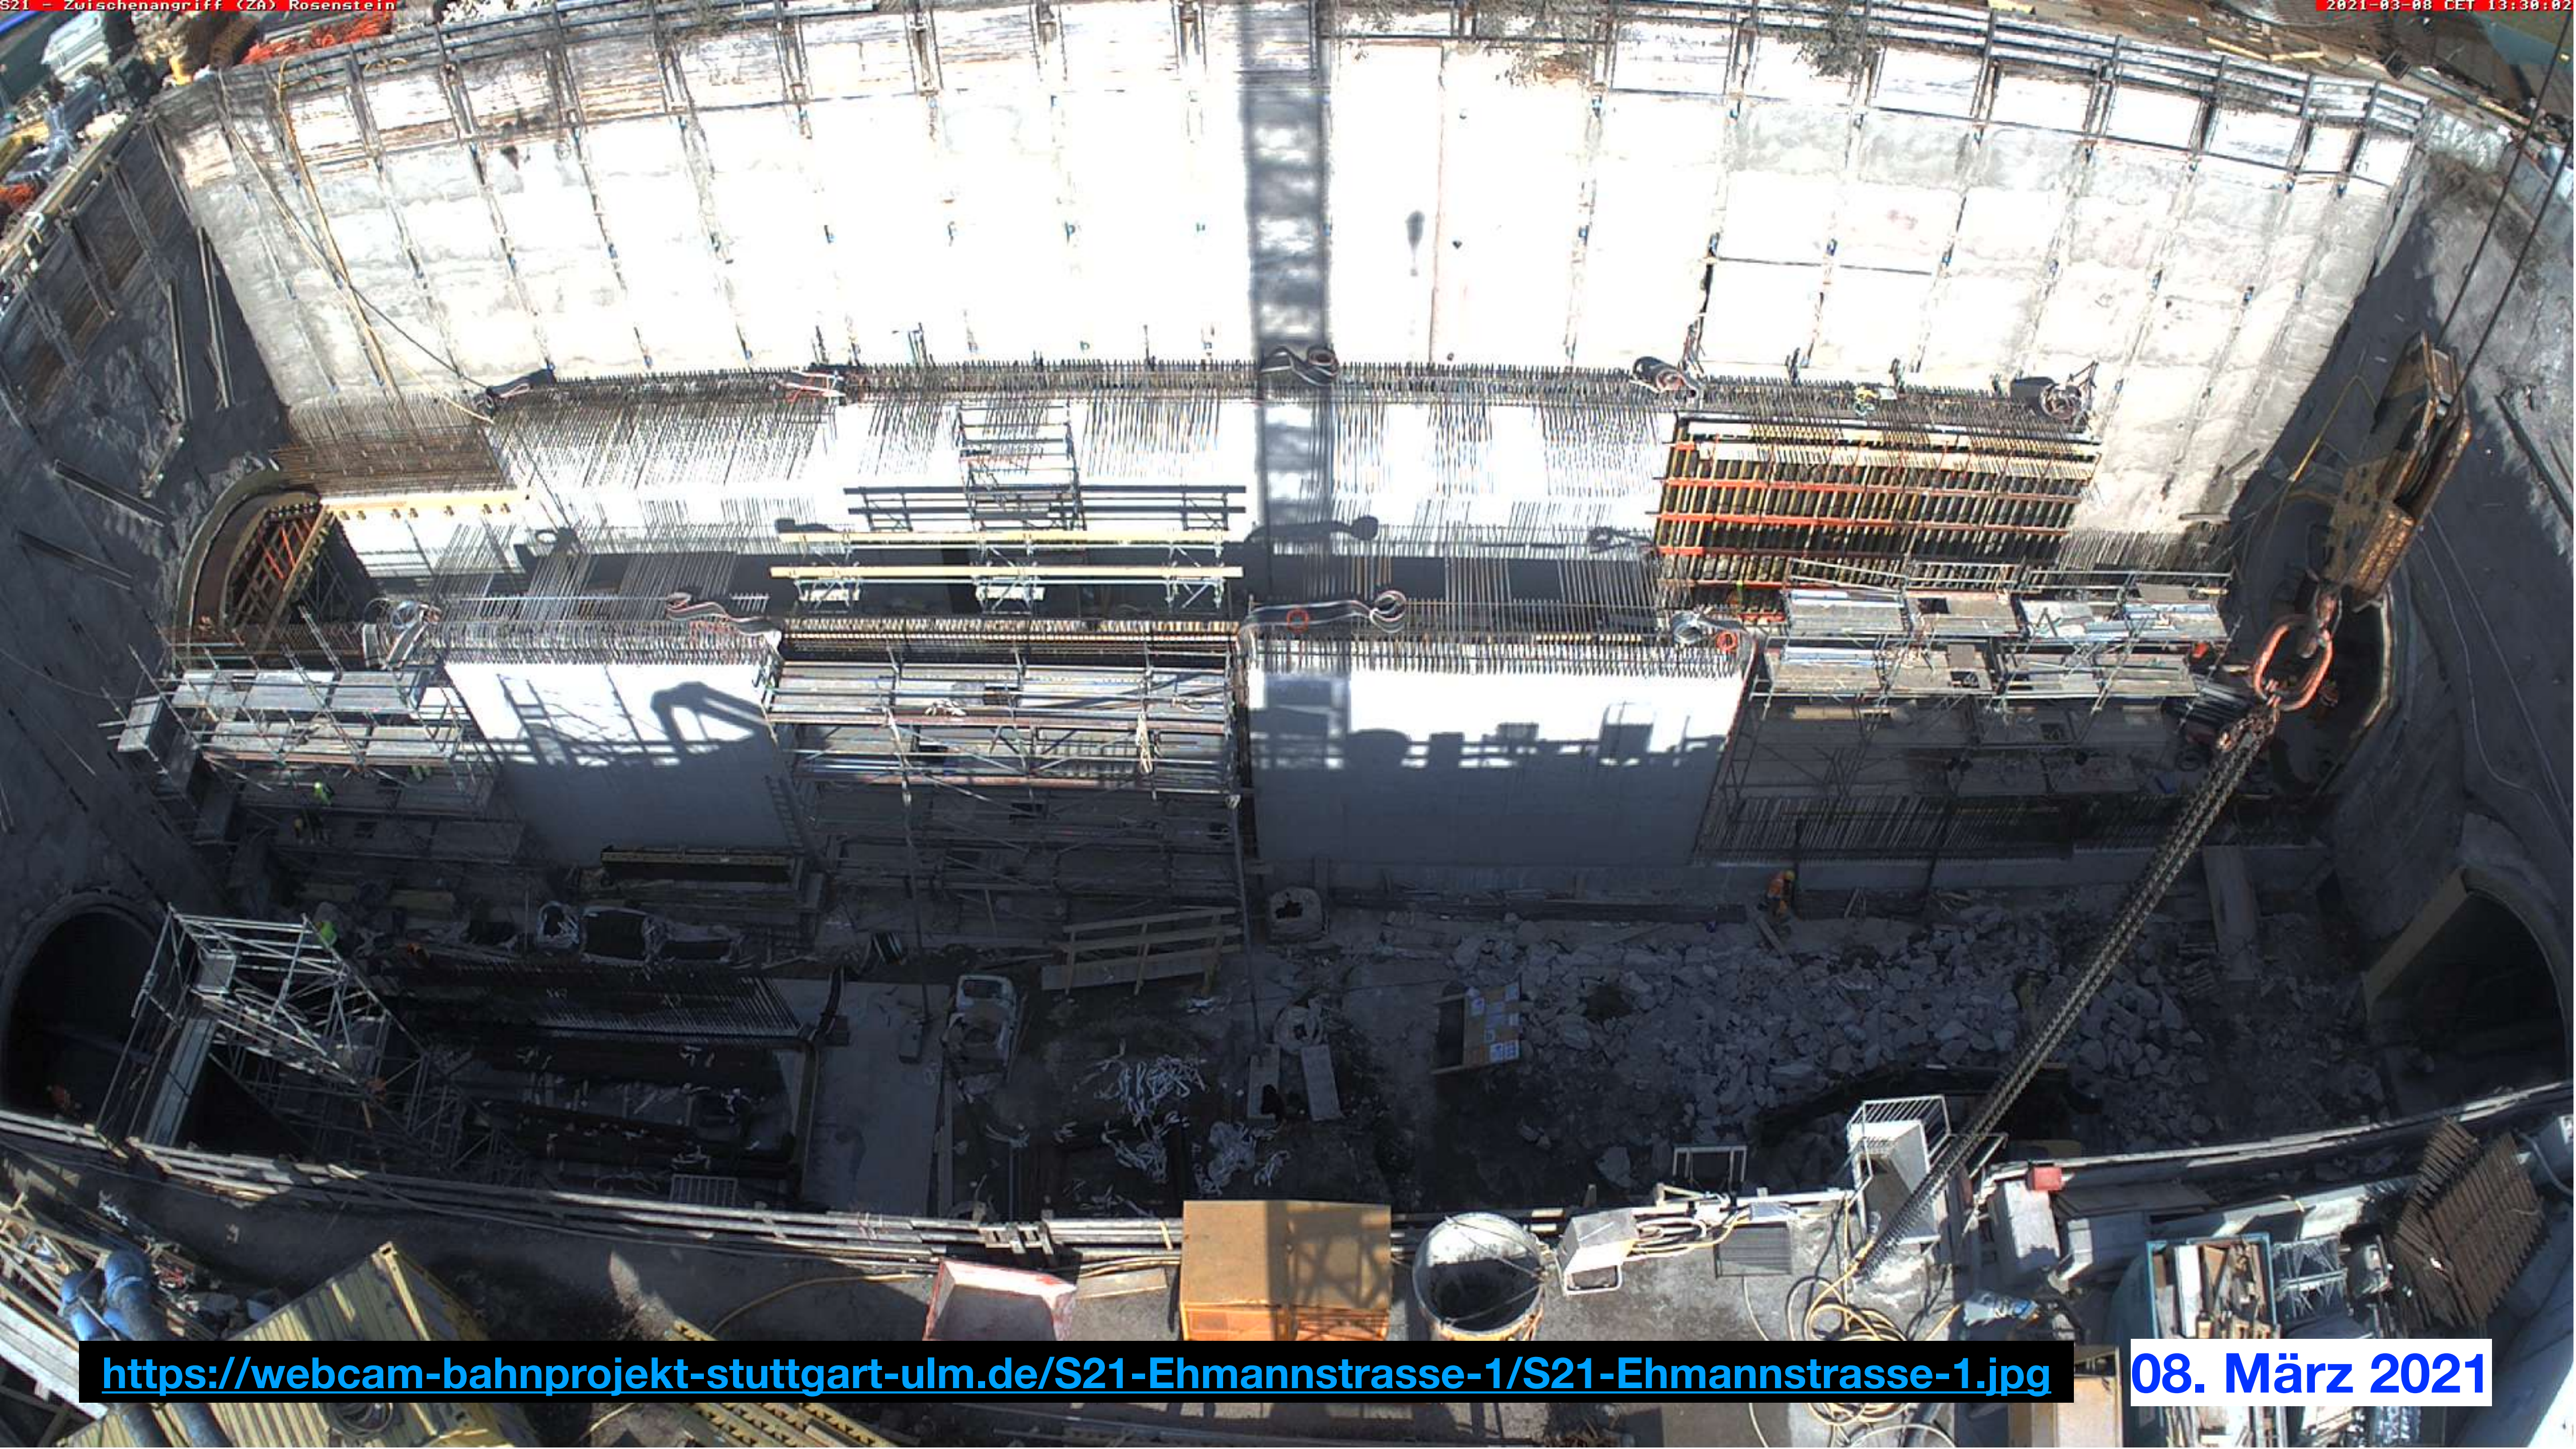

Backup: Original Schalungsfolie

B3=B 2
2 Einsätze

B4=B 1
2 Einsätze

Brillenwand-
kelche

Kelchfuß

3 Einsätze
4 Einsätze
3 Einsätze

(Oranger) =
3. Schalsatz

SK24

Von orangem
Schalsatz

Sonderkelch

Kelchfuß

6 Einsätze
9 Einsätze
7 Einsätze

(Grüner) = 2. Schalsatz

Kelchfuß
14 Einsätze

Nord
Restkelch

=
14 Einsätze

Restkelch
Süd

(Roter)=1. Schalsatz

Nord
Randergänzung

7 Einsätze

11 Einsätze

14 Einsätze

10 Einsätze

7 Einsätze

Randergänzung
Süd


Ergänzung
Restkelch /
Brillenwand

2 Einsätze

Ergänzung
Randkelch /
Brillenwand

2 Einsätze

Loungen noch in Abstimmung

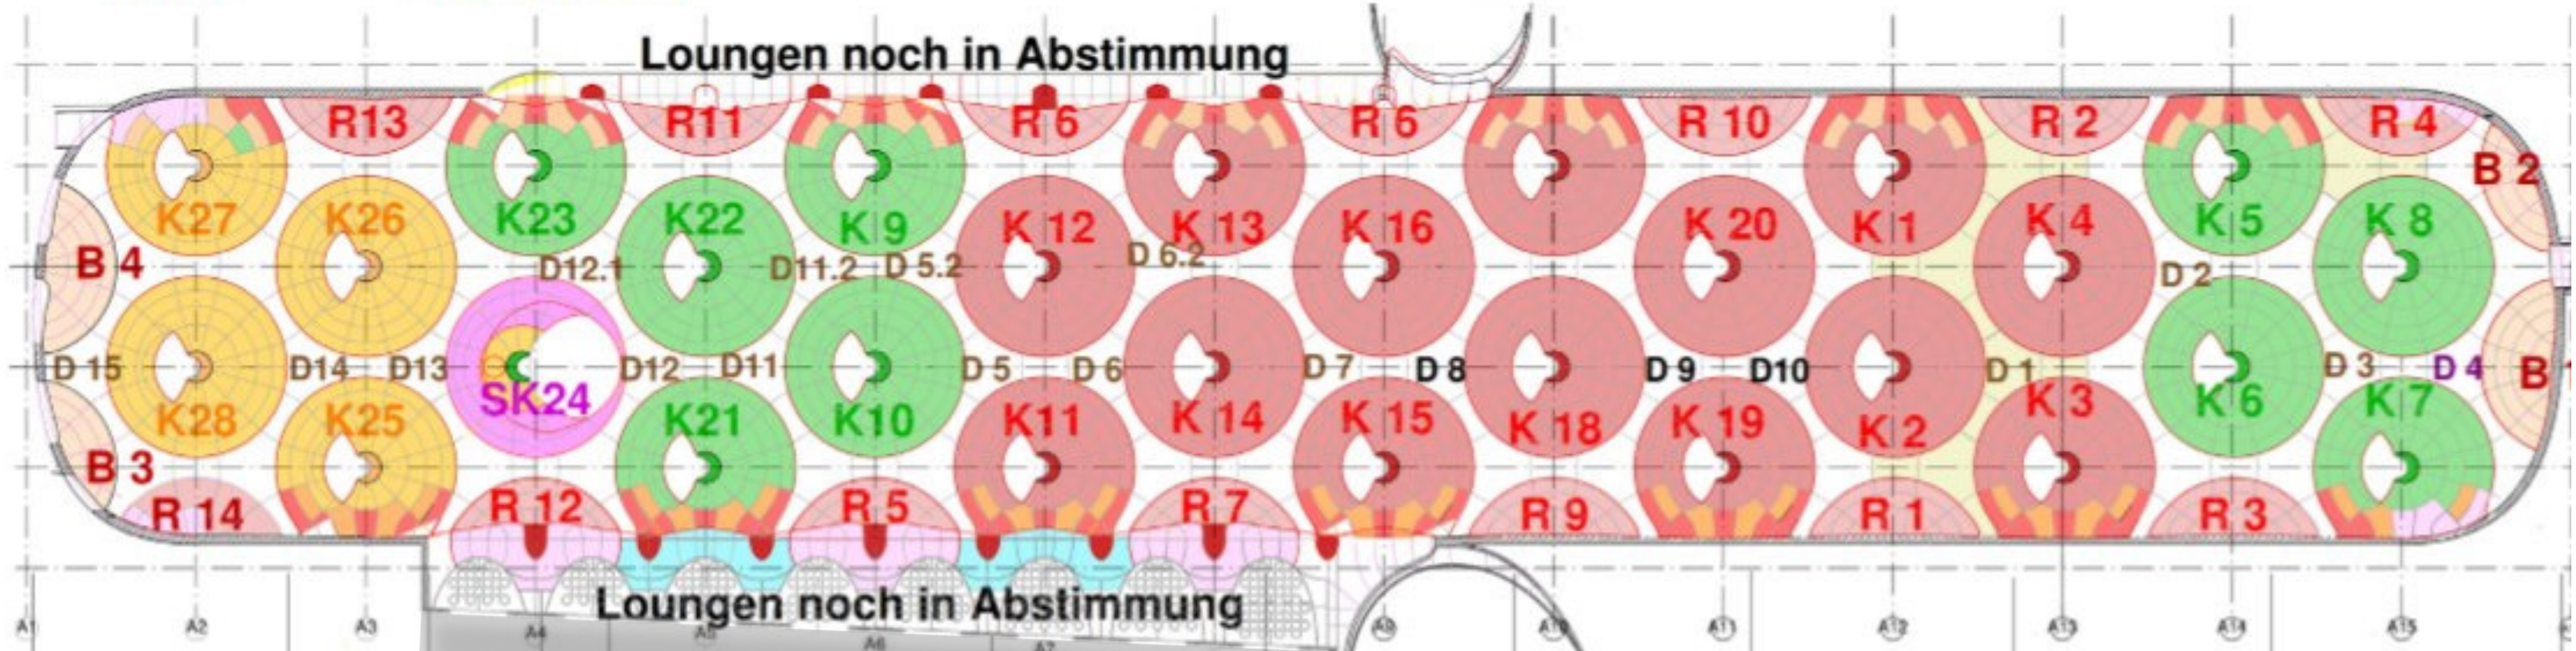

Bonatzbau
