



Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2

BA12			BA13			B14			BA15			BA16			BA17			BA18		
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13	D 7	R8	D 8	K17	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2
K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		
R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7		K15		R9		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7		B1

Gesamt: 15 Kelchstützen, 22 Kelchfüße, 7 Restkelche und eine Schwindgasse

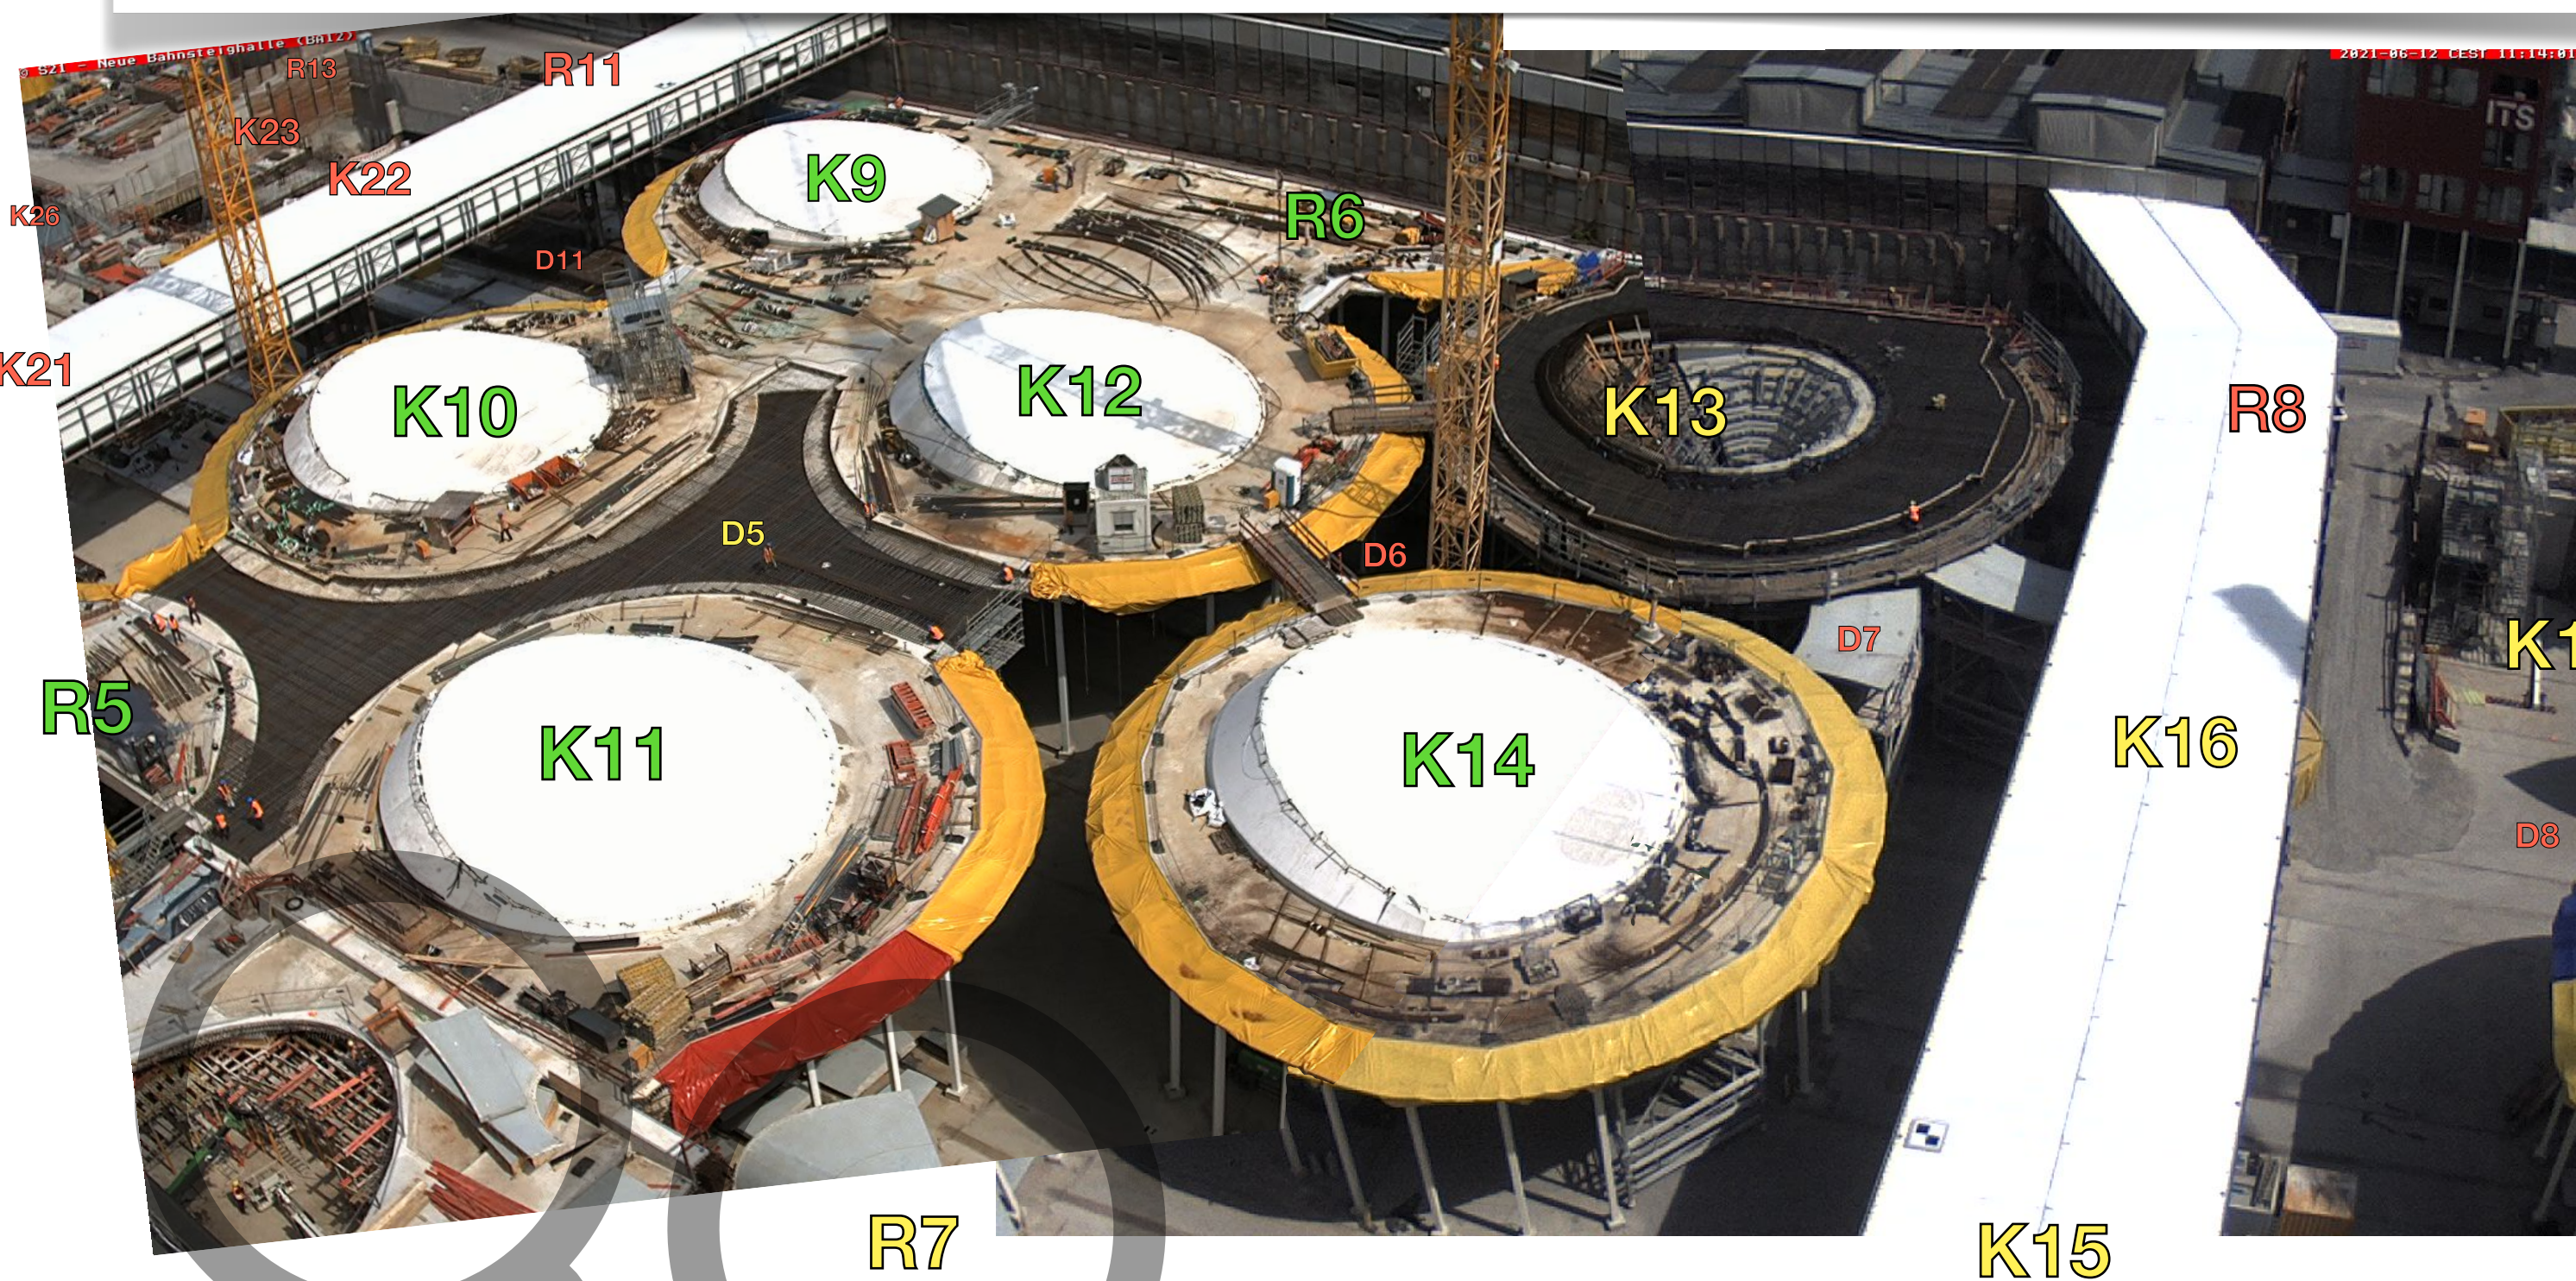

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

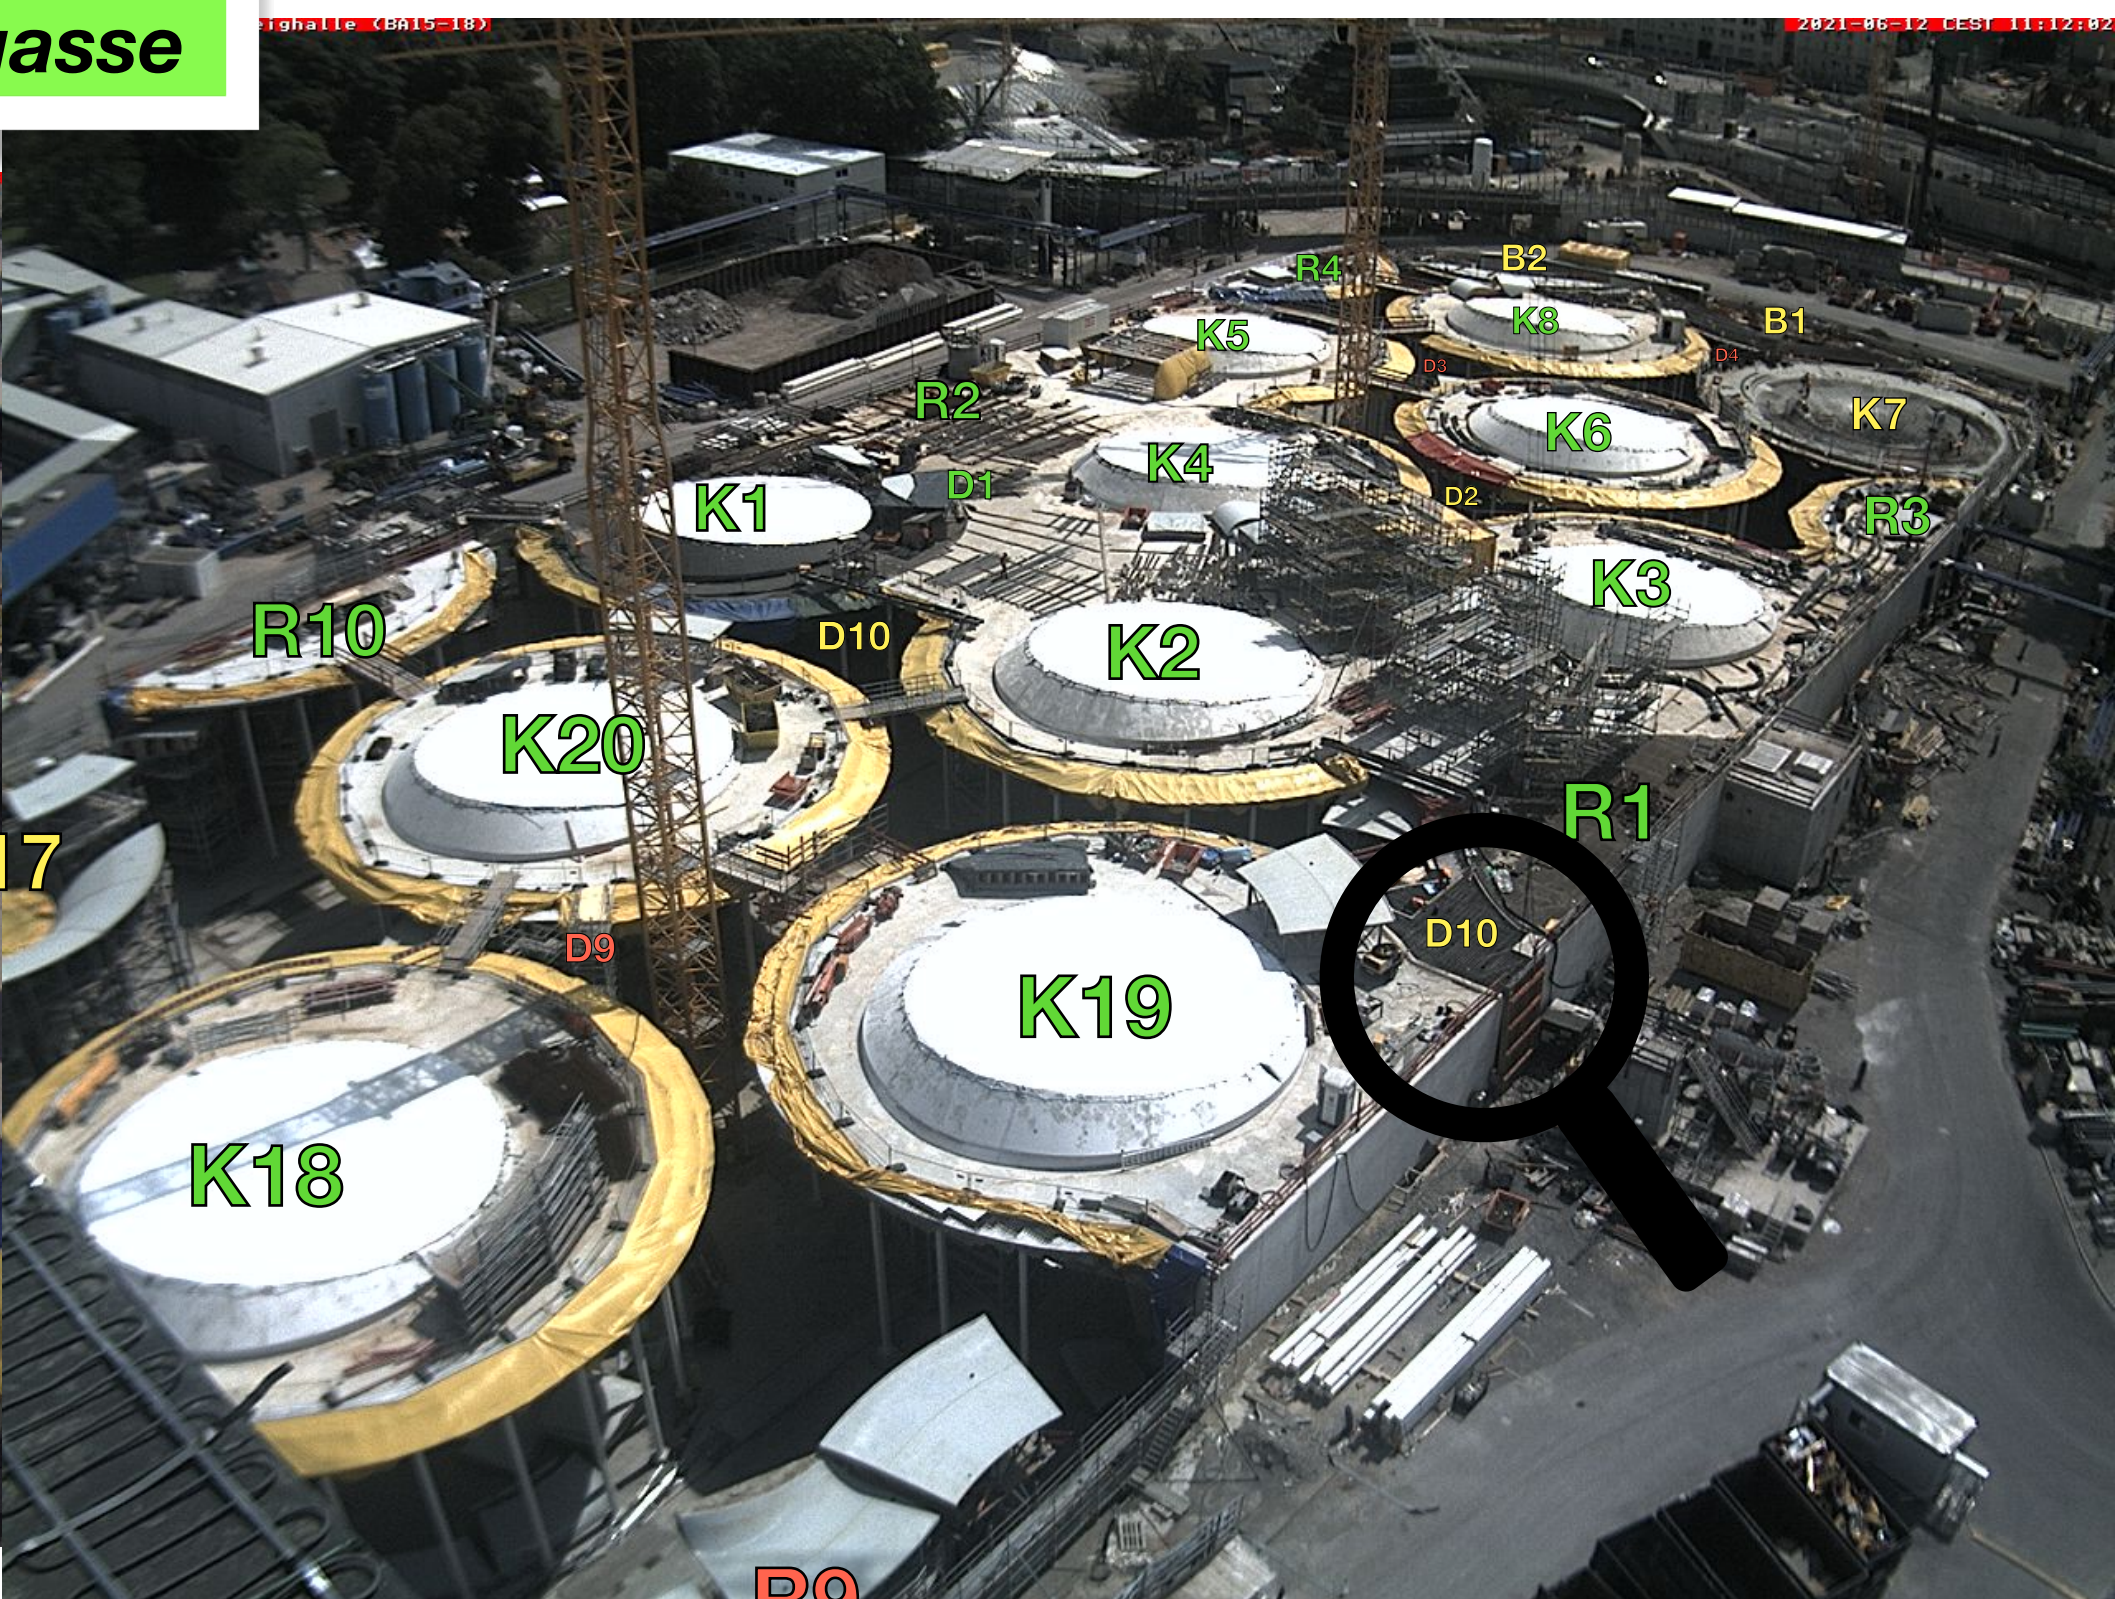

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 13. Juni 2021



Beschriftung durch S21Bau.TV

13. Juni 2021

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

✅ **Gebaut:**

- ➔ 15 Kelchstützen
- ➔ 7 Restkelche ...kleines Bergfest...
- ➔ 0 Brillenwandkelche
- ➔ 22 Kelchfüße
- ➔ 10 Galeriestützen
- ➔ 1 Schwindgasse + $\frac{1}{3}$ D2, $\frac{1}{2}$ D5
- ➔ 3 Lounge-Deckenplattenabschnitte
- ➔ 0 Lounge-Oberlichter

...muss noch: 🚧 davon im Bau:

- 13 K13, K7 und K17
- 7 R7
- 4 B1 und B2
- 6
- 6 Eine bei K15
- 14 D5 zweite Hälfte, D10
- 6
- 8 Eins bei K11



Betonage der Kelche und Schwindgassen

	Kelchblüte			Kelchfuß		Hutze			Restkelch				Schwindgasse		
1	K1	20. Oktober 2018		10.06.2017		28.11.2018		1	R1	30. Juni 2018		1	D1	20. Januar 2021	
2	K10	9. März 2019		19.04.2018		03.04.2019		2	R2	8. Dezember 2018		2	D2		
3	K2	16. April 2019		03.08.2017		22.05.2019		3	R6	15. Februar 2020		3	D5		
4	K3	7. September 2019		20.12.2017		02.10.2019		4	R3	11. Juli 2020		4	D10		
5	K9	26. Oktober 2019		15.05.2018		20.11.2019		5	R5	30. Oktober 2020		5			
6	K14	14. Dezember 2019		12.11.2018		03.02.2020		6	R4	3. März 2021		6			
7	K4	1. Februar 2020		10.10.2017		07.03.2020		7	R10	26. Mai 2021		7			
8	K8	2. Mai 2020		16.12.2019		03.06.2020		8				8			
9	K12	30. Mai 2020		05.11.2019		08.07.2020		9				9			
10	K18	27. Juni 2020		13.02.2020		11.08.2020		10				10			
11	K5	5. September 2020		01.03.2019		15.10.2020		11				11			
12	K20	18. November 2020		09.07.2020		05.12.2020		12				12			
13	K11	16. Dezember 2020		03.06.2020		29.01.2021		13				13			
14	K6	Bergfest 27. Februar 2021		12.04.2019		30.03.2021		14				14			
15	K19	17. April 2021		27.08.2020		12.05.2021						15			
16	K13			15.12.2018											
17	K7			05.12.2020											
18	K17			17.05.2020											
19	K27			29.04.2021											
20	K28			08.06.2021				1	B1						
21	K21							2	B2						
22	K22							3							
23	K23							4							
24	K24														
25	K25														
26	K26														
27	K15			09.05.2019											
28	K16			05.06.2019											
Das Datum kann einige Tage versetzt sein.															

13. Juni 2021

Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:

13. Juni 2021



✓	BA 1	Rohbau Schwallbauwerk Nord ✓
✓	BA 2	
✓	BA 3	
✓	BA 4-7	...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.
✓	BA 8	Wiederherstellung der Rampe für den Kehrtunnel Heilbronner Straße und Freilegung der Notausgänge Nord.

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:

	BA 9	Bodenplatte fertig. Eine Seitenwand fehlt noch.
	BA 10	Baulogrampe: Bodenplatte auf Seite Bonatzbau wird gebaut.
	BA 11	liegt über der S-Bahn und wird mit Spannbetonbrücken überspannt. Bahnsteige 2 und 3 sind komplett. Bei den anderen zwei muss noch die Aussparung betoniert werden.
	BA 12	
	BA 13	
	BA 14	
	BA 15	
✓	BA 16	
	BA 17	
	BA 18	

Südkopf: Bauabschnitt 19-25:

✓	BA 19/20	Südausgang und Notausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.
	BA 21	
✓	BA 22	...liegt unter den Zugangstunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und ist komplett fertig.
	BA 23	...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zugangstunneln. Diese werden gerade abgebrochen.
✓	BA 24	Schwallbauwerk Süd wird gebaut.
✓	BA 25	



K5

D3

R4

K8

B2

D4

B1

K7


K6

R3



<https://www.its-projekt.de/wp-content/themes/fieldsets-its/webcam/1.jpg?m=1589377711>

13. Juni 2021

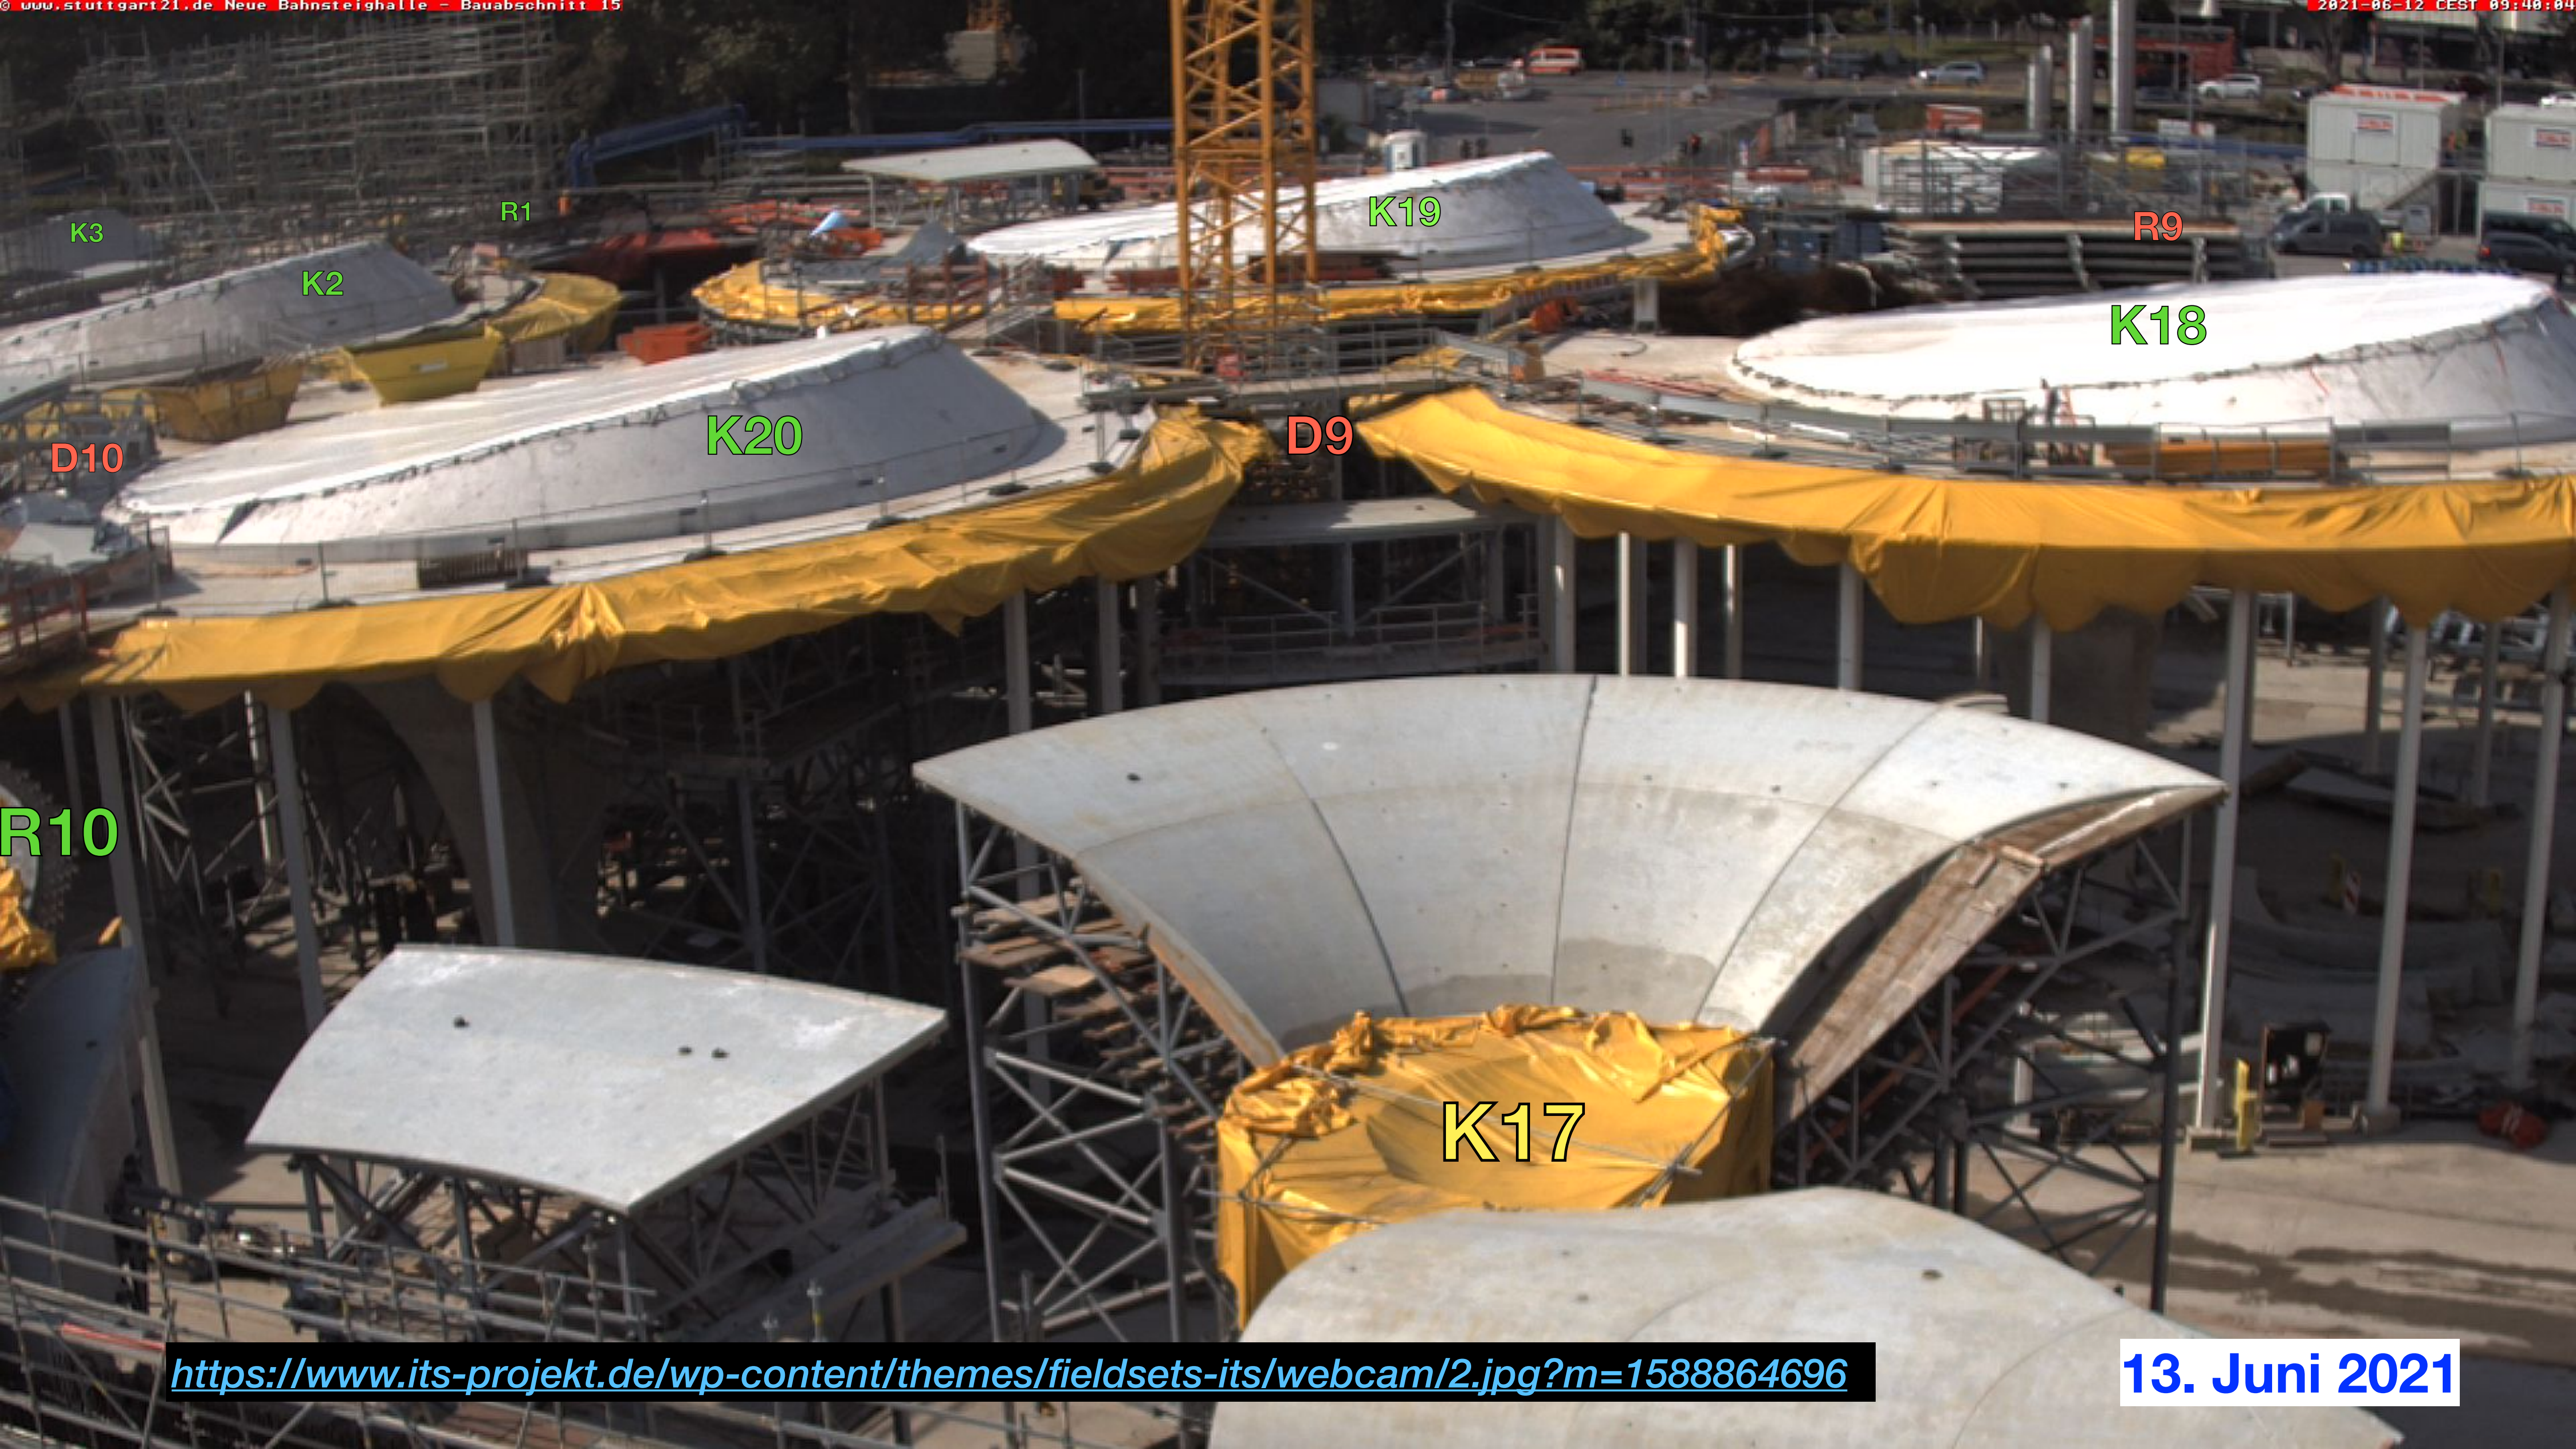

K3

R1

K19

R9

K2

K18


D10

K20

D9

R10

K17

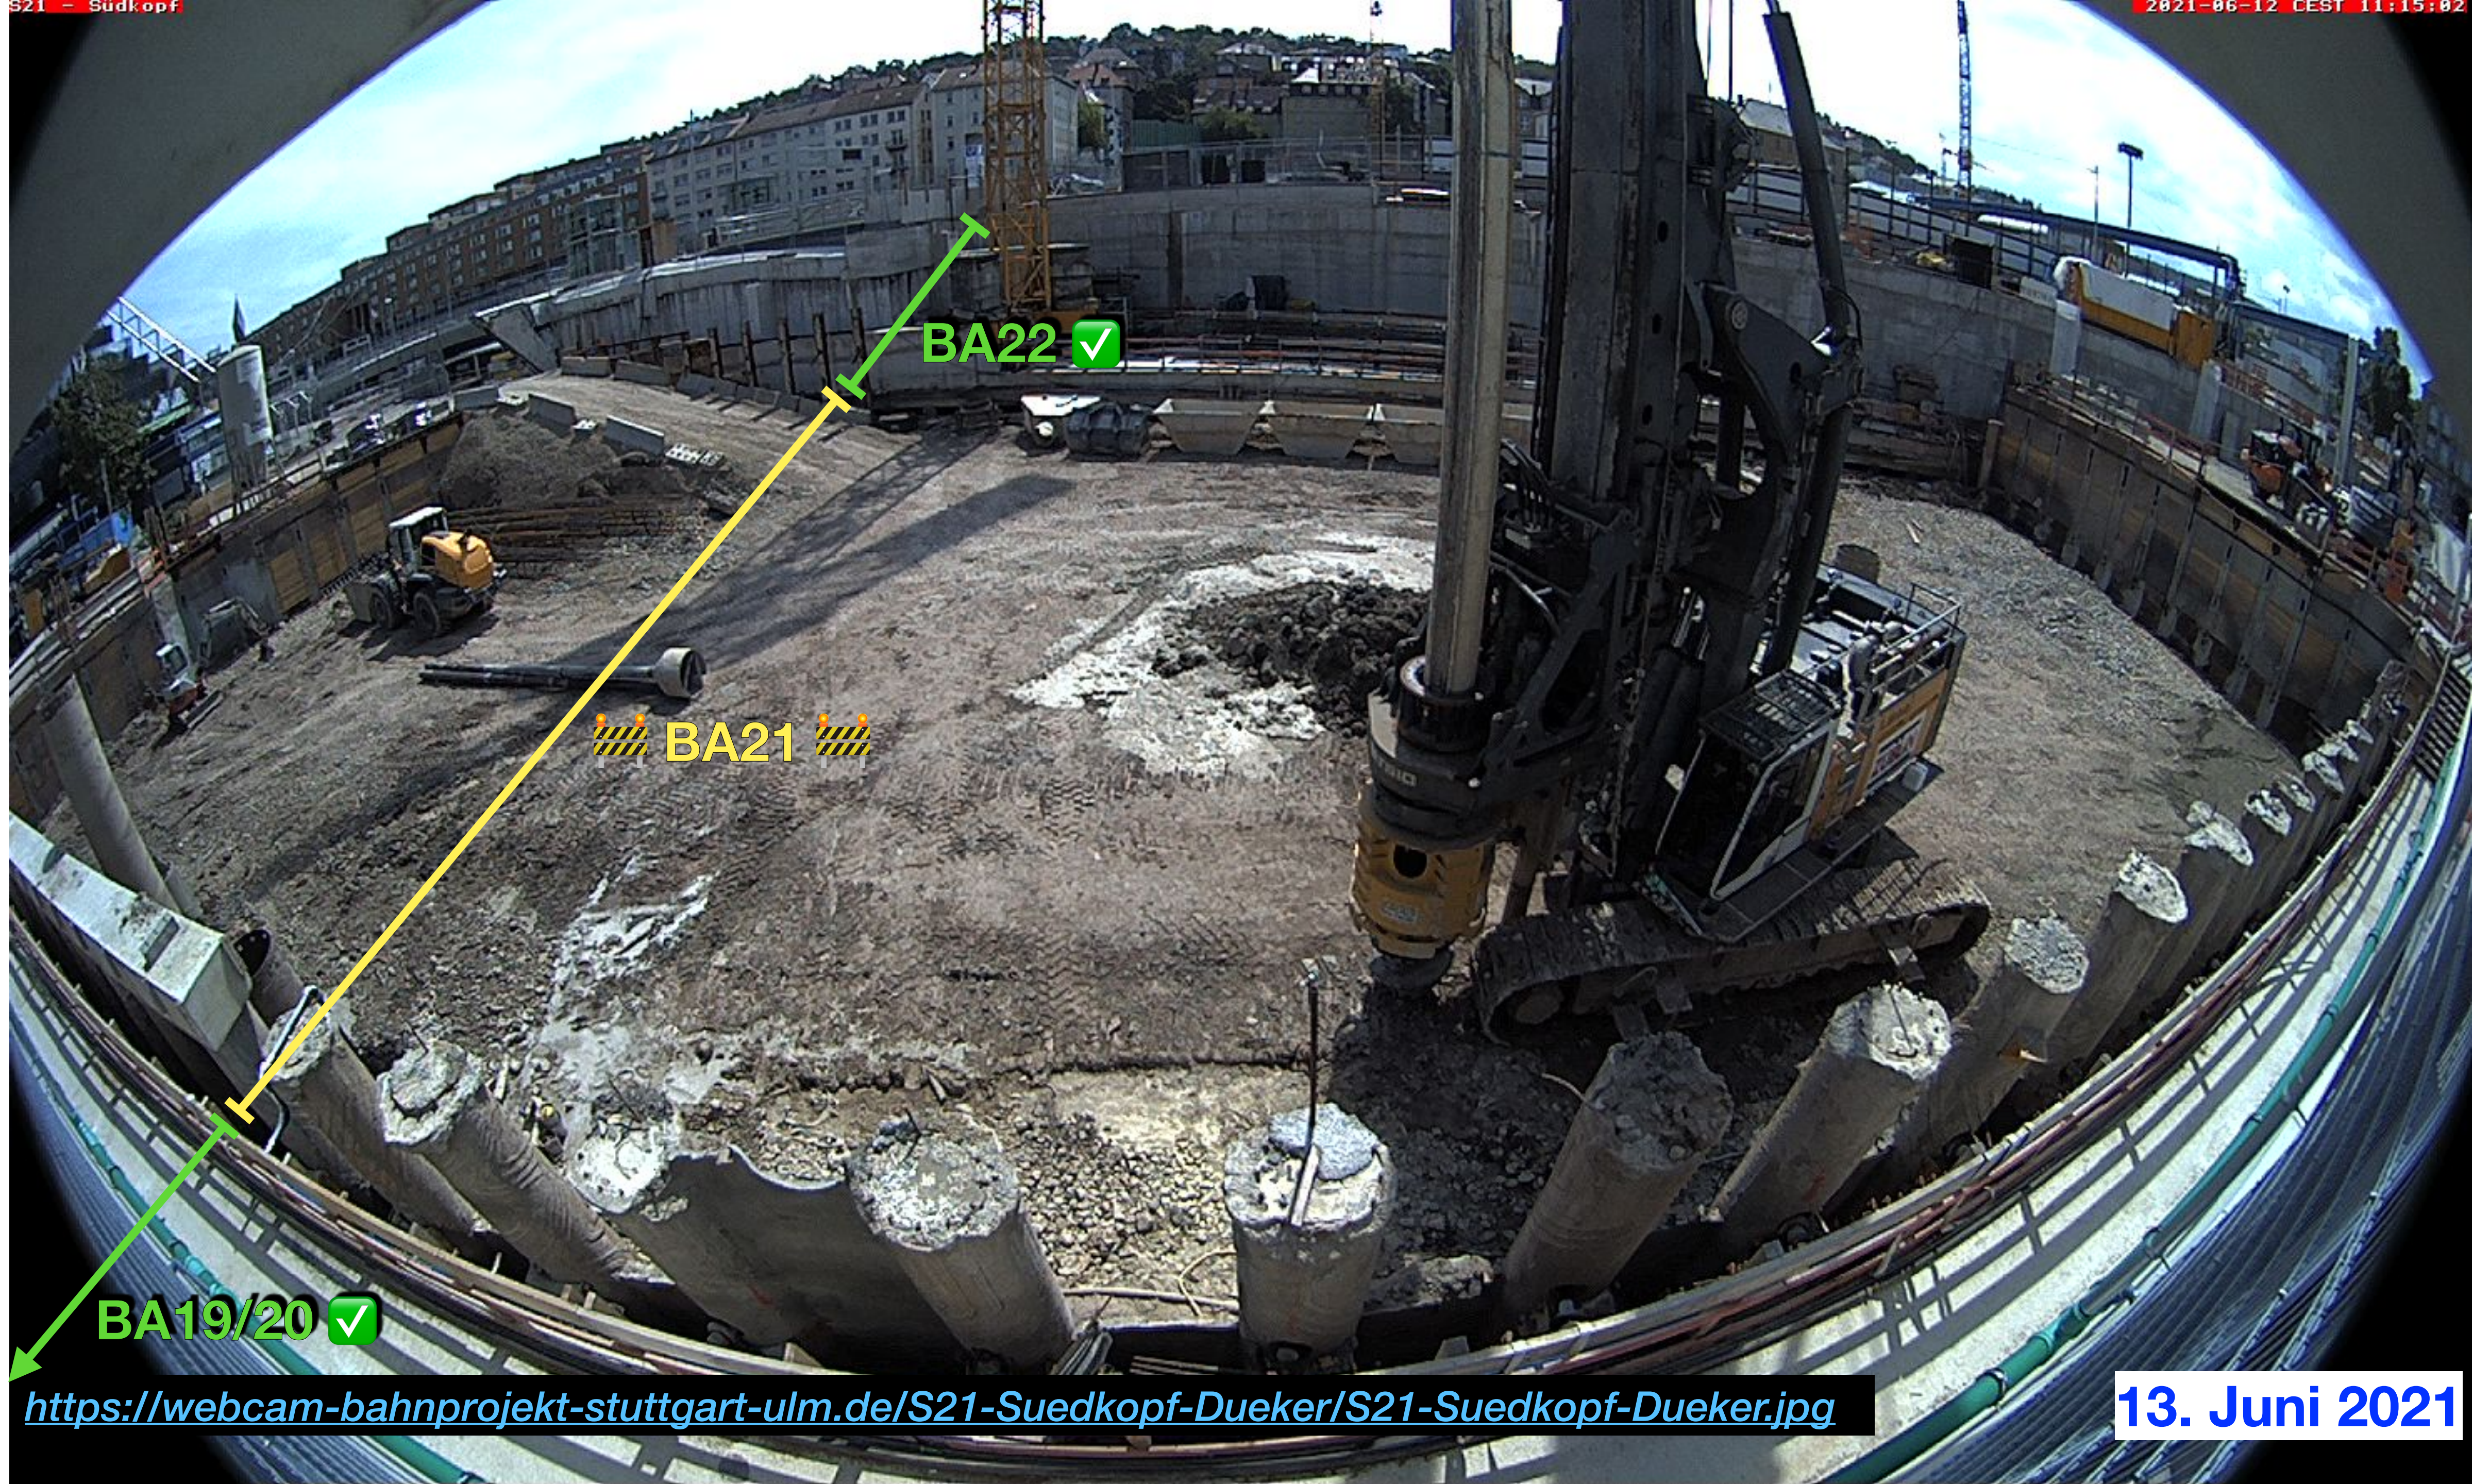

BA22 ✓

⚠ BA21 ⚠

BA19/20 ✓



Nordkopf

13. Juni 2021





Zwischenangriff
Rosenstein

Tunnel
S-Bahn

<<< Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart

Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt >>>

Zwischenangriff Rosenstein

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>

13. Juni 2021





Vortrieb		Ist**	Gesamt**
		2.097,79	4.394,90
		2.097,79	4.352,00
Vortriebsstand: 07.06.2021		953,19	2.130,00
		1.144,60	2.222,00
		0,00	42,90

13. Juni 2021

Backup: Original Schalungsfolie



B3=B 2

2 Einsätze


$$B_4 = B_1$$

2 Einsätze

Brillenwand- kelche



Kelchfuß



3 Einsätze

4 Einsätze

3 Einsätze

(Oranger) =
3. Schalsatz



SK24

Von orangem Schalsatz

Sonderkelch



Kelchfuß

6 Einsätze

9 Einsätze

7 Einsätze

(Grüner) = 2.Schalsatz



Kelchfuß
14 Einsätze

Nord
Restkeich

14 Einsätze

Restkelch

(Roter)=1. Schalsatz



**Nord
Randergänzung**

7 Einsätze

11 Einsätze

10 Einsätze


Randergänzung
Süd



**Ergänzung
Restkelch /
Brillenwand**

2 Einsätze

Ergänzung
Randkelch /
Brillenwand

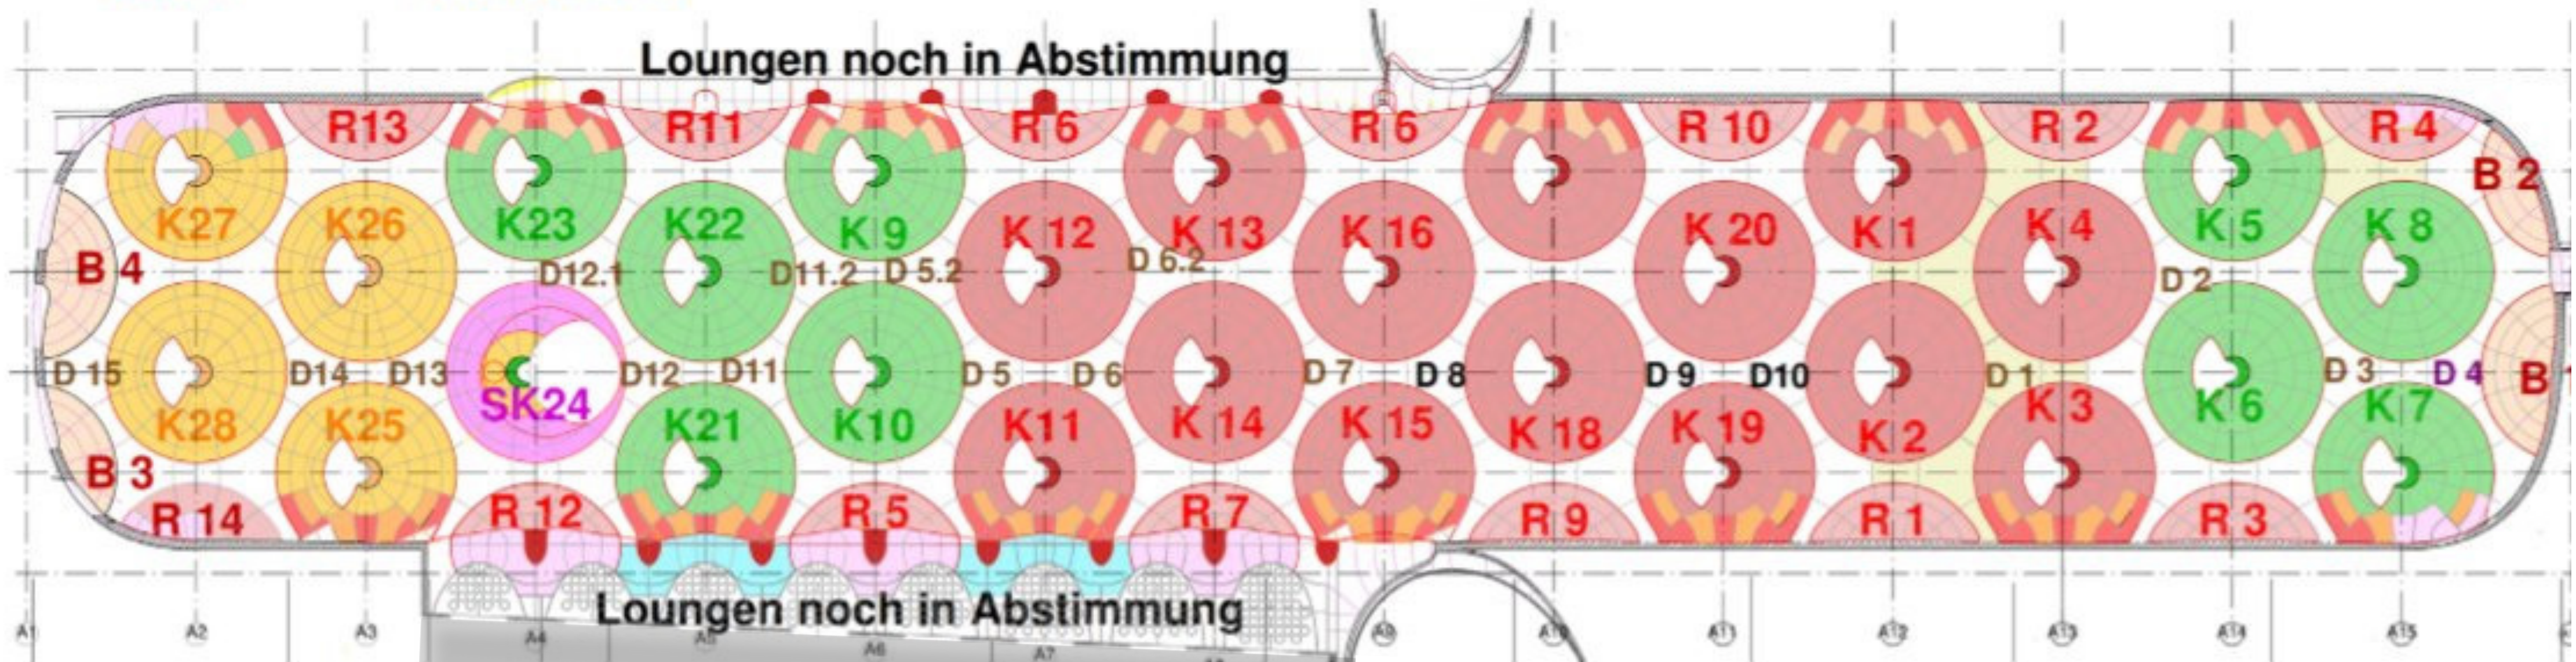

Bonatzbau
