



Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2

BA12			BA13			B14			BA15			BA16			BA17			BA18		
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13 19.6.2021	D 7	R8	D 8	K17	D 9	R10 26.5.2021	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2
K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		
R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7		K15		R9		K19 17.4.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7		B1

Gesamt: 16 Kelchstützen, 22 Kelchfüße, 7 Restkelche und eine Schwindgasse

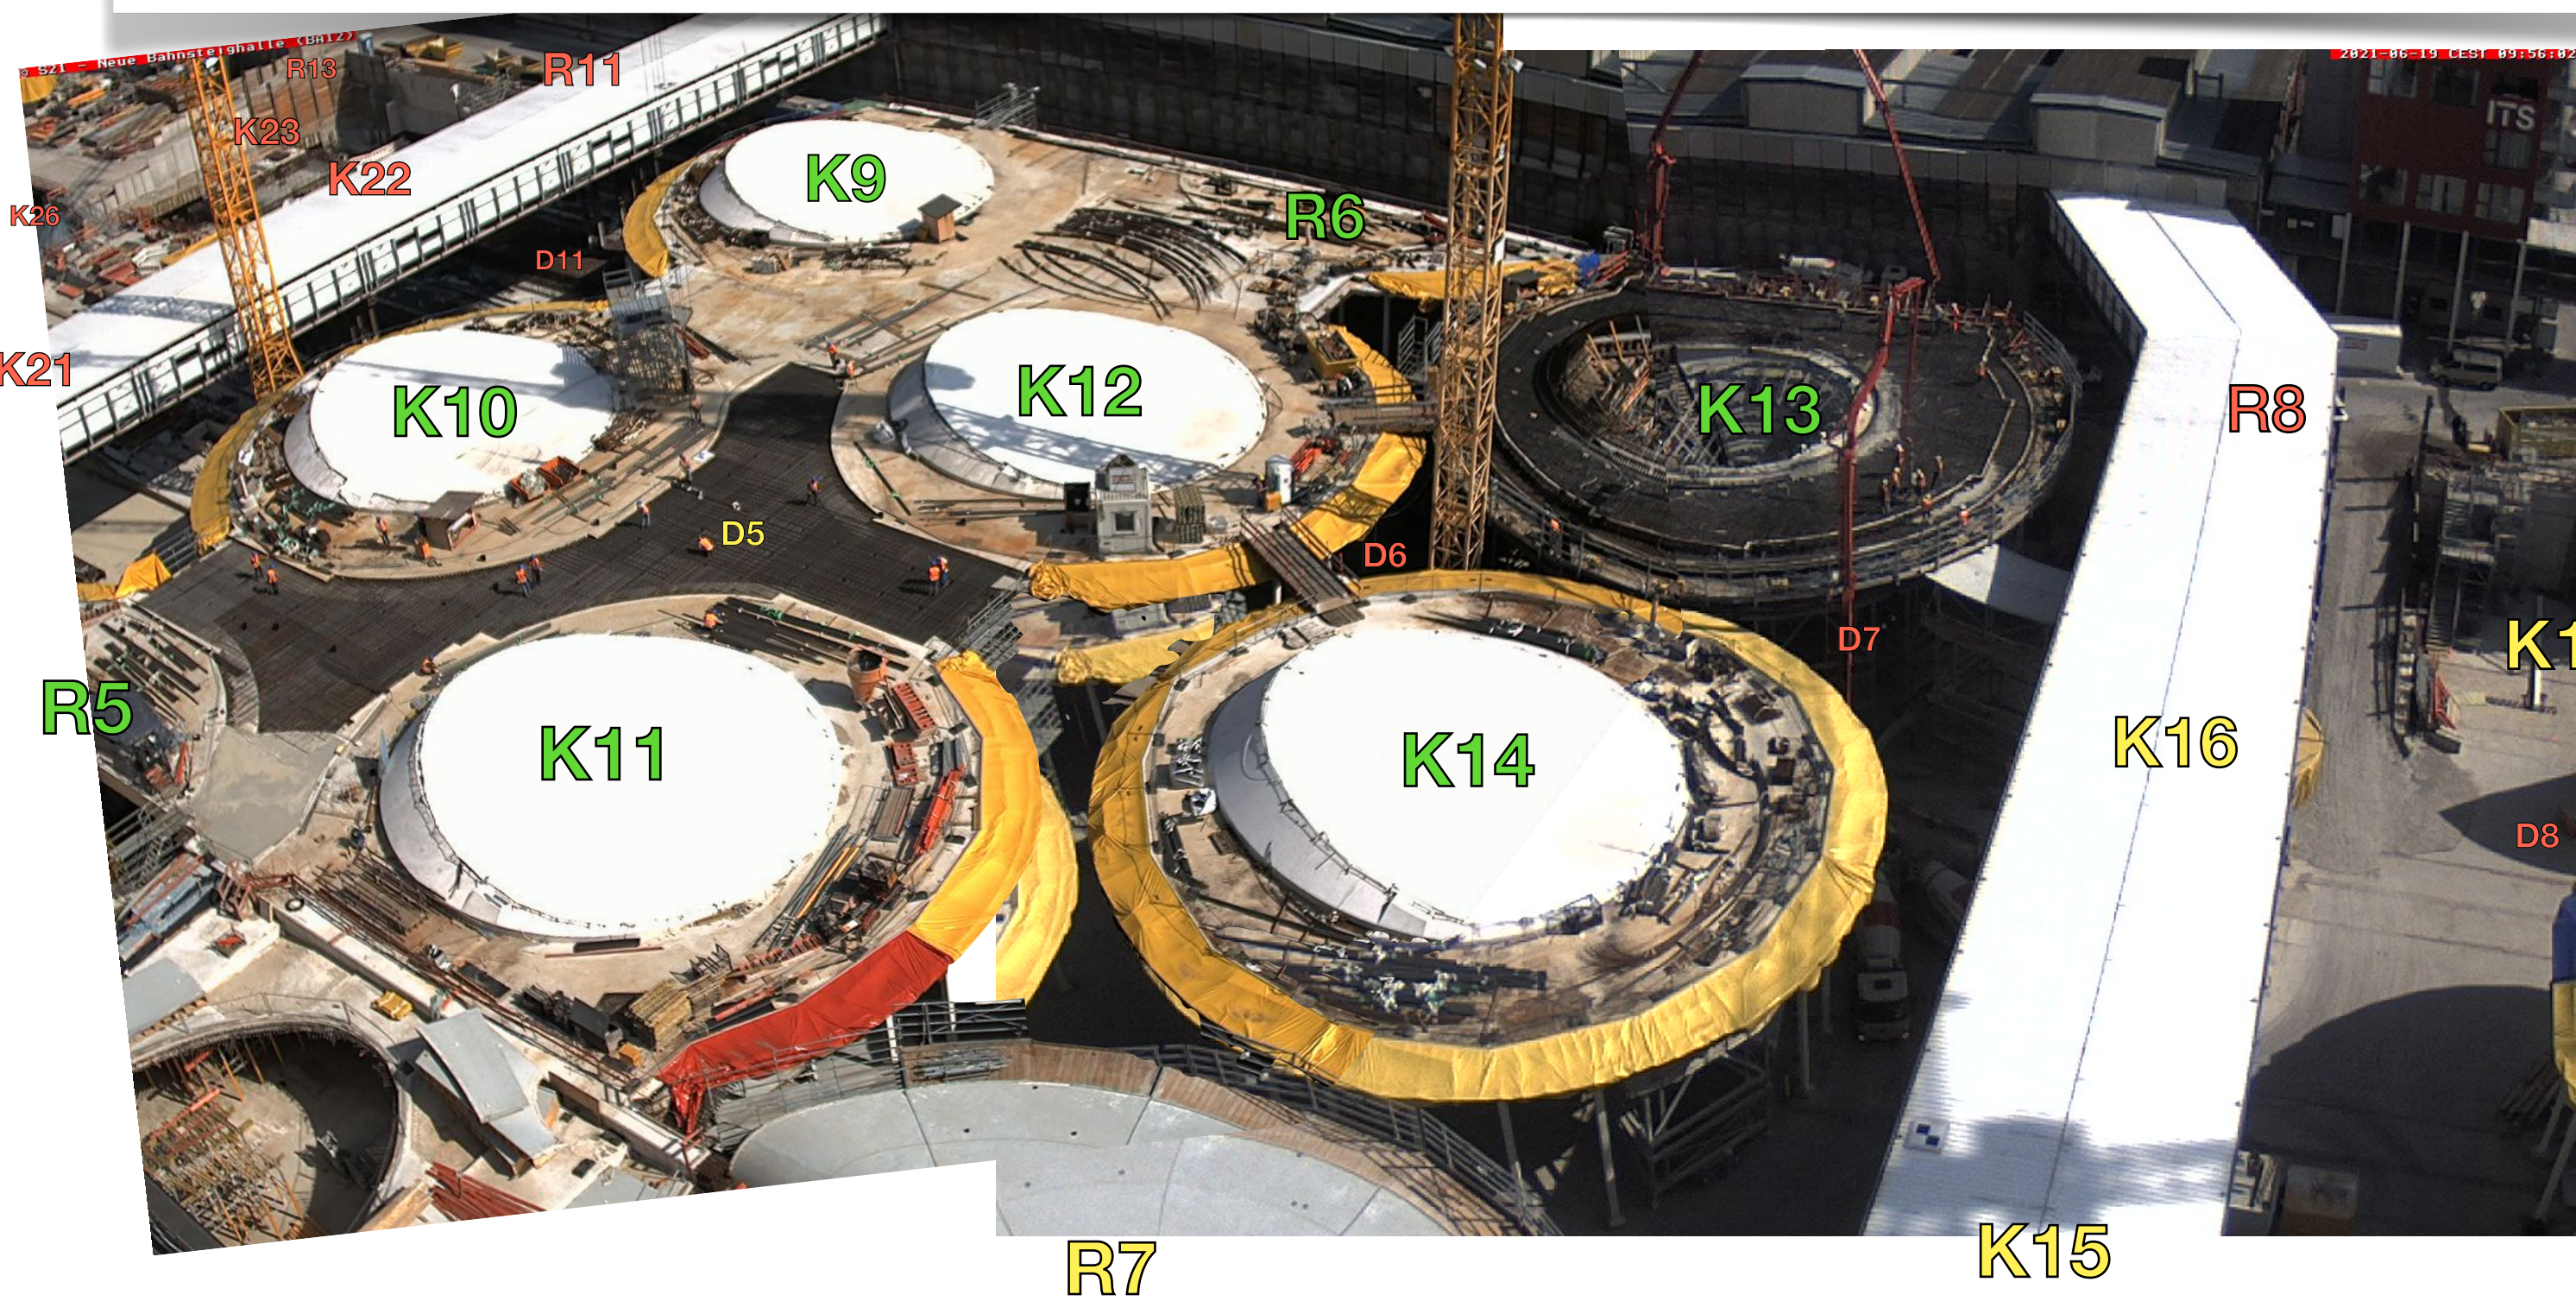

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

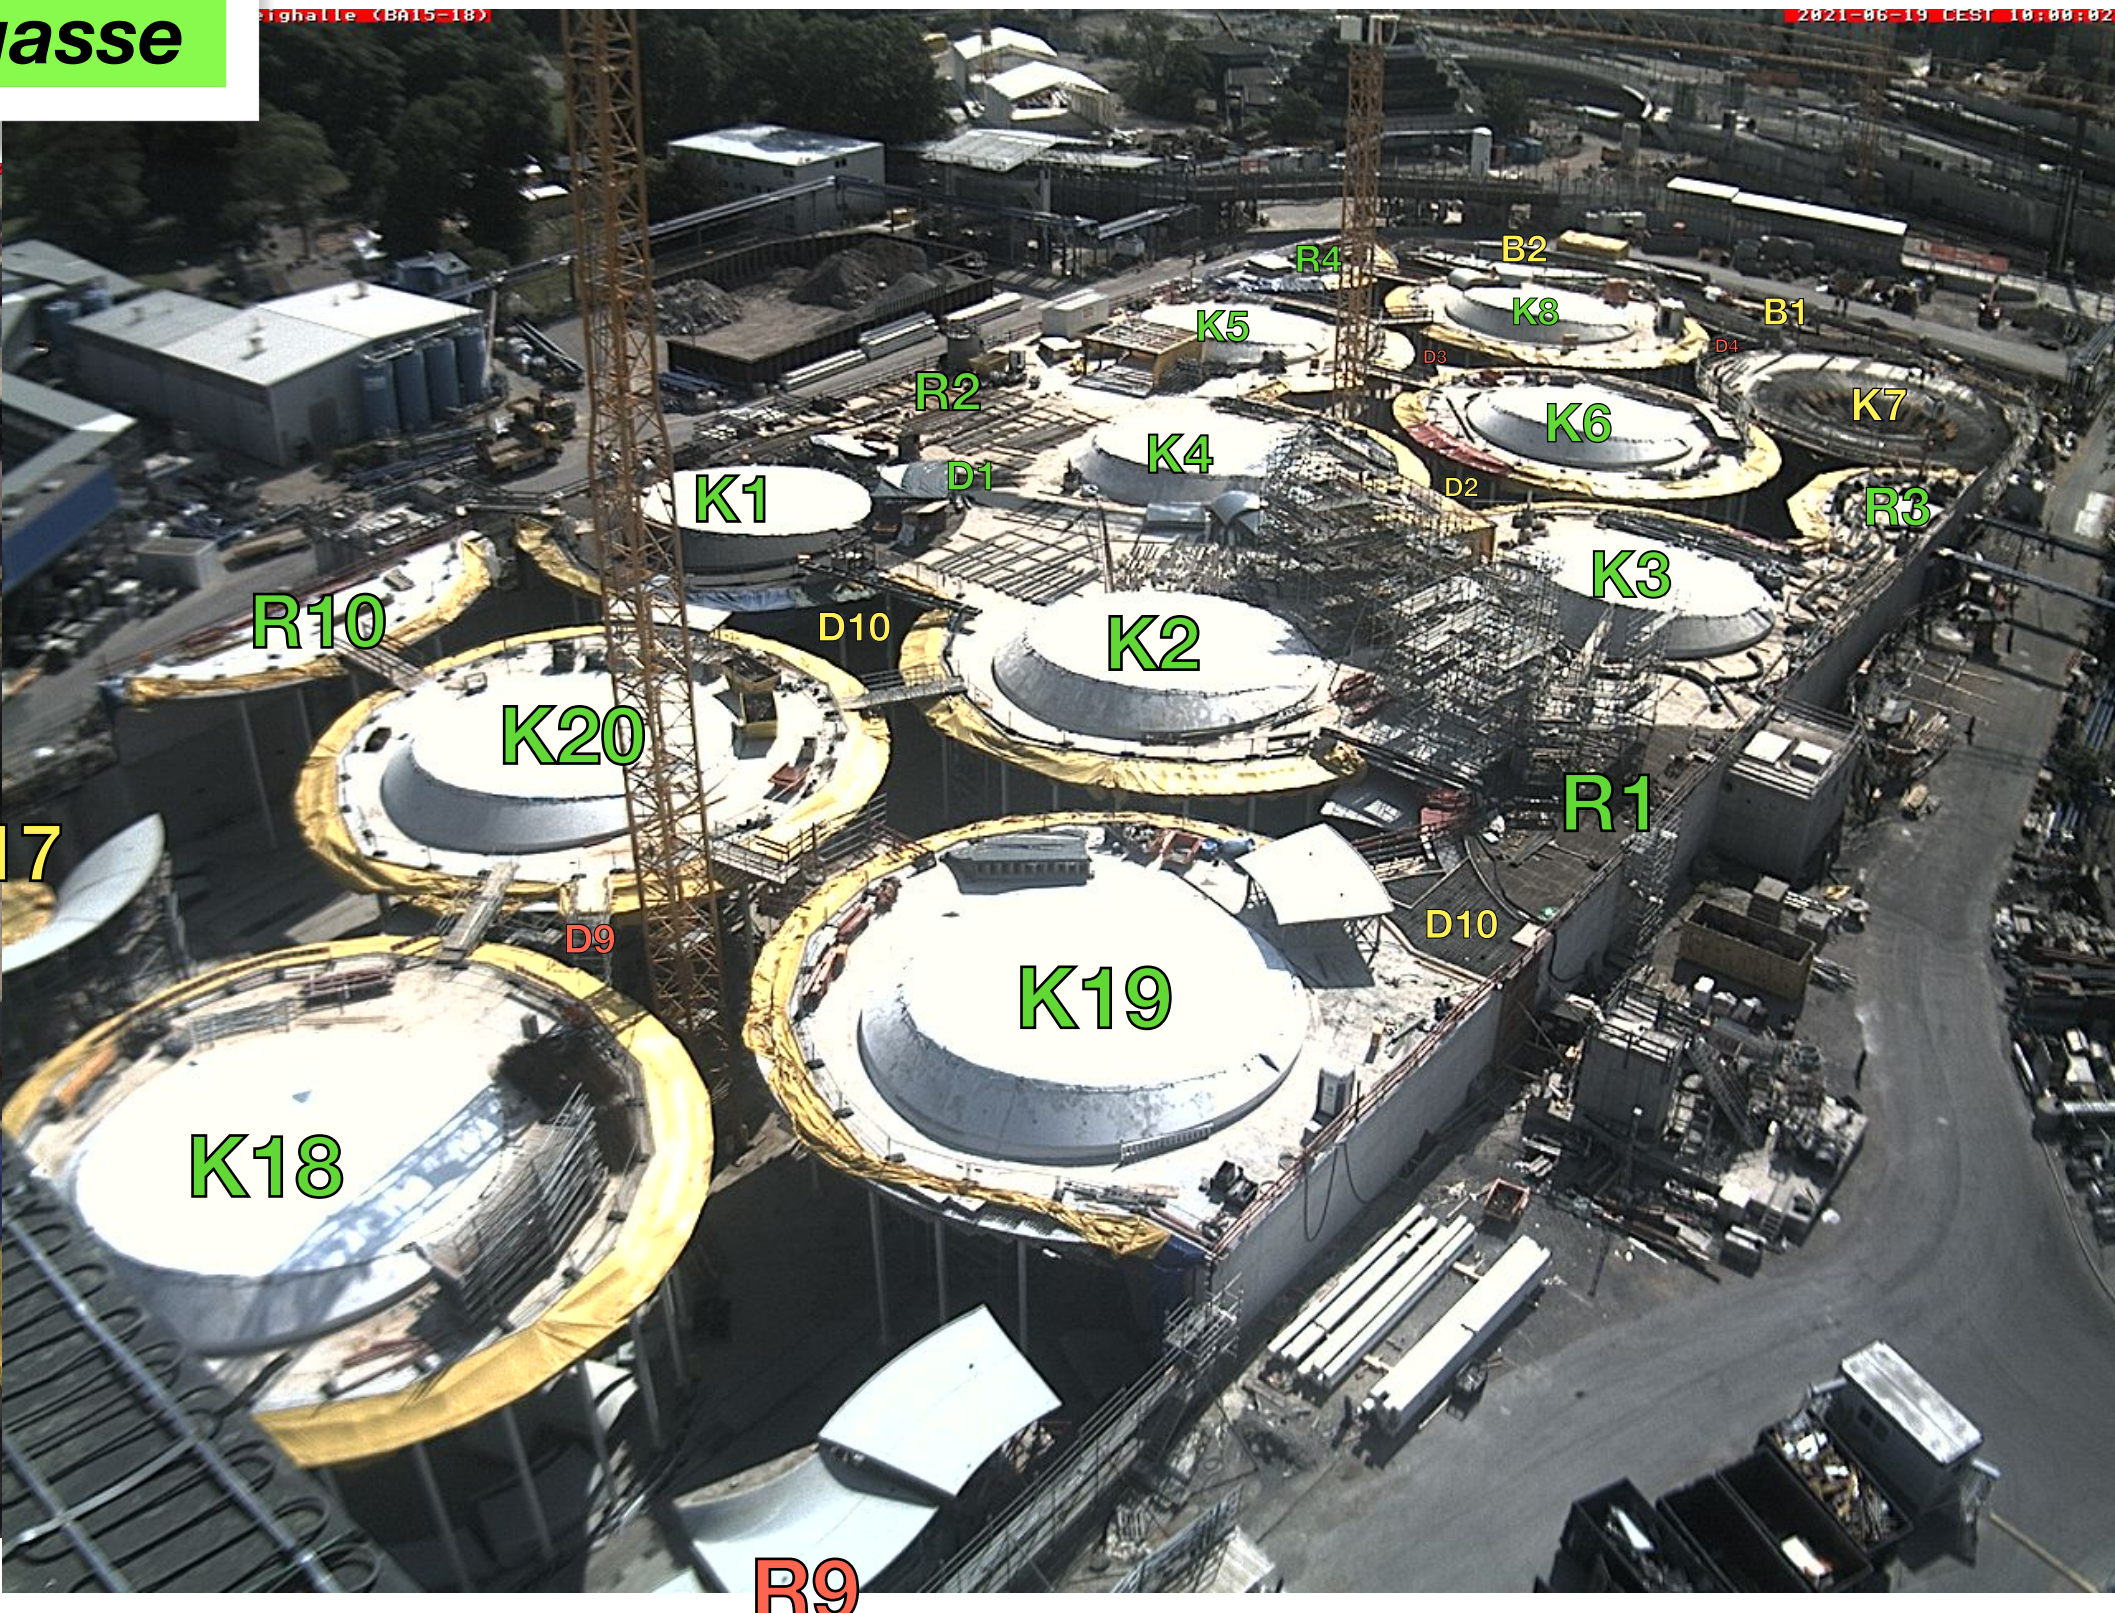

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 19. Juni 2021



Beschriftung durch S21Bau.TV

19. Juni 2021

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**


✅ **Gebaut:**

- ➡ 16 Kelchstützen
- ➡ 0 Lichtaugen
- ➡ 7 Restkelche ...kleines Bergfest...
- ➡ 0 Brillenwandkelche
- ➡ 22 Kelchfüße
- ➡ 11 Galeriestützen
- ➡ 1 Schwindgasse + 1/3 D2, 1/2 D5
- ➡ 3 Lounge-Deckenplattenabschnitte
- ➡ 0 Lounge-Oberlichter

...muss noch:

🚧 **davon im Bau:**

- 12 K7 und K17
- 28
- 7 R7
- 4 B1 und B2
- 6
- 5
- 14 D5 zweite Hälfte, D10
- 6
- 8 (Doch noch nicht 🧑)

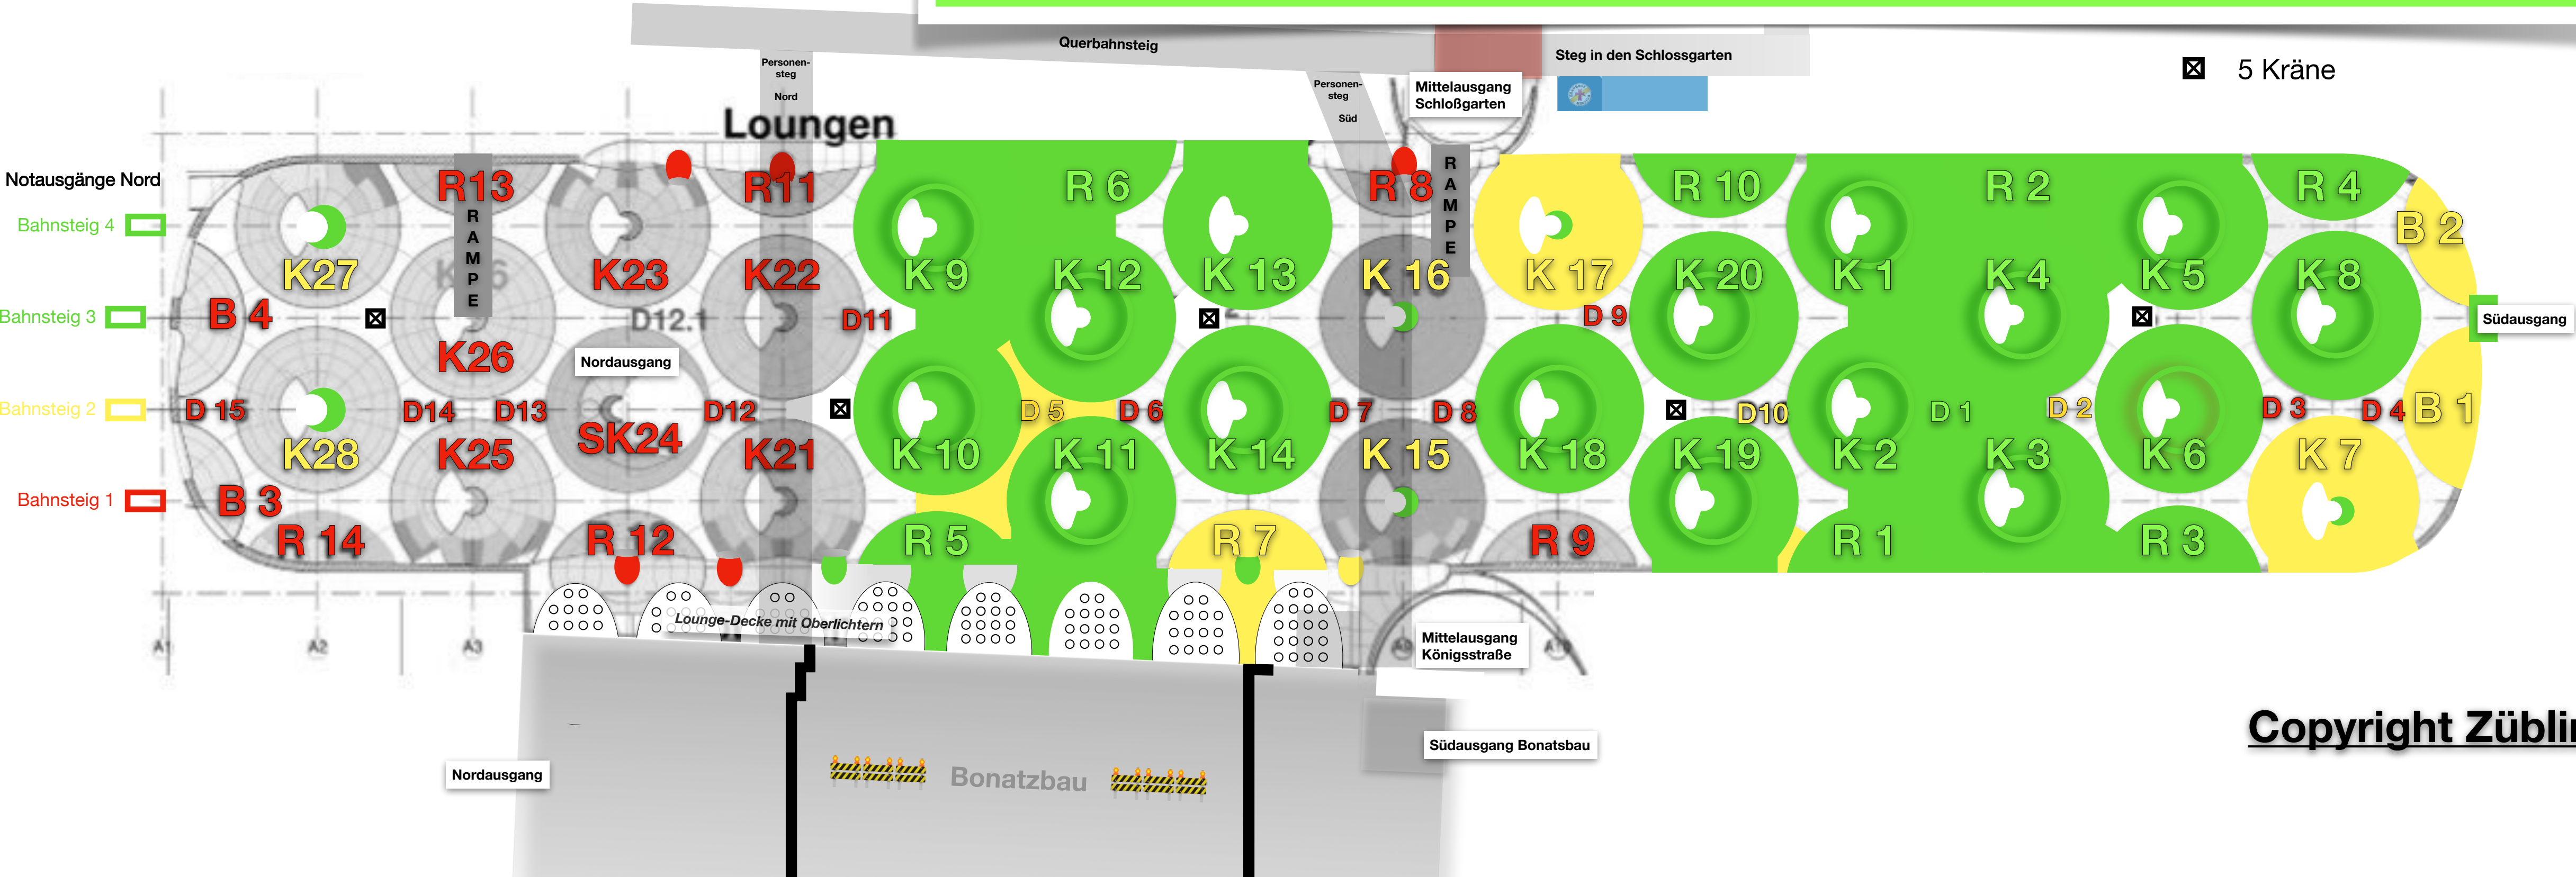

Betonage der Kelche und Schwindgassen

	Kelchblüte			Kelchfuß		Hutze			Restkelch				Schwindgasse			
1	K1	20. Oktober 2018		 10.06.2017		 28.11.2018			1	R1	30. Juni 2018		1	D1	20. Januar 2021	
2	K10	9. März 2019		 19.04.2018		 03.04.2019			2	R2	8. Dezember 2018		2	D2		
3	K2	16. April 2019		 03.08.2017		 22.05.2019			3	R6	15. Februar 2020		3	D5		
4	K3	7. September 2019		 20.12.2017		 02.10.2019			4	R3	11. Juli 2020		4	D10		
5	K9	26. Oktober 2019		 15.05.2018		 20.11.2019			5	R5	30. Oktober 2020		5			
6	K14	14. Dezember 2019		 12.11.2018		 03.02.2020			6	R4	3. März 2021		6			
7	K4	1. Februar 2020		 10.10.2017		 07.03.2020			7	R10	26. Mai 2021		7			
8	K8	2. Mai 2020		 16.12.2019		 03.06.2020			8	R7			8			
9	K12	30. Mai 2020		 05.11.2019		 08.07.2020			9				9			
10	K18	27. Juni 2020		 13.02.2020		 11.08.2020			10				10			
11	K5	5. September 2020		 01.03.2019		 15.10.2020			11				11			
12	K20	18. November 2020		 09.07.2020		 05.12.2020			12				12			
13	K11	16. Dezember 2020		 03.06.2020		 29.01.2021			13				13			
14	K6	Bergfest 27. Februar 2021		 12.04.2019		 30.03.2021			14				14			
15	K19	17. April 2021		 27.08.2020		 12.05.2021							15			
16	K13	19. Juni 2021		 15.12.2018												
17	K7			 05.12.2020												
18	K17			 17.05.2020												
19	K27			 29.04.2021						Brillenwandkelch						
20	K28			 08.06.2021					1	B1						
21	K21								2	B2						
22	K22								3							
23	K23								4							
24	K24															
25	K25															
26	K26															
27	K15			 09.05.2019												
28	K16			 05.06.2019												

19. Juni 2021


IG **BÜRGER**

Das Datum kann einige Tage versetzt sein.

19. Juni 2021



Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:

19. Juni 2021



✓	BA 1	Rohbau Schwallbauwerk Nord ✓
✓	BA 2	
✓	BA 3	
✓	BA 4-7	...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.
✓	BA 8	Wiederherstellung der Rampe für den Kehrtunnel Heilbronner Straße und Freilegung der Notausgänge Nord.

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:

	BA 9	Bodenplatte fertig. Seitenwand wird gebaut.
	BA 10	Baulogrampe: Bodenplatte auf Seite Bonatzbau ist gebaut.
	BA 11	liegt über der S-Bahn und wird mit Spannbetonbrücken überspannt. Bahnsteige 2 und 3 sind komplett. Bei den anderen zwei muss noch die Aussparung betoniert werden.
	BA 12	
	BA 13	
	BA 14	
	BA 15	
✓	BA 16	
	BA 17	
	BA 18	

Südkopf: Bauabschnitt 19-25:

✓	BA 19/20	Südausgang und Notausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.
	BA 21	
✓	BA 22	...liegt unter den Zugangstunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und ist komplett fertig.
	BA 23	...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zugangstunneln. Diese werden gerade abgebrochen.
✓	BA 24	Schwallbauwerk Süd wird gebaut.
✓	BA 25	



K5

D3

K6

R4

K8

B2

D4

B1

K7

R3



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg>

19. Juni 2021



K3

R1

K2

K19

R9

K18


D10

K20

D9

R10

K17

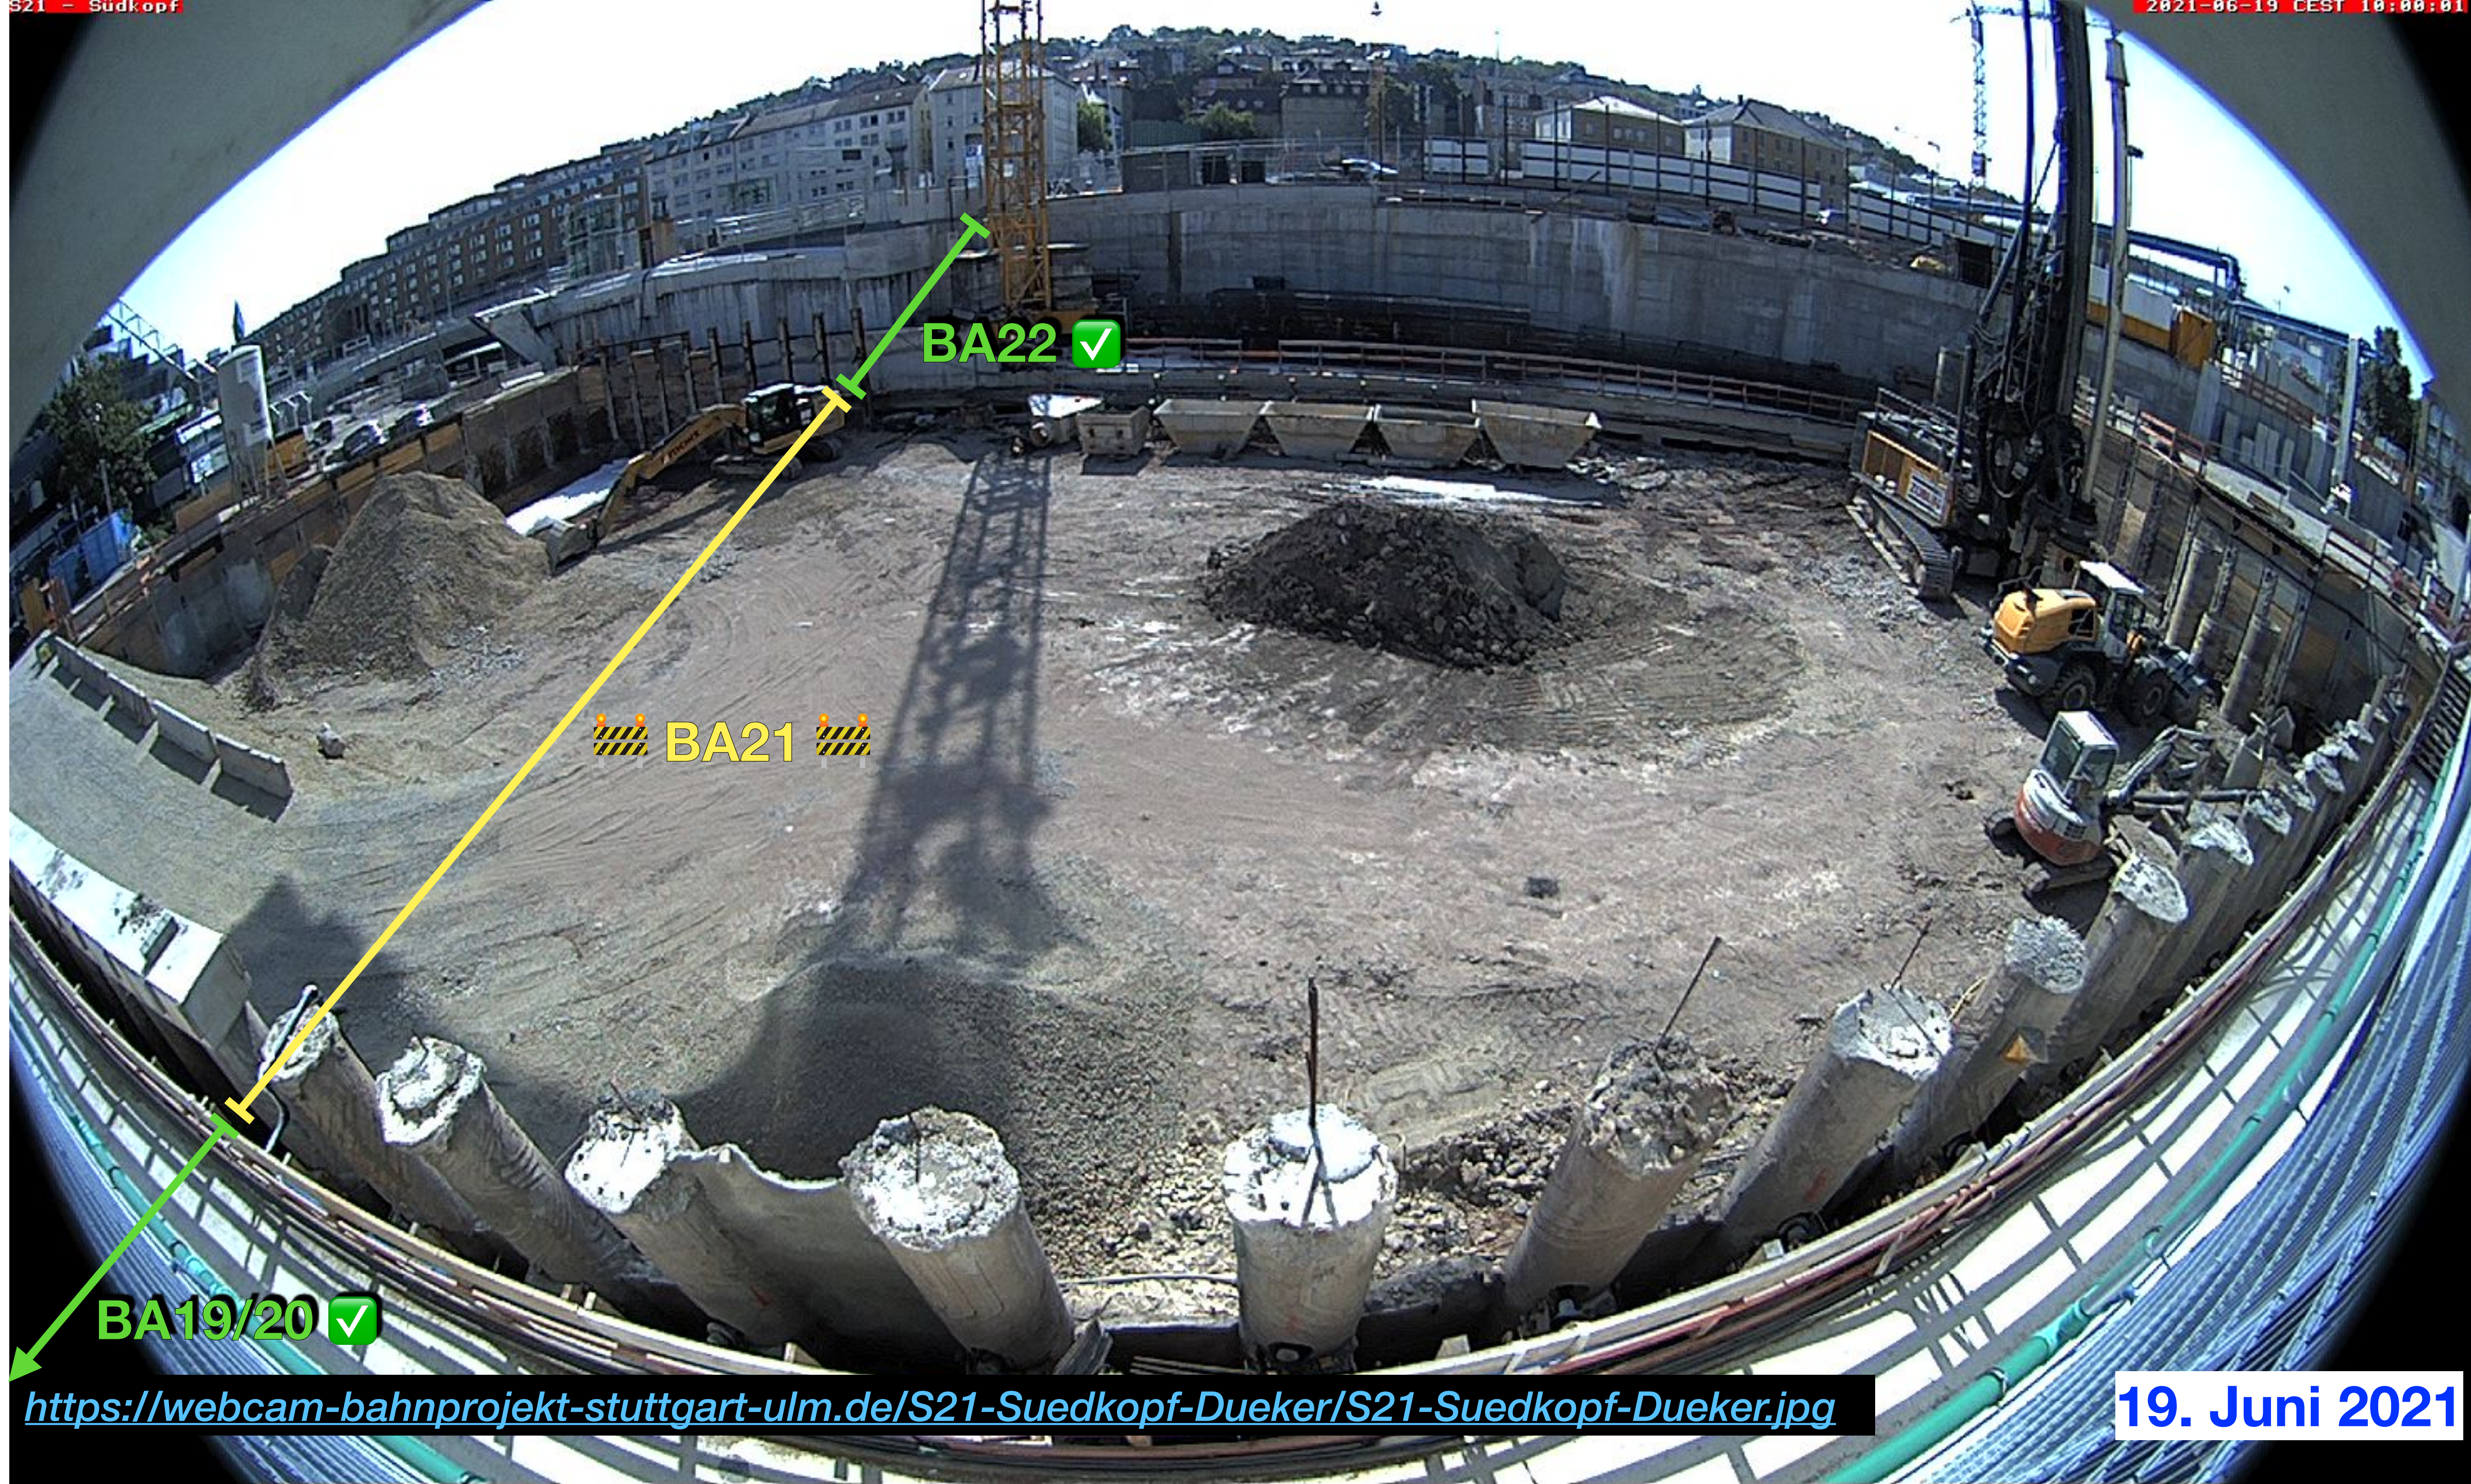

BA19/20 ✓

BA22 ✓

⚠ BA21 ⚠



Nordkopf

Verstärkung der Deckenplatte im Weichenbereich

19. Juni 2021



Rückbau provisorische Jägerstraße



Zwischenangriff
Rosenstein

Tunnel
S-Bahn


<<< Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart

Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt >>>

Zwischenangriff Rosenstein

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>

19. Juni 2021

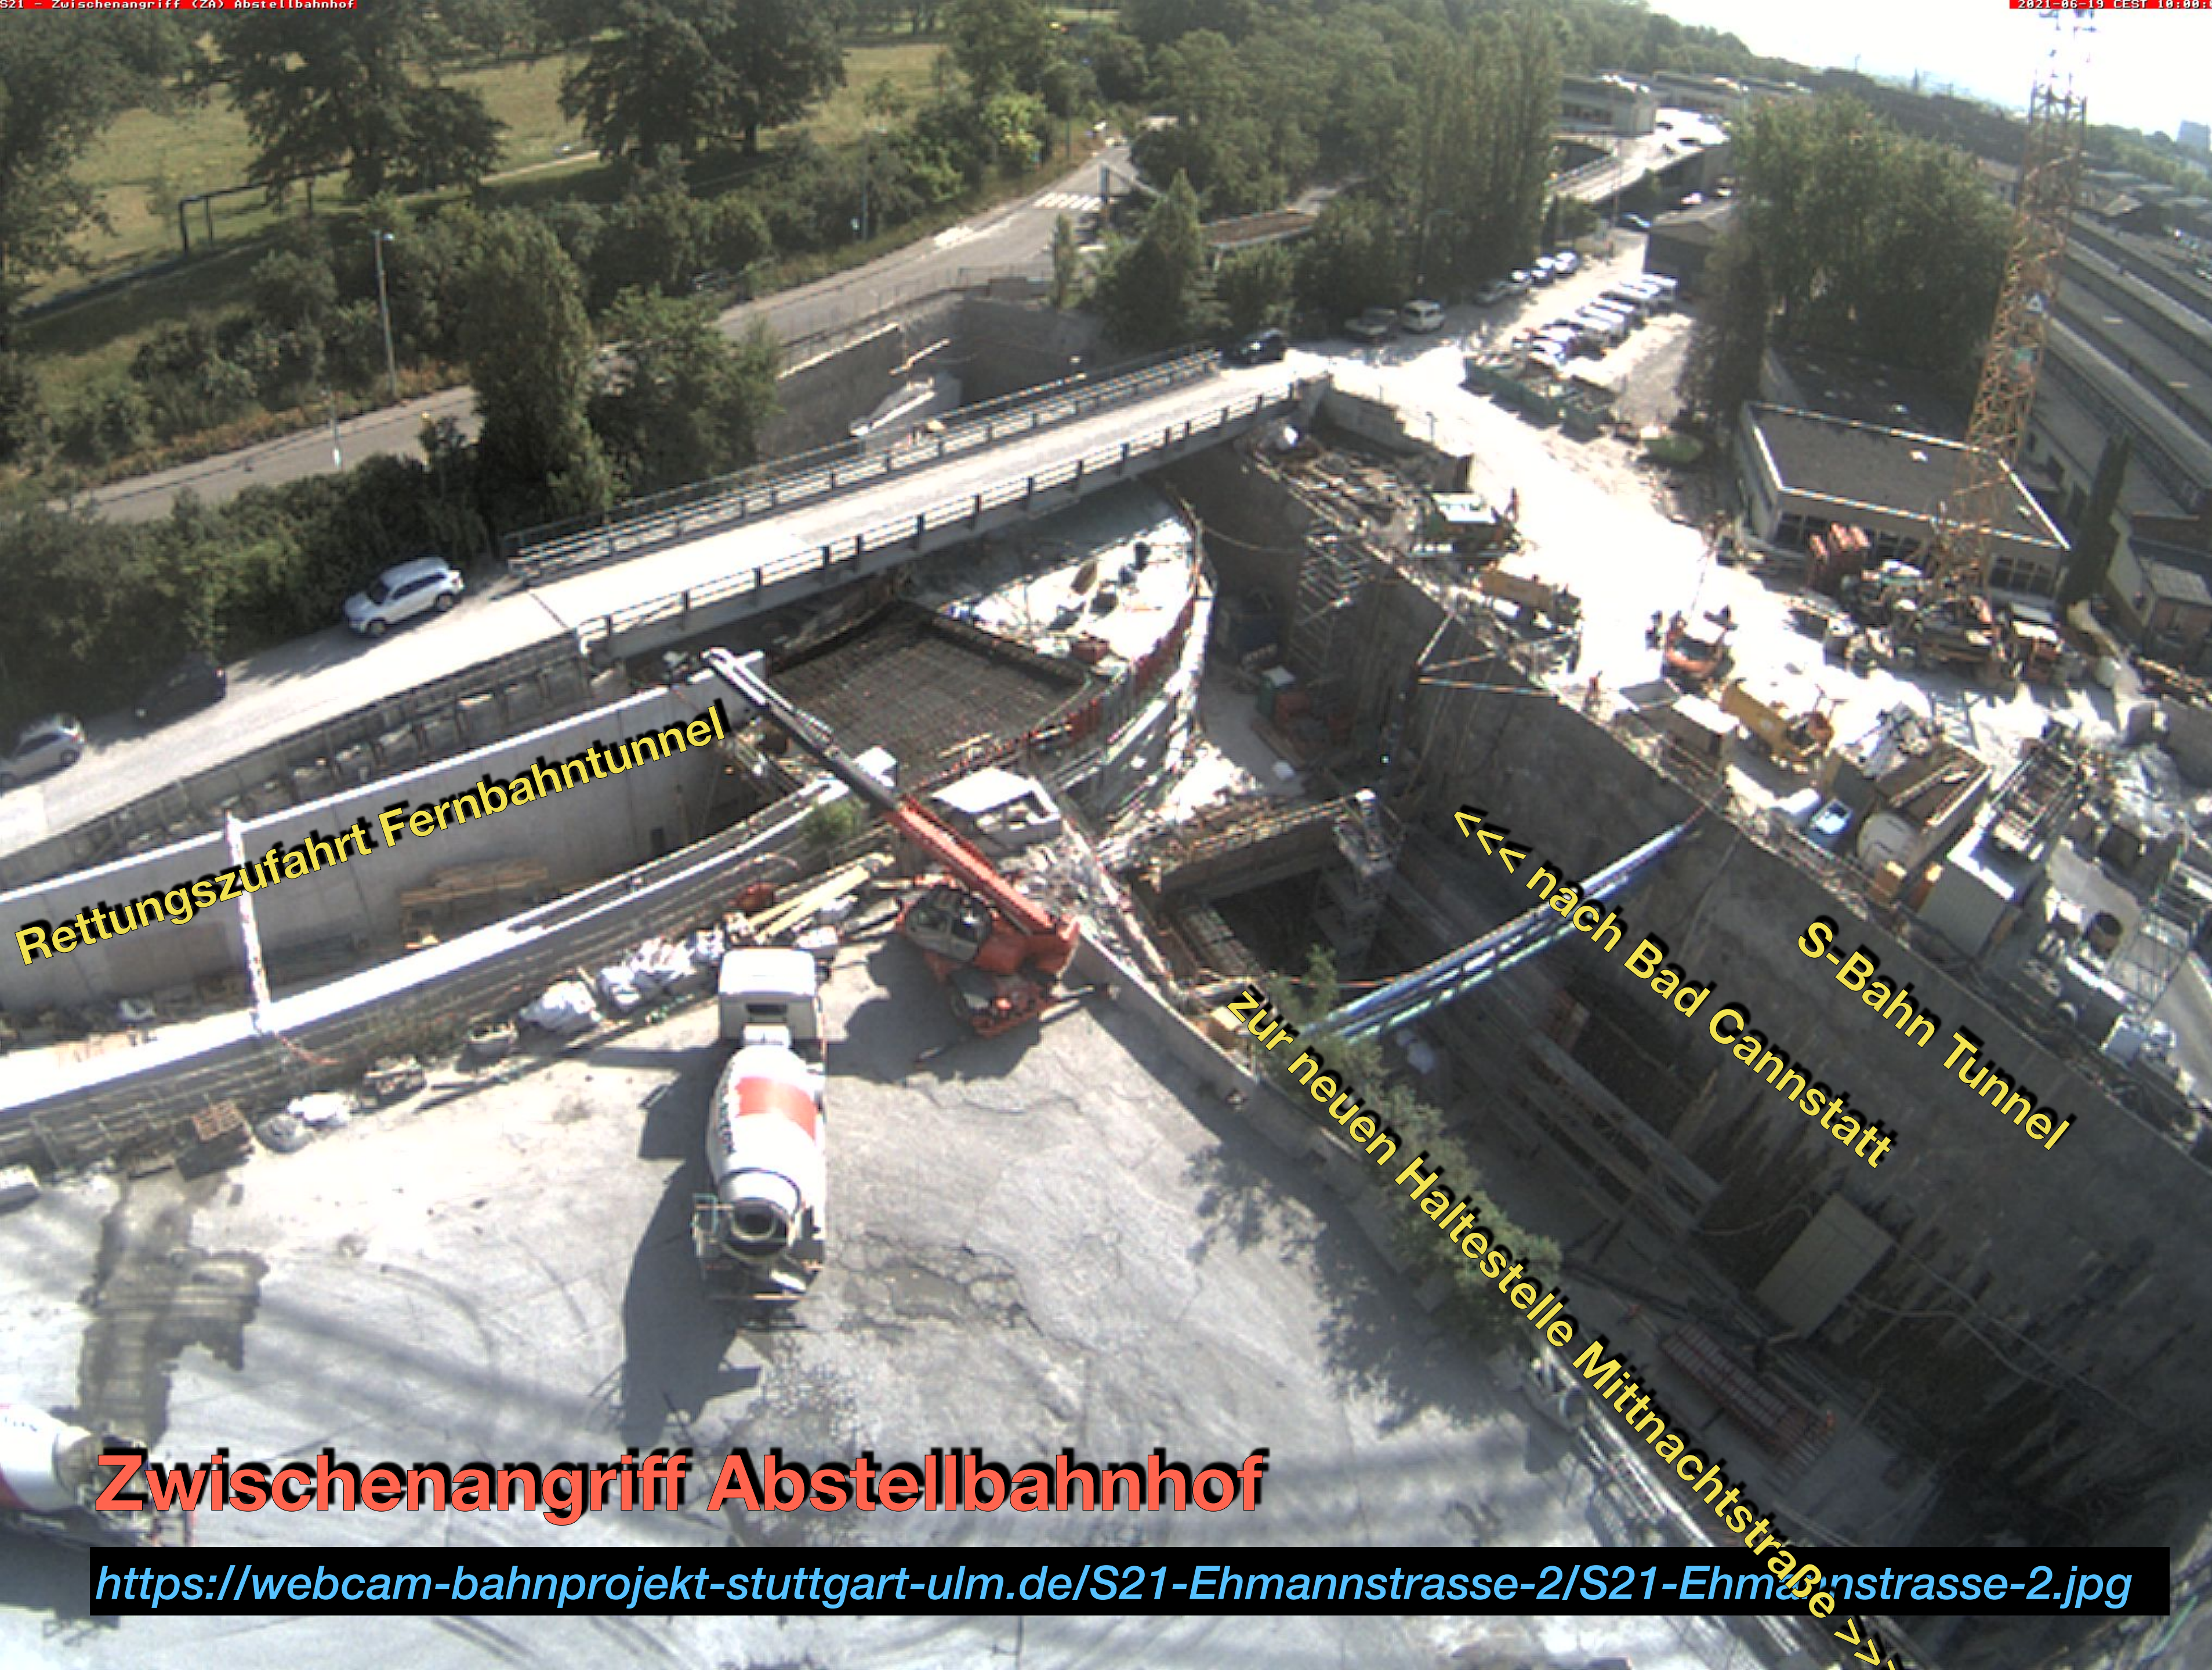

Zwischenangriff Abstellbahnhof


<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-2/S21-Ehmannstrasse-2.jpg>



Vortrieb		Ist**	Gesamt**
		2.172,99	4.394,90
		2.172,99	4.352,00
Vortriebsstand: 14.06.2021		992,39	2.130,00
		1.180,60	2.222,00
		0,00	42,90

19. Juni 2021

Backup: Original Schalungsfolie

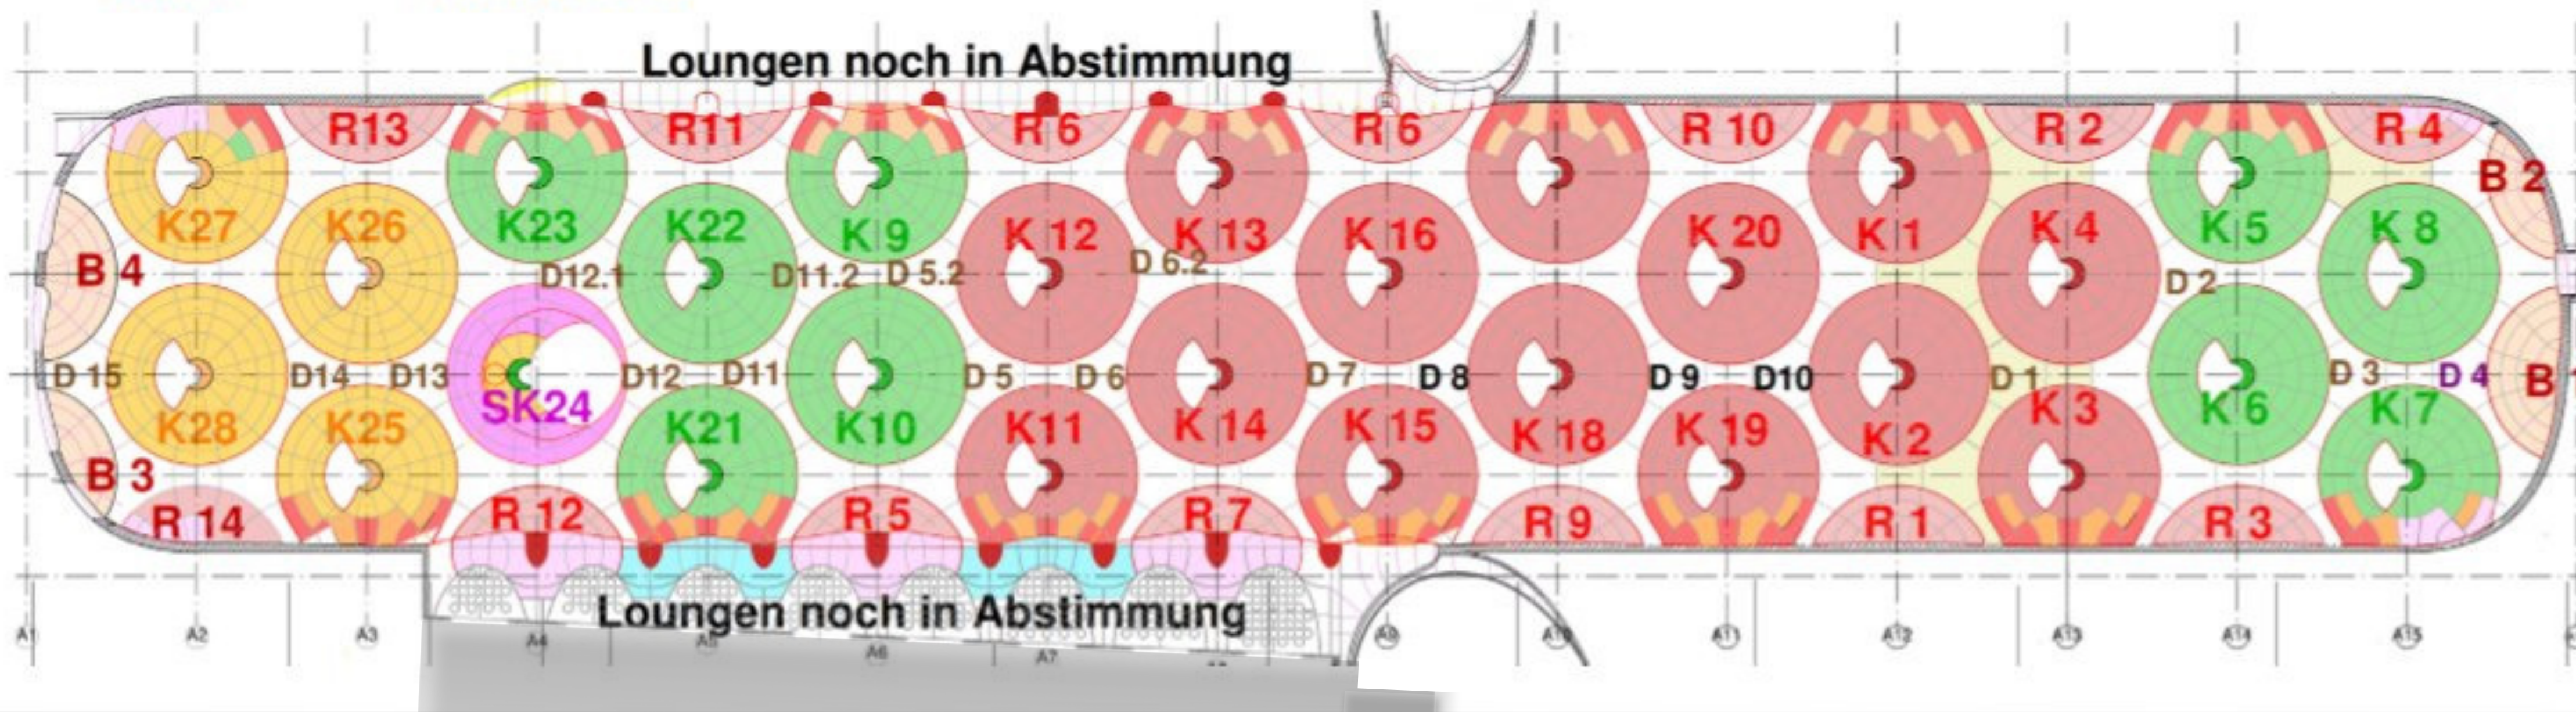

Bonatzbau
