



Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2

BA12			BA13		B14		BA15		BA16			BA17		BA18				
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	Kran	K13 19.6.2021	D 7	R8	D 9	K17	D 10	R10 26.5.2021	D 1	K1 20.10.2018	Kran	R2 8.12.2018	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2
K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16		K20 18.11.2020		K4 1.2.2020		K5 5.9.2020		K8 2.5.2020		B1		
R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7 9.9.2021		K15		K19 17.4.2021		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7 4.9.2021				

Insgesamt fertig: 18 Kelchstützen, 24 Kelchfüße, 8 Restkelche, ein Brillenwandkelch und 2 Schwindgassen

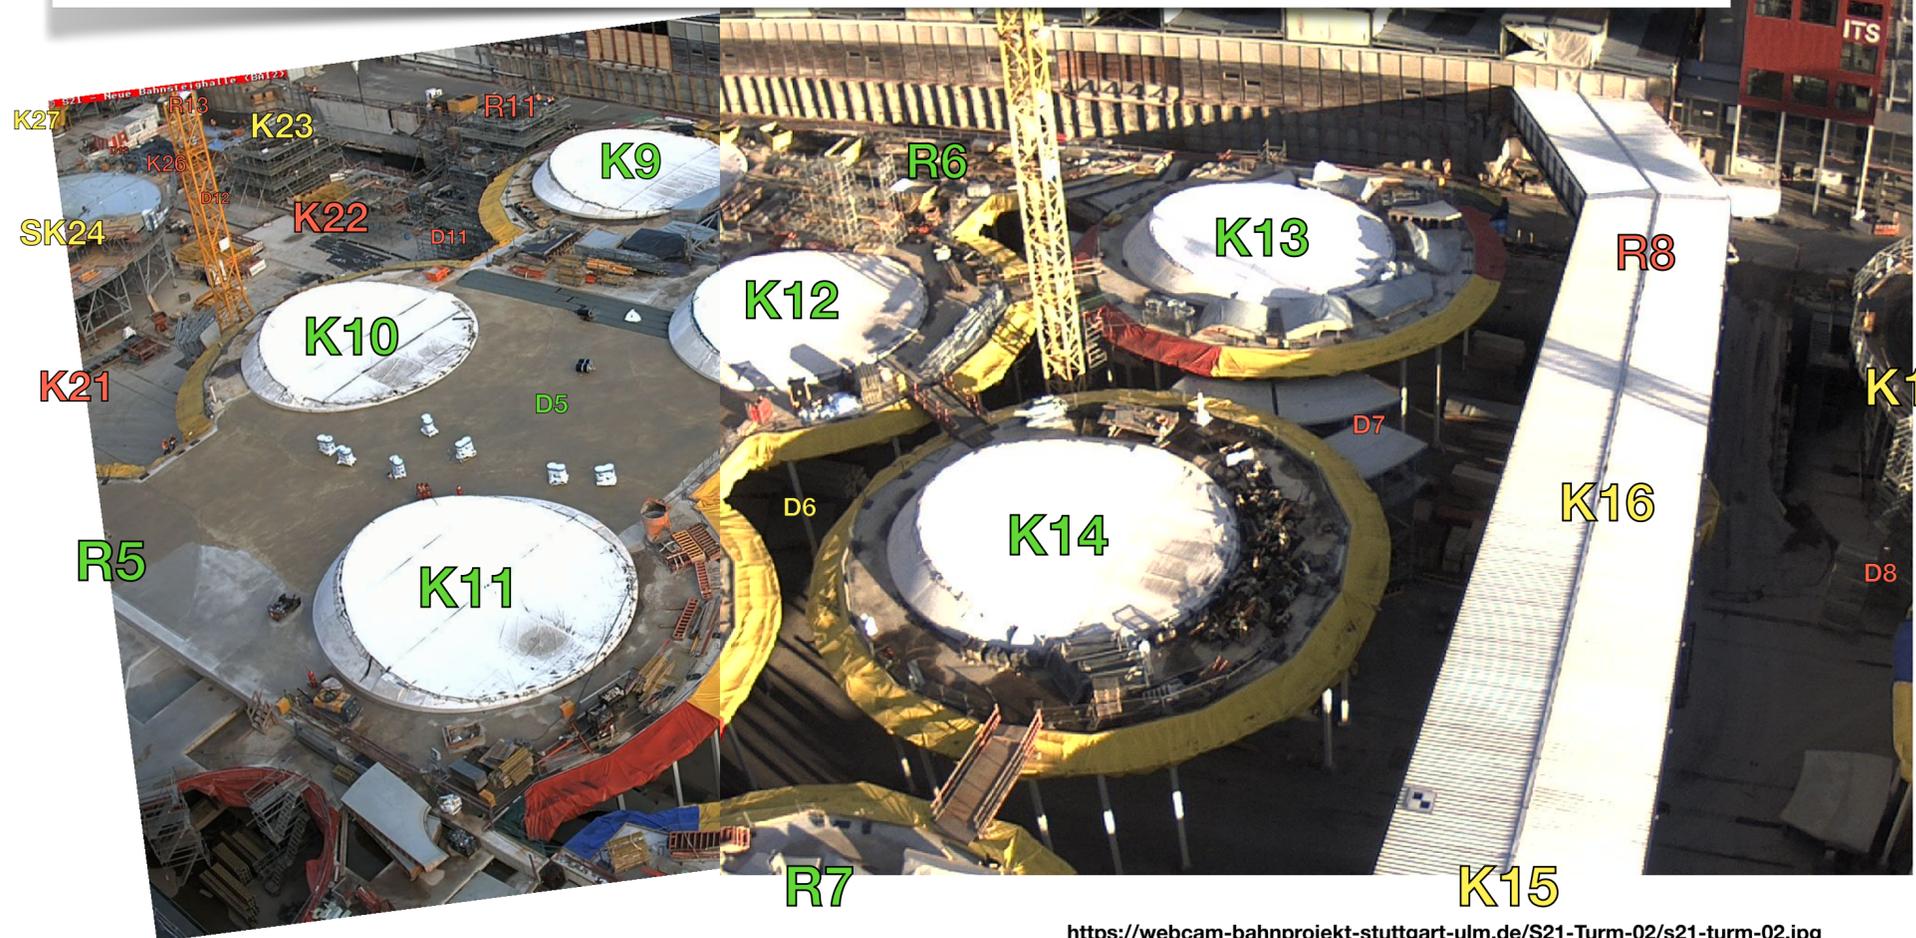

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

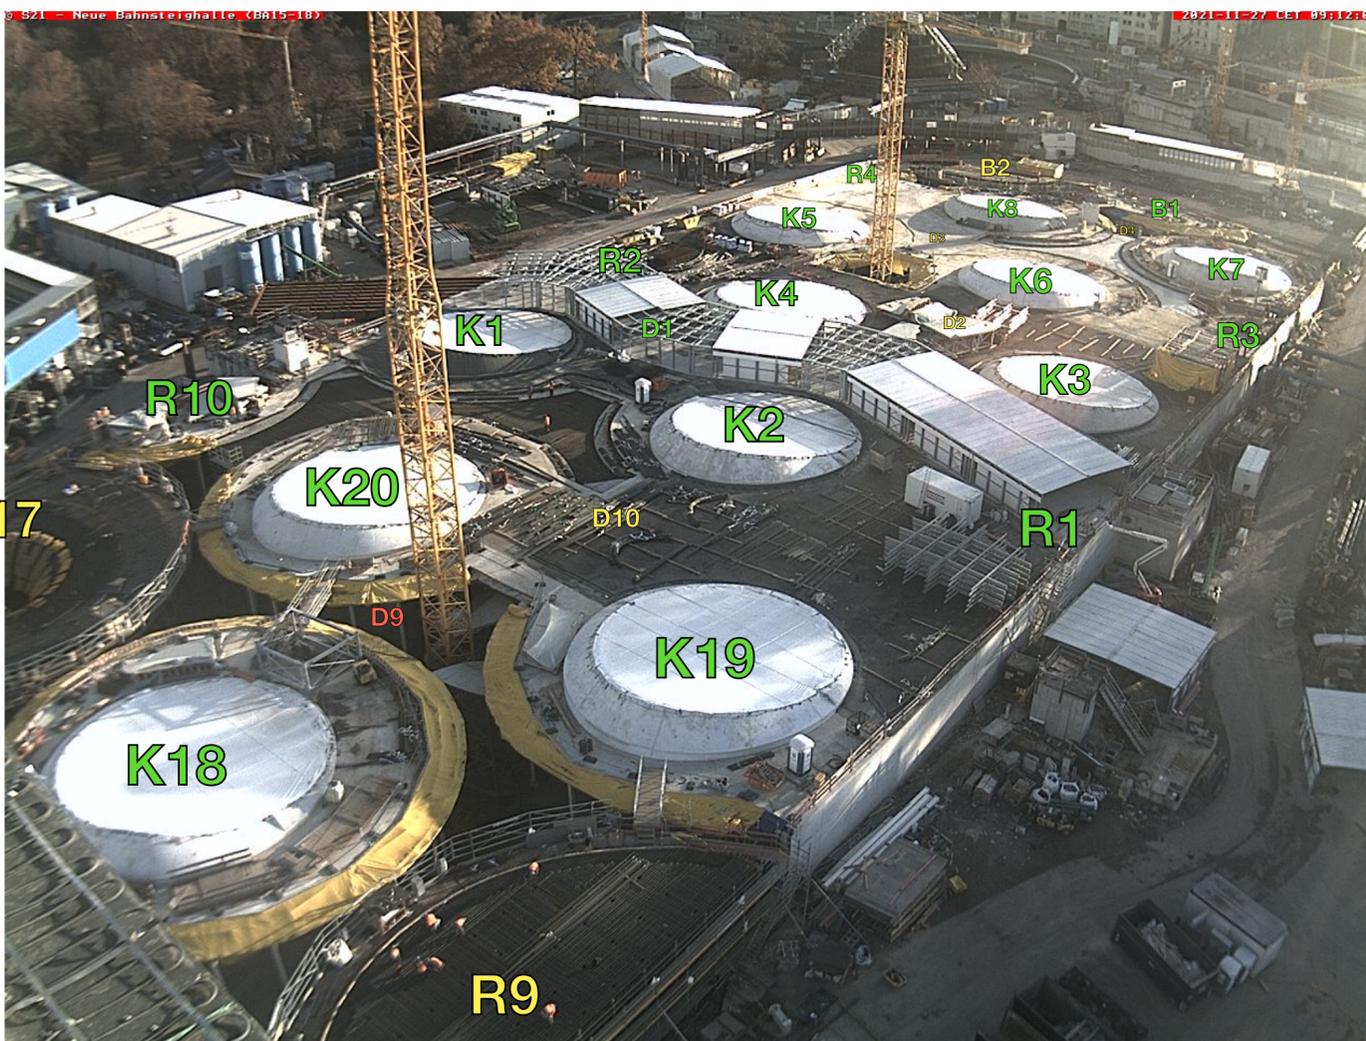


<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Swindgasse 27. November 2021




Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 K21-K28 R11-R14 B3 u. B4

Insgesamt fertig: 18 Kelchstützen, 24 Kelchfüße, 8 Restkelche, ein Brillenwandkelch und 2 Schwindgassen

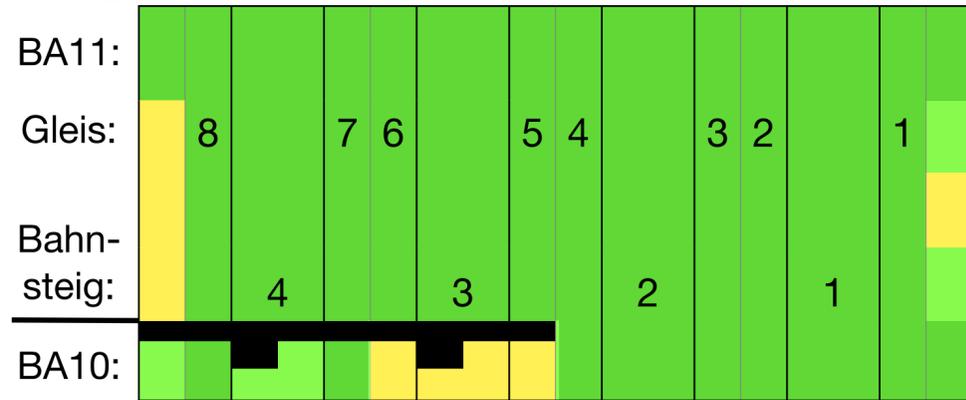

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-uhl.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>

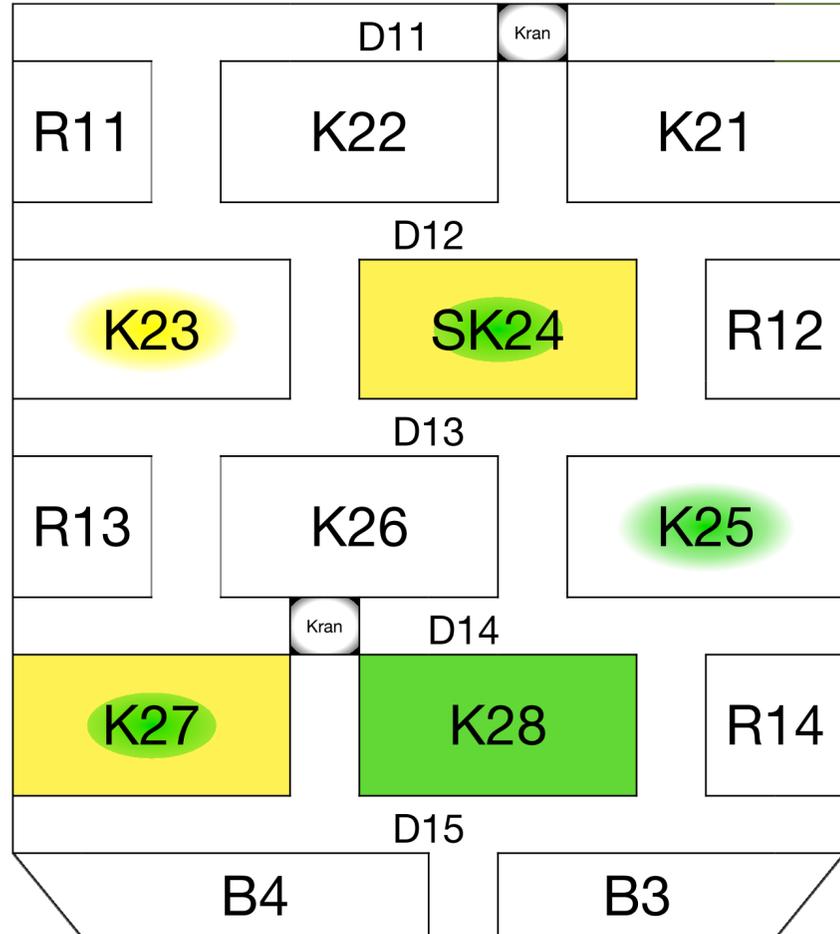

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch

BA 10 und 11:
Grün: Bahnsteigkante
Blau: Fahrbahnen
Seitenwandkante

27. November 2021



Beschriftung durch S21Bau.TV

27. November 2021

Rot: nicht begonnen

Gelb: wird gebaut

Grün: ist betoniert

✓ Gebaut:

- ➔ 18 Kelchstützen
- ➔ 0 Glasgitter auf den Lichtaugen
- ➔ 8 Restkelche
- ➔ 1 Brillenwandkelch
- ➔ 24 Kelchfüße
- ➔ 11 Galeriestützen
- ➔ 2 Schwindgassen komplett und D2 (Kranausschnitt fehlt noch)
- ➔ 4 Lounge-Deckenplattenabschnitte
- ➔ 1 Lounge-Oberlichtgruppe

...muss noch:

- 10
- 28+3
- 6
- 3
- 4
- 5
- 13
- 5
- 7

davon im Bau:

- K17, SK24 und K27
- R9
- B2
- K23
- R11
- D10, D3, D4 und D6



Betonage der Kelche und Schwindgassen


			Kelchfuß	Hutze		Restkelch		Schwindgasse	
1	K1	20. Oktober 2018	10.06.2017	28.11.2018		1 R1	30. Juni 2018	1 D1	20. Januar 2021
2	K10	9. März 2019	19.04.2018	03.04.2019		2 R2	8. Dezember 2018	2 D2	1.9.2021 bis auf die Kraussparung
3	K2	16. April 2019	03.08.2017	22.05.2019		3 R6	15. Februar 2020	3 D5	29. Juni 2021
4	K3	7. September 2019	20.12.2017	02.10.2019		4 R3	11. Juli 2020	4 D10	
5	K9	26. Oktober 2019	15.05.2018	20.11.2019		5 R5	30. Oktober 2020	5 D4	
6	K14	14. Dezember 2019	12.11.2018	03.02.2020		6 R4	3. März 2021	6 D3	
7	K4	1. Februar 2020	10.10.2017	07.03.2020		7 R10	26. Mai 2021	7	
8	K8	2. Mai 2020	16.12.2019	03.06.2020		8 R7	9. September 2021	8	
9	K12	30. Mai 2020	05.11.2019	08.07.2020		9 R9		9	
10	K18	27. Juni 2020	13.02.2020	11.08.2020		10		10	
11	K5	5. September 2020	01.03.2019	15.10.2020		11		11	
12	K20	18. November 2020	09.07.2020	05.12.2020		12		12	
13	K11	16. Dezember 2020	03.06.2020	29.01.2021		13		13	
14	K6	Bergfest 27. Februar 2021	12.04.2019	30.03.2021		14 R8		14	
15	K19	17. April 2021	27.08.2020	12.05.2021				15	
16	K13	19. Juni 2021	15.12.2018	16.07.2021					
17	K7	4. September 2021	05.12.2020	07.10.2021					
18	K17		17.05.2020						
19	K28	27. November 2021	08.06.2021	-		Brillenwandkelch			
20	SK24		28.09.2021	-		1 B1	29. Juli 2021		
21	K27		30.04.2021	-		2 B2			
22	K25		12.11.2021			3 B3			
23	K23					4 B4			
24	K22								
25	K21								
26	K26								
27	K15		09.05.2019						
28	K16		05.06.2019						

Das Datum kann bei alten Daten einige Tage versetzt sein.

27. November 2021





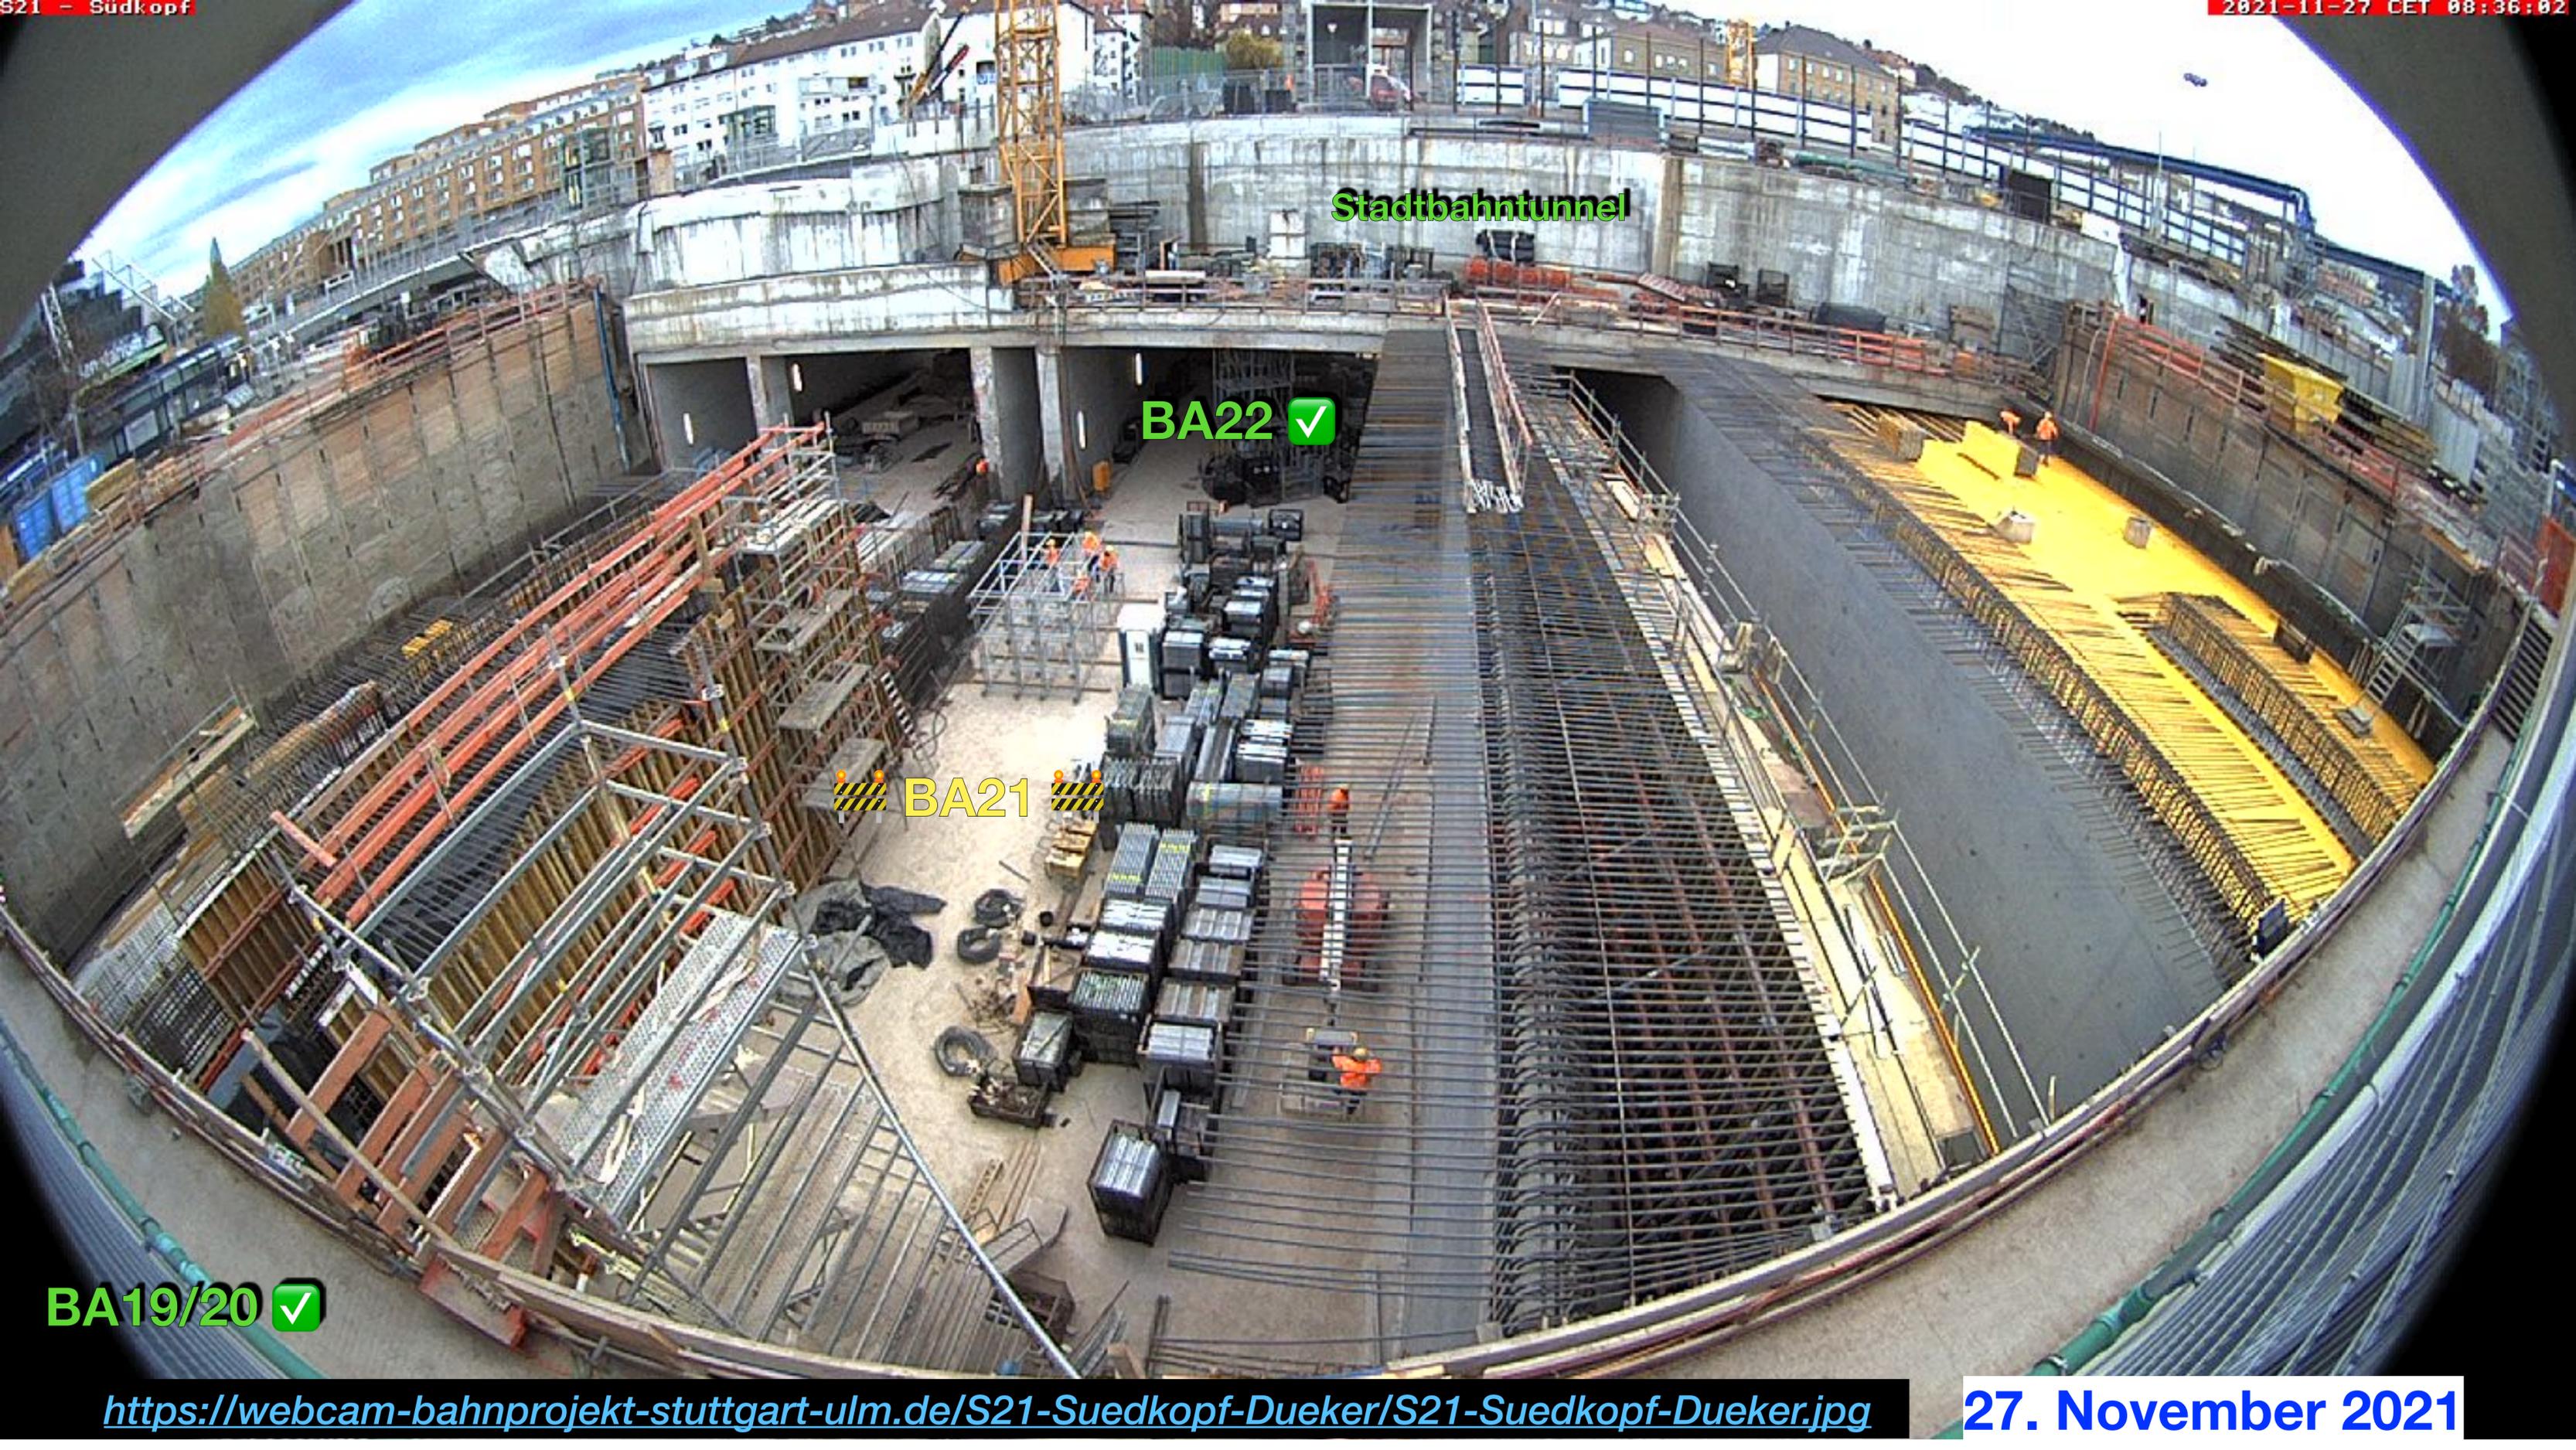

Stadtbahntunnel

BA22 ✓

⚠ BA21 ⚠

BA19/20 ✓



K5

R4

B2

K8

B1

D4

D3

K7

K6

D2

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21_Tunnel_Suedkopf/S21-Tunnel-Suedkopf-1.jpg

R3

27. November 2021



K3

R1

K2

D10

K19

R9

K18

K20

D9

R10

K17

27. November 2021

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-01/S21-NBSH-BA15.jpg>



K15

K16

K15
Galeriestütze

R7

K14

D7

K11

D6

R5

D5

K13

K10

K12

R12

K9

R6

K25

SK24

R14

K28

K22

K26

K23

K27

R13

R11

D1

B4

B3

B2

B1

B0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56

A57

A58

A59

A60

A61

A62

A63

A64

A65

A66

A67

A68

A69

A70

A71

A72

A73

A74

A75

A76

A77

A78

A79

A80

A81

A82

A83

A84

A85

A86

A87

A88

A89

A90

A91

A92

A93

A94

A95

A96

A97

A98

A99

A100

A101

A102

A103

A104

A105

A106

A107

A108

A109

A110

A111

A112

A113

A114

A115

A116

A117

A118

A119

A120

A121

A122

A123

A124

A125

A126

A127

A128

A129

A130

A131

A132

A133

A134

A135

A136

A137

A138

A139

A140

A141

A142

A143

A144

A145

A146

A147

A148

A149

A150

A151

A152

A153

A154

A155

A156

A157

A158

A159

A160

A161

A162

A163

A164

A165

A166

A167

A168

A169

A170

A171

A172

A173

A174

A175

A176

A177

A178

A179

A180

A181

A182

A183

A184

A185

A186

A187

A188

A189

A190

A191

A192

A193

A194

A195

A196

A197

A198

A199

A200

A201

A202

A203

A204

A205

A206

A207

A208

A209

A210

A211

A212

A213

A214

A215

A216

A217

A218

A219

A220

A221

A222

A223

A224

A225

A226

A227

A228

A229

A230

A231

A232

A233

A234

A235

A236

A237

A238

A239

A240

A241

A242

A243

A244

A245

A246

A247

A248

A249

A250

A251

A252

A253

A254

A255

A256

A257

A258

A259

A260

A261

A262

A263

A264

A265

A266

A267

A268

A269

A270

A271

A272

A273

A274

A275

A276

A277

A278

A279

A280

A281

A282

A283

A284

A285

A286

A287

A288

A289

A290

A291

A292

A293

A294

A295

A296

A297

✓ Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:

27. November 2021



✓	BA 1	Rohbau Schwallbauwerk Nord ✓
✓	BA 2	
✓	BA 3	
✓	BA 4-7	...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12 ✓
✓	BA 8	...mit den vier Notausgängen Nord ✓

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:

	BA 9	
	BA 10	Bodenplatte und Seitenwand auf Seite Bonatzbau sind gebaut und auf der anderen Seite im Bau.
	BA 11	liegt über der S-Bahn und wurde mit Spannbetonbrücken gebaut ✓ Nun werden noch die beiden Wände errichtet.
✓	BA 12	
	BA 13	
	BA 14	Baulogistik Rampe ist auf der fertigen Bodenplatte angelegt.
	BA 15	
✓	BA 16	
	BA 17	
	BA 18	Brillenwandkelch B1 zum Anschluß an Südkopf ist fertig. B2 wird gebaut.


Südkopf: Bauabschnitt 19-25:

✓	BA 19/20	BA20 ist der Nesenbachdüker unter dem Zulauftunnel. Südausgang und Notausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.
	BA 21	🚧 Zweiter Abschnitt der Bodenplatte ist betoniert. Wände werden gebaut.
✓	BA 22	...liegt unter den Zugangstunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und ist komplett fertig.
	BA 23	...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zulauftunneln. Diese sind nun abgebrochen. 🚧
✓	BA 24	Rohbau Schwallbauwerk Süd ist bald fertig.
✓	BA 25	

Backup: Original Schalungsfolie



**Brillenwand-
kelche**

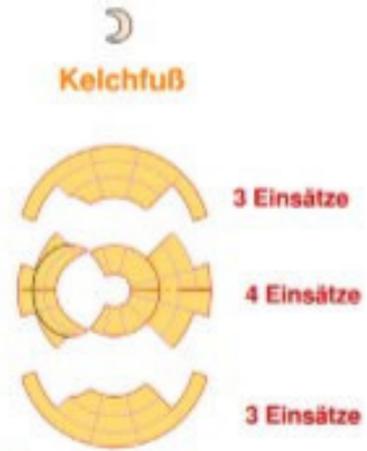

**(Oranger) =
3. Schalsatz**




Sonderkelch



(Grüner) = 2. Schalsatz



(Roter)=1. Schalsatz

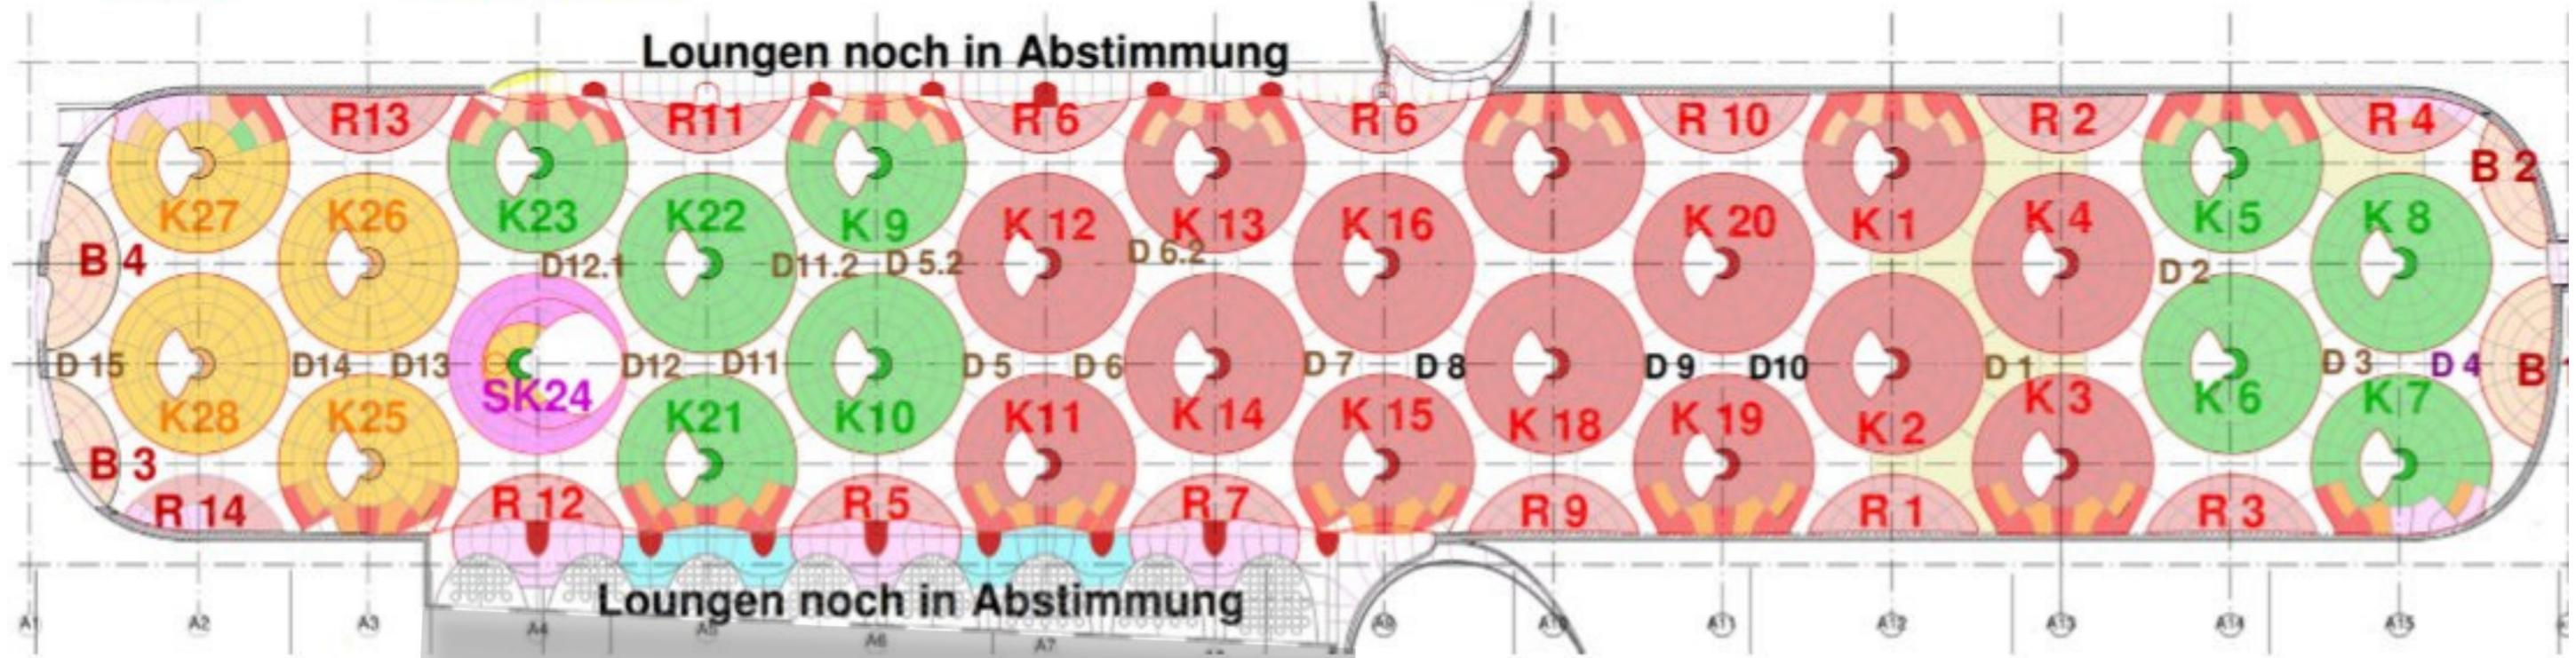

Bonatzbau
