


Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 K1-K20 R1-R10 B1 u. B2

BA12			BA13			B14			BA15			BA16			BA17			BA18		
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020	D 6	K13	D 7	R8	D 8	K17	D 9	R10	D 10	K1 20.10.2018	D 1	R2 8.12.2018	D 2	K5 5.9.2020	D 3	R4 3.3.2021	D 4	B2
K10 9.3.2019		K12 30.5.2020		K14 14.12.2019		K16		K18 27.6.2020		K20 18.11.2020		K2 16.4.2019		K4 1.2.2020		K6 27.2.2021		K8 2.5.2020		
R5 30.10.2020		K11 16.12.2020		R7		K15		R9		K19 17.04.2021		R1 30.6.2018		K3 7.9.2019		R3 11.7.2020		K7		B1

15 Kelchstützen, 20 Kelchfüße, 6 Restkelche, eine Schwindgasse

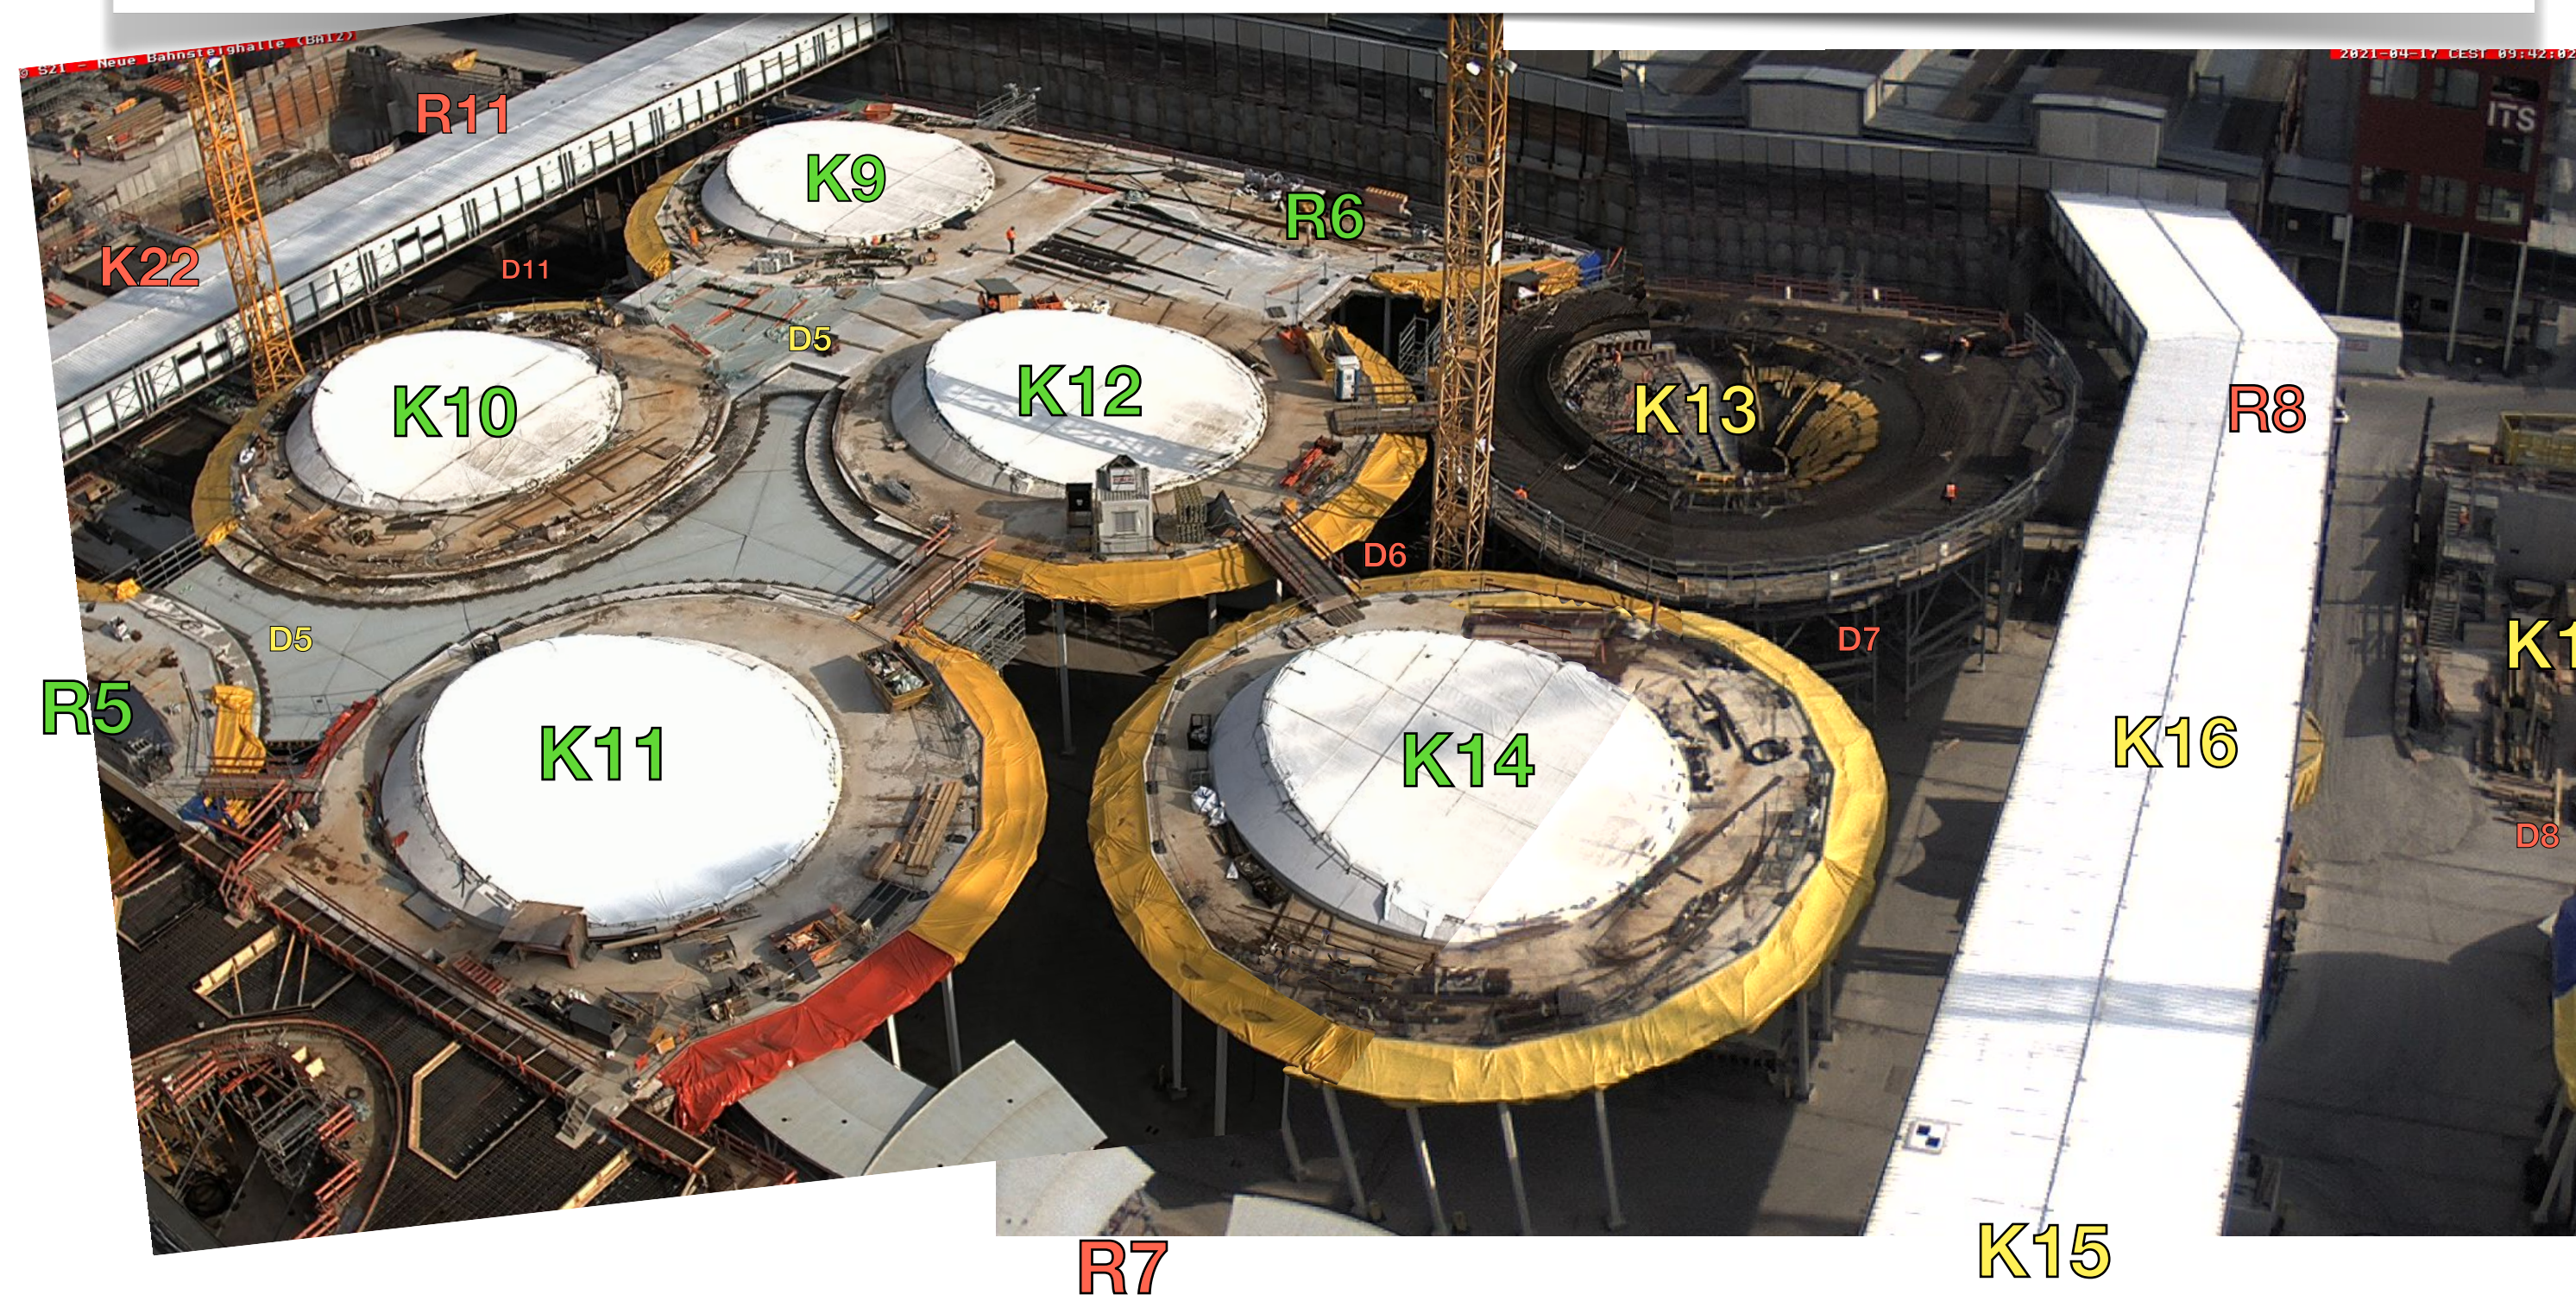

Beschriftung durch S21Bau.TV

17. April 2021

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

Fertiggestellt:

- ➔ 15 Kelchstützen (von 28)
- ➔ 6 Restkelche (von 14)
- ➔ 1 Brillenwandkelch im Bau (von 4)
- ➔ 20 Kelchfüße (von 28)
- ➔ 9 Galeriestützen (von 16)
- ➔ 1 Schwindgasse (von 15) + $\frac{1}{3}$ D2, $\frac{1}{2}$ D5
- ➔ 1 Lounge-Deckenplattenabschnitt (von 9)

im Bau:

K13 und K7
R10
B1
K27 und K28
Stütze für K21
D5 zweiter Teil
zwei



Betonage der Kelche und Schwindgassen

	Kelchblüte		Kelchfuß / Hutze		Restkelch			Schwindgasse	
1	K1	20. Oktober 2018	✓ / ✓	1	R1	30. Juni 2018	1	D1	20. Januar 2021
2	K10	9. März 2019	✓ / ✓ 3.4.2019	2	R2	8. Dezember 2018	2	D2	
3	K2	16. April 2019	✓ / ✓ 22.5.2019	3	R6	15. Februar 2020	3	D5	
4	K3	7. September 2019	✓ / ✓	4	R3	11. Juli 2020	4	D10	
5	K9	26. Oktober 2019	✓ / ✓	5	R5	30. Oktober 2020	5		
6	K14	14. Dezember 2019	✓ / ✓	6	R4	3. März 2021	6		
7	K4	1. Februar 2020	✓ / ✓	7	R10		7		
8	K8	2. Mai 2020	✓ / ✓ 3.6.2020	8			8		
9	K12	30. Mai 2020	✓ / ✓	9			9		
10	K18	27. Juni 2020	✓ / ✓	10			10		
11	K5	5. September 2020	✓ / ✓ 15.10.2020	11			11		
12	K20	18. November 2020	✓ / ✓	12			12		
13	K11	16. Dezember 2020	✓ / ✓ 29.1.2021	13			13		
14	K6	Bergfest 27. Februar 2021	✓ / ✓ 30.3.2021	14			14		
15	K19	17. April 2021	✓ /				15		
16	K13		✓ /						
17	K7		✓ /						
18	K17		✓ /		Brillenwandkelch				
19	K27		→ SOON						
20	K28		✓ /	1	B1				
21	K21		✓ /	2	B2				
22	K22			3					
23	K23			4					
24	K24								
25	K25								
26	K26						17. April 2021  IG BÜRGER		
27	K15								
28	K16								

Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:

17. April 2021




✓	BA 1	Schwallbauwerk wird gebaut.
✓	BA 2	
✓	BA 3	
✓	BA 4-7	...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.
✓	BA 8	Wiederherstellung der Rampe für den Kehrtunnel Heilbronner Straße und Freilegung der Notausgänge Nord.

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:

	BA 9	Bodenplatte fertig, eine Seitenwand fehlt noch.
	BA 10	Baulogrampe: Bodenplatte auf Seite Bonatzbau wird gebaut.
	BA 11	liegt über der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig. Die Spannbetonbrücken werden gebaut. Bodenplatte südlicher Teil zur Hälfte fertig.
	BA 12	
	BA 13	
	BA 14	
	BA 15	
✓	BA 16	
	BA 17	
	BA 18	

Südkopf: Bauabschnitt 19-25:

✓	BA 19/20	Ausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden. (Südausgang und Notausgänge)
	BA 21	
✓	BA 22	...liegt unter der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (und deren Zugangstunnel) und komplett ist fertig.
	BA 23	...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel. Diese werden gerade abgebrochen.
✓	BA 24	Schwallbauwerk wird gebaut.
✓	BA 25	

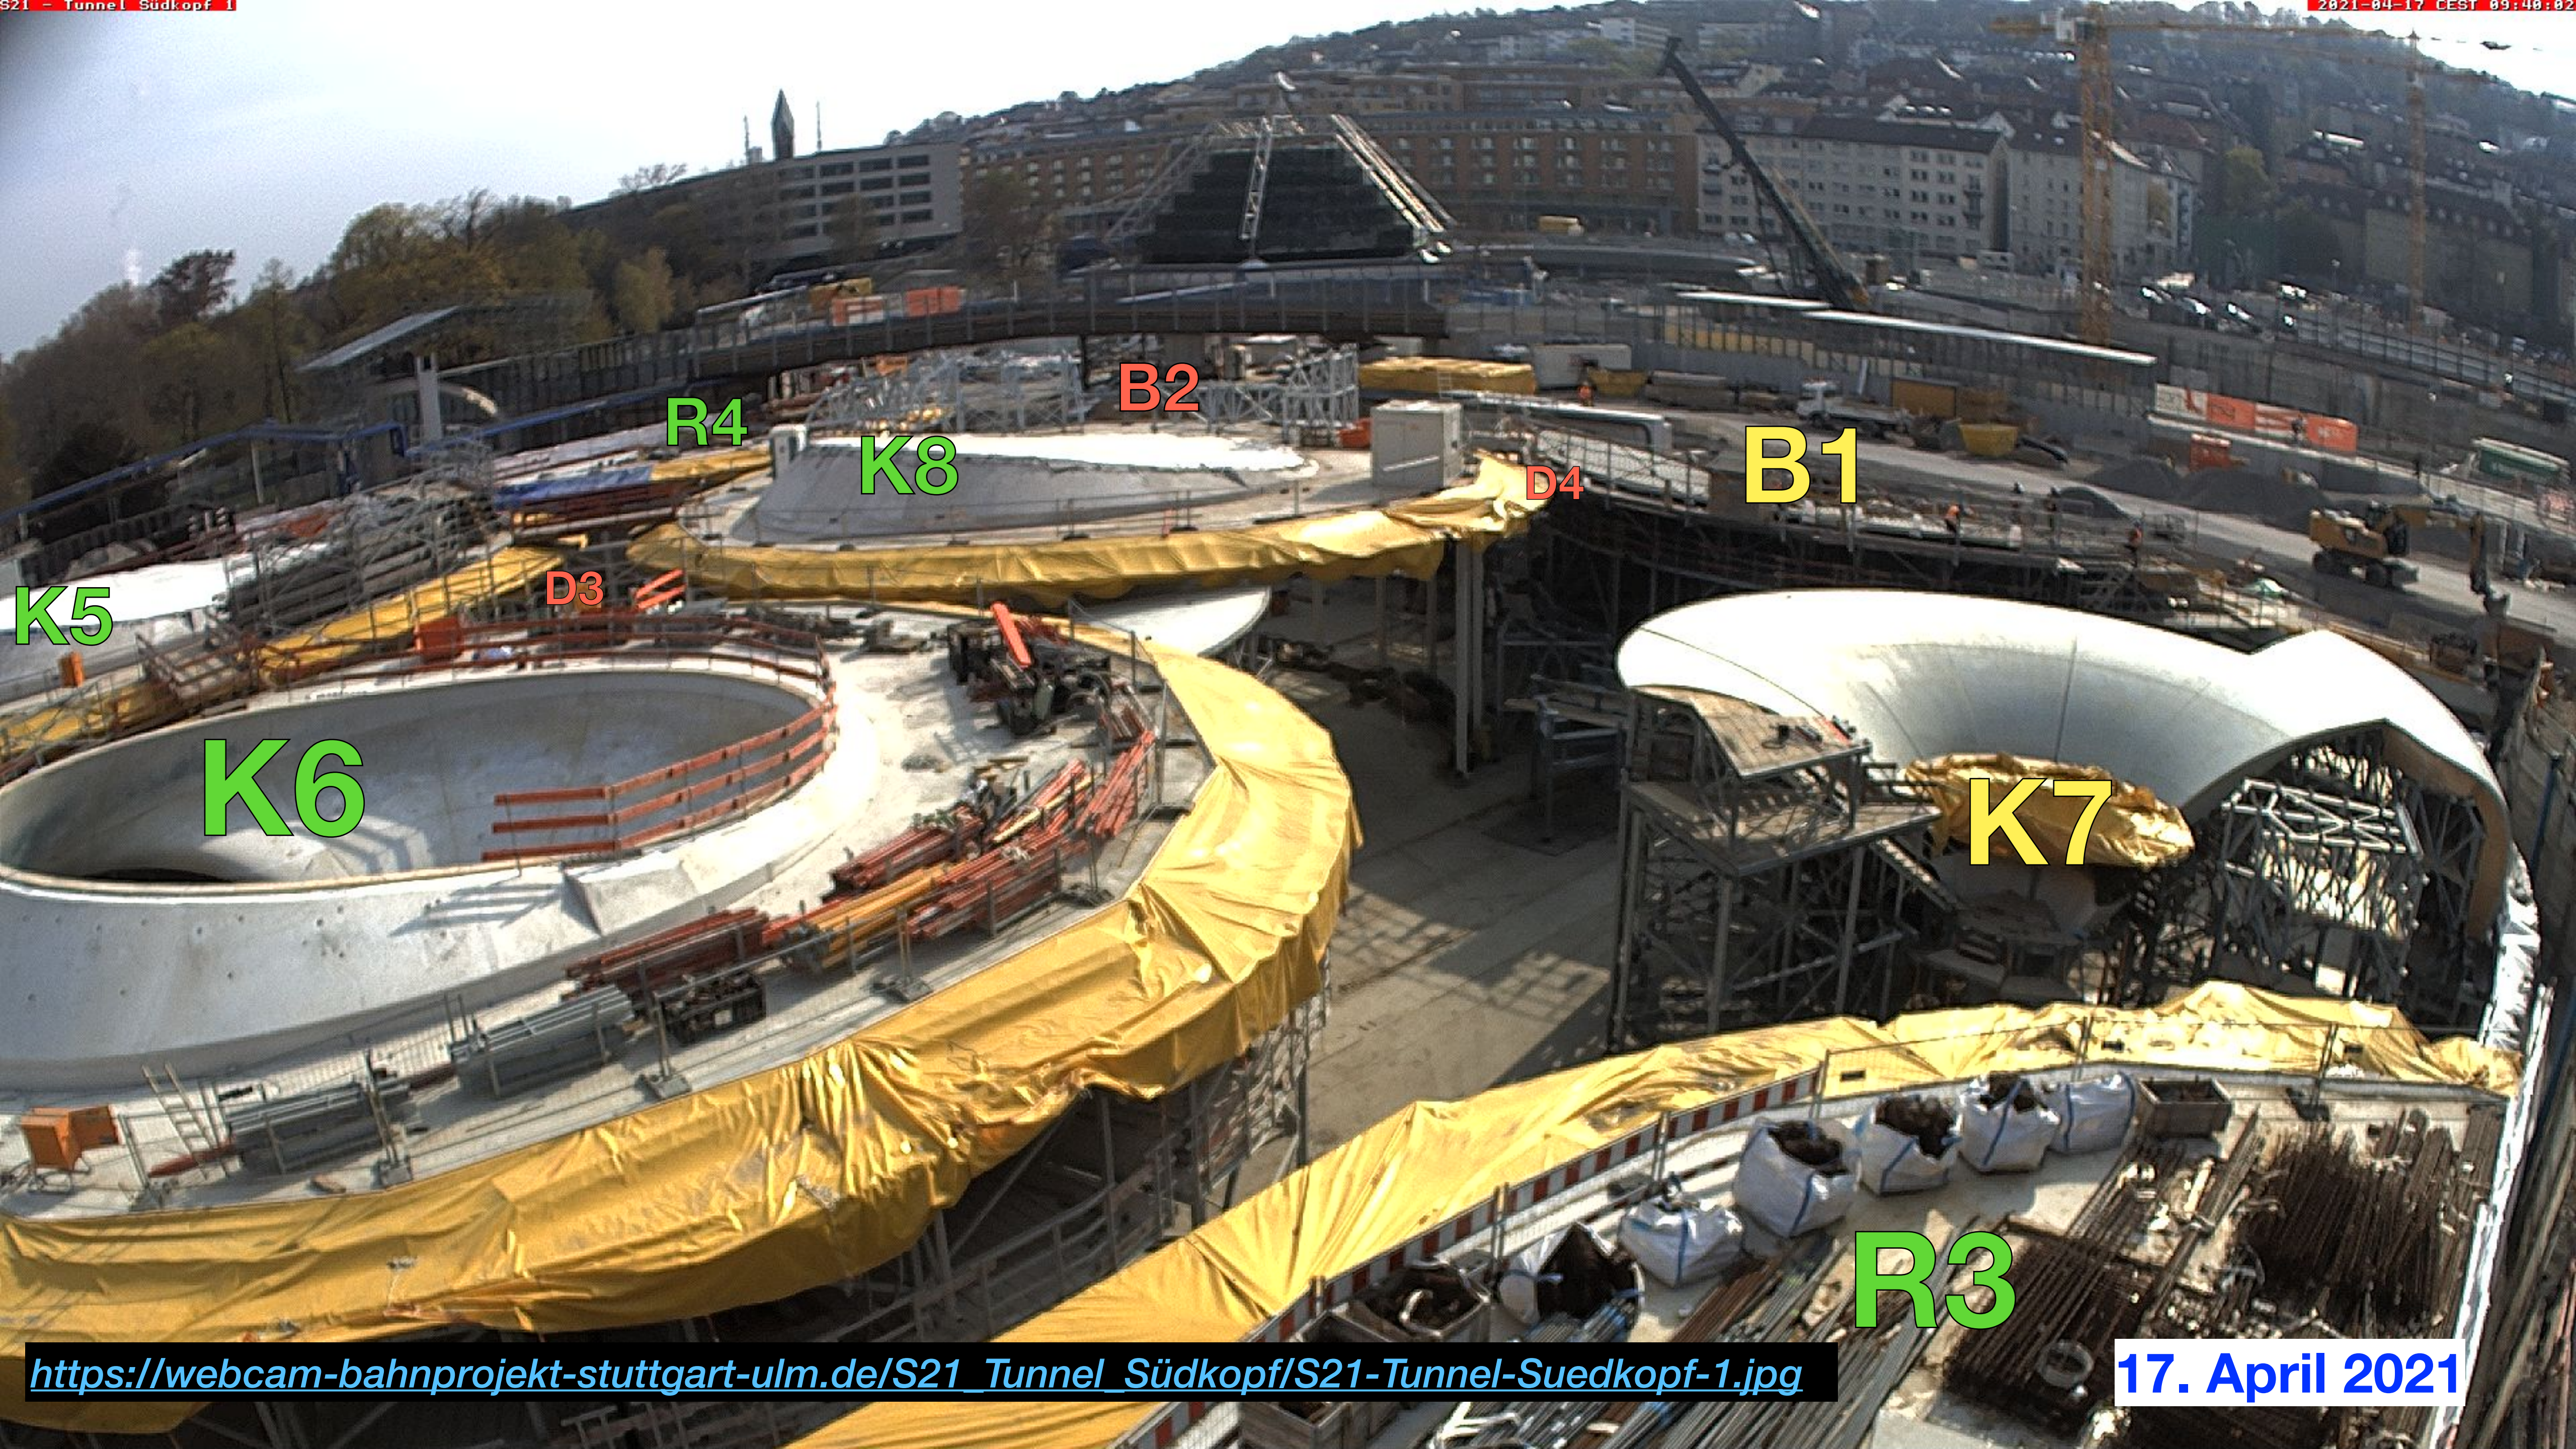

K5

K6

D3

R4

K8

B2

D4

B1

K7

R3





K3

R1

K19

R9

K2

K18


D10

K20

D9

R10

K17

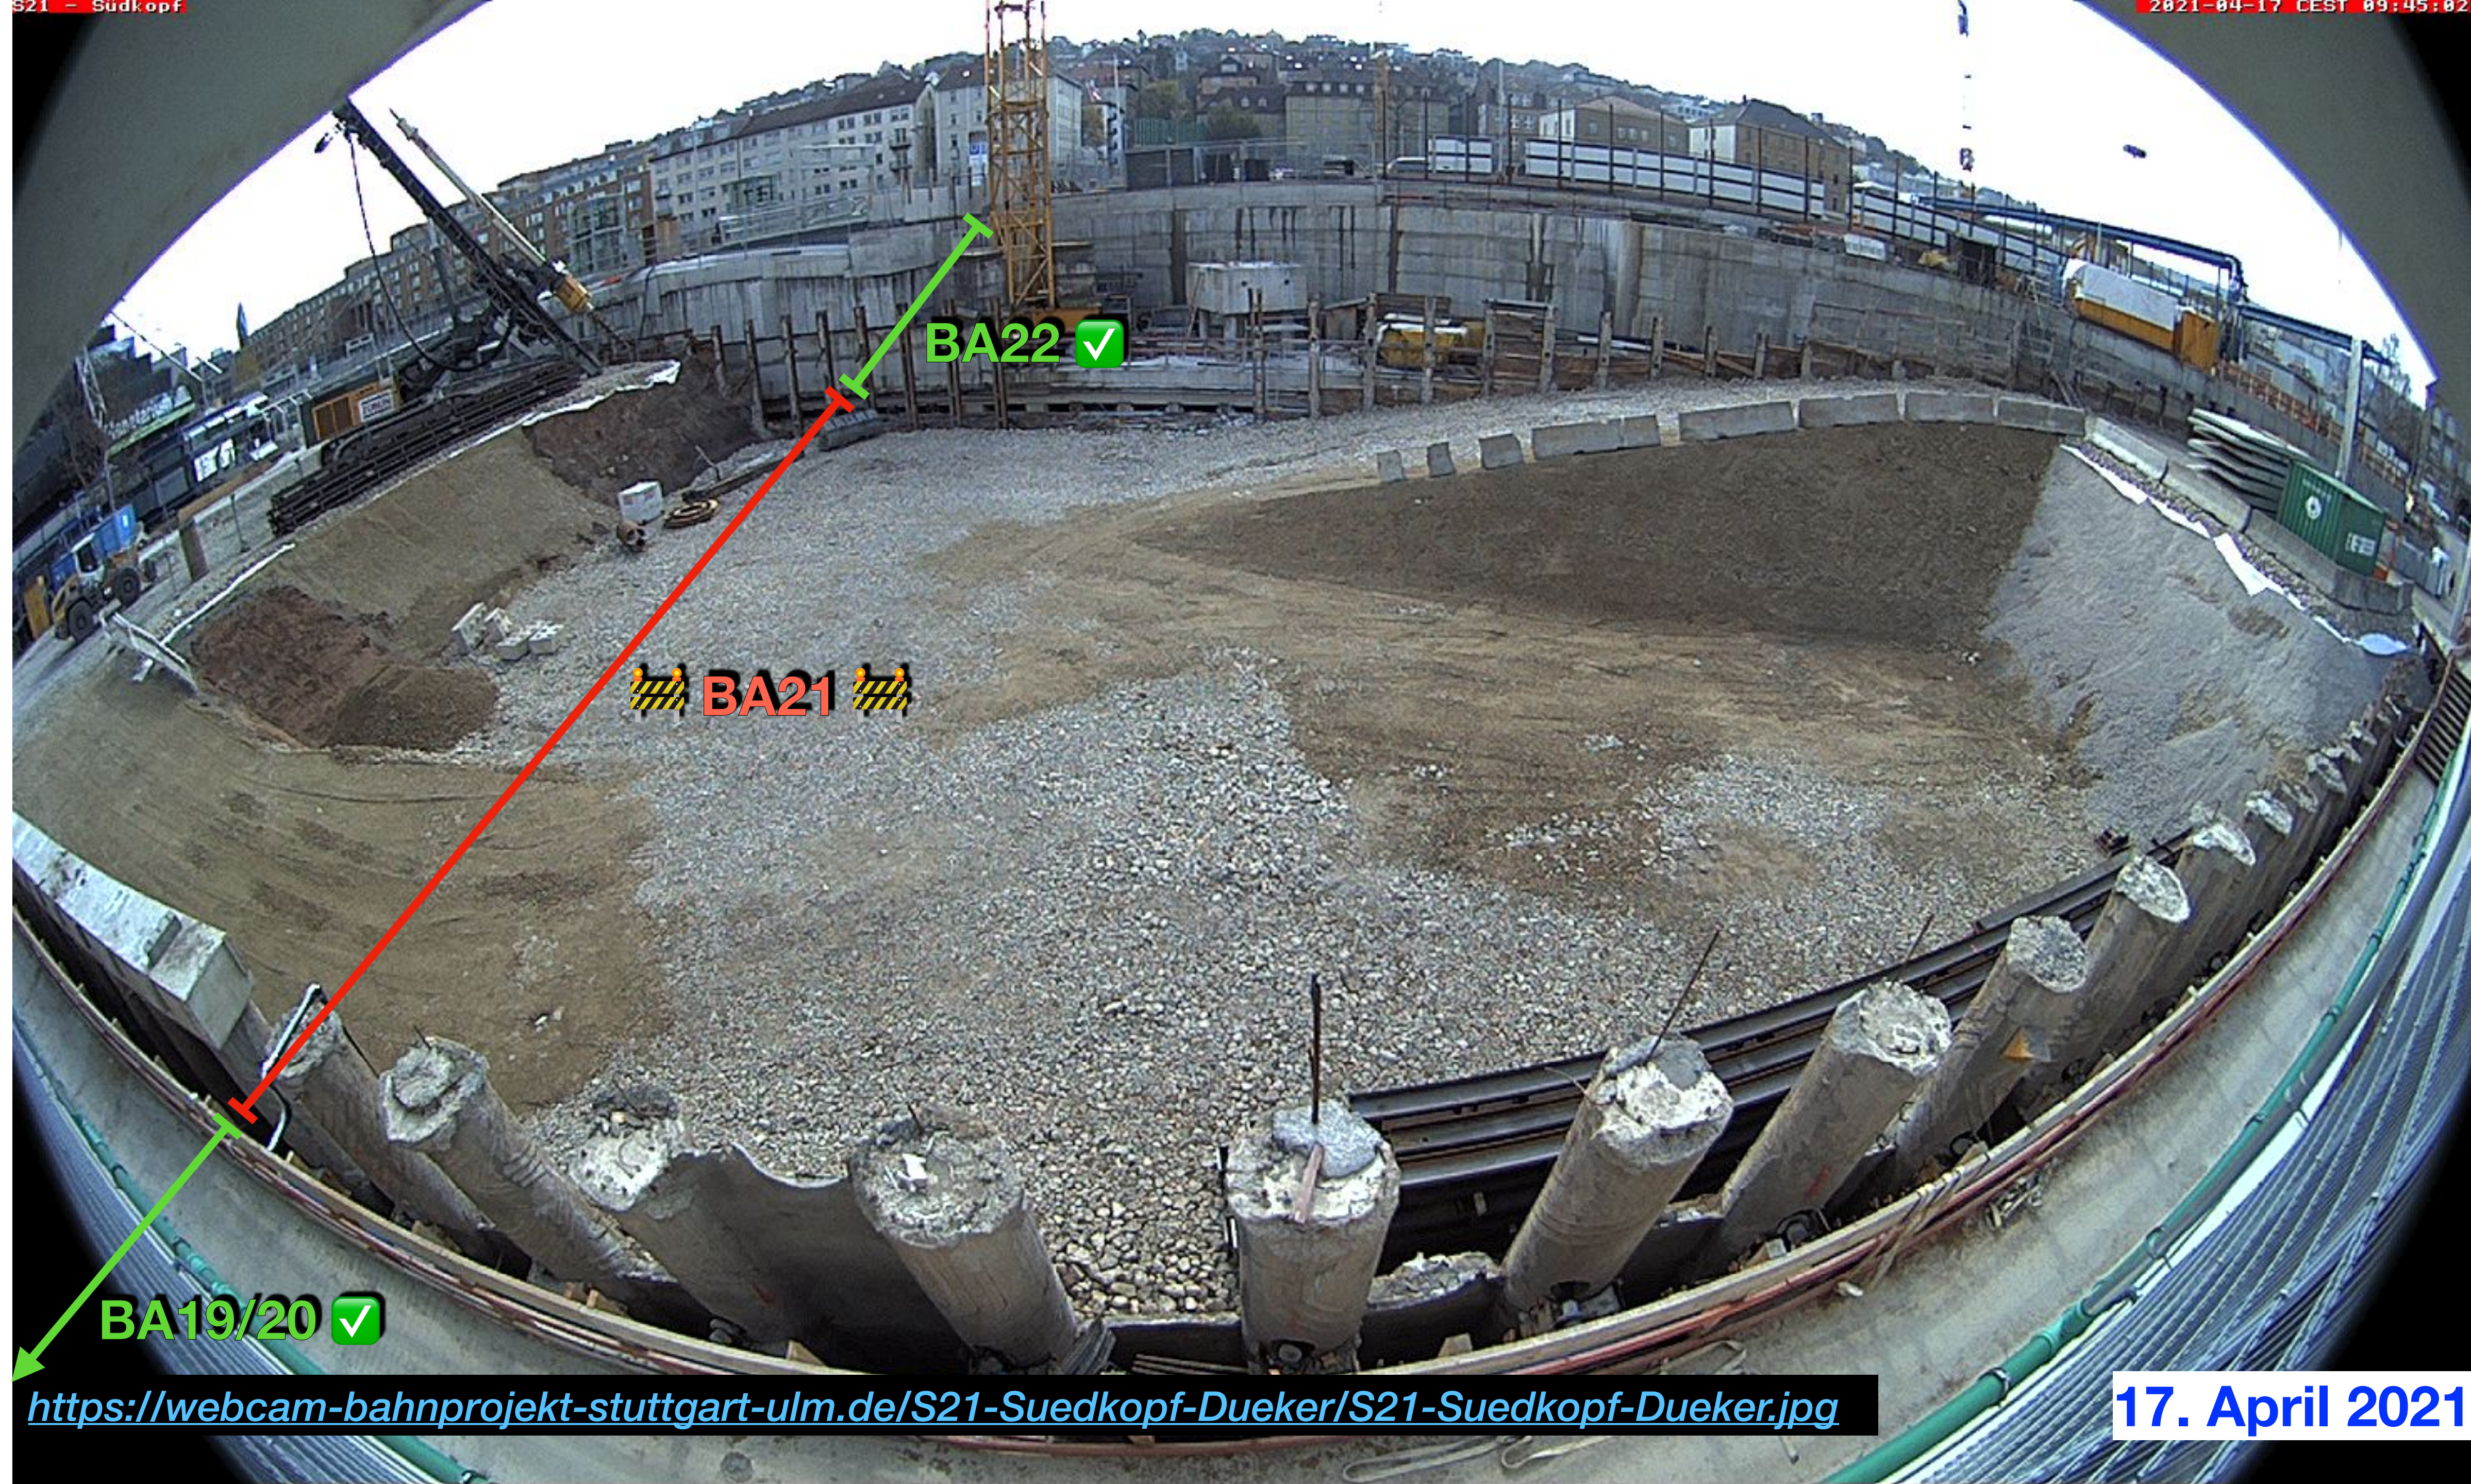

BA22 ✓

⚠ BA21 ⚠

BA19/20 ✓



Kriegsberg

Nordportal

Schwallbauwerk Nord

Jägerstraße (Originalverlauf)


Jägerstraße (verschwenkt)

Verstärkung wegen Stadtbahntunnel

Verstärkung der Deckenplatte im Weichenbereich

Nordkopf

17. April 2021

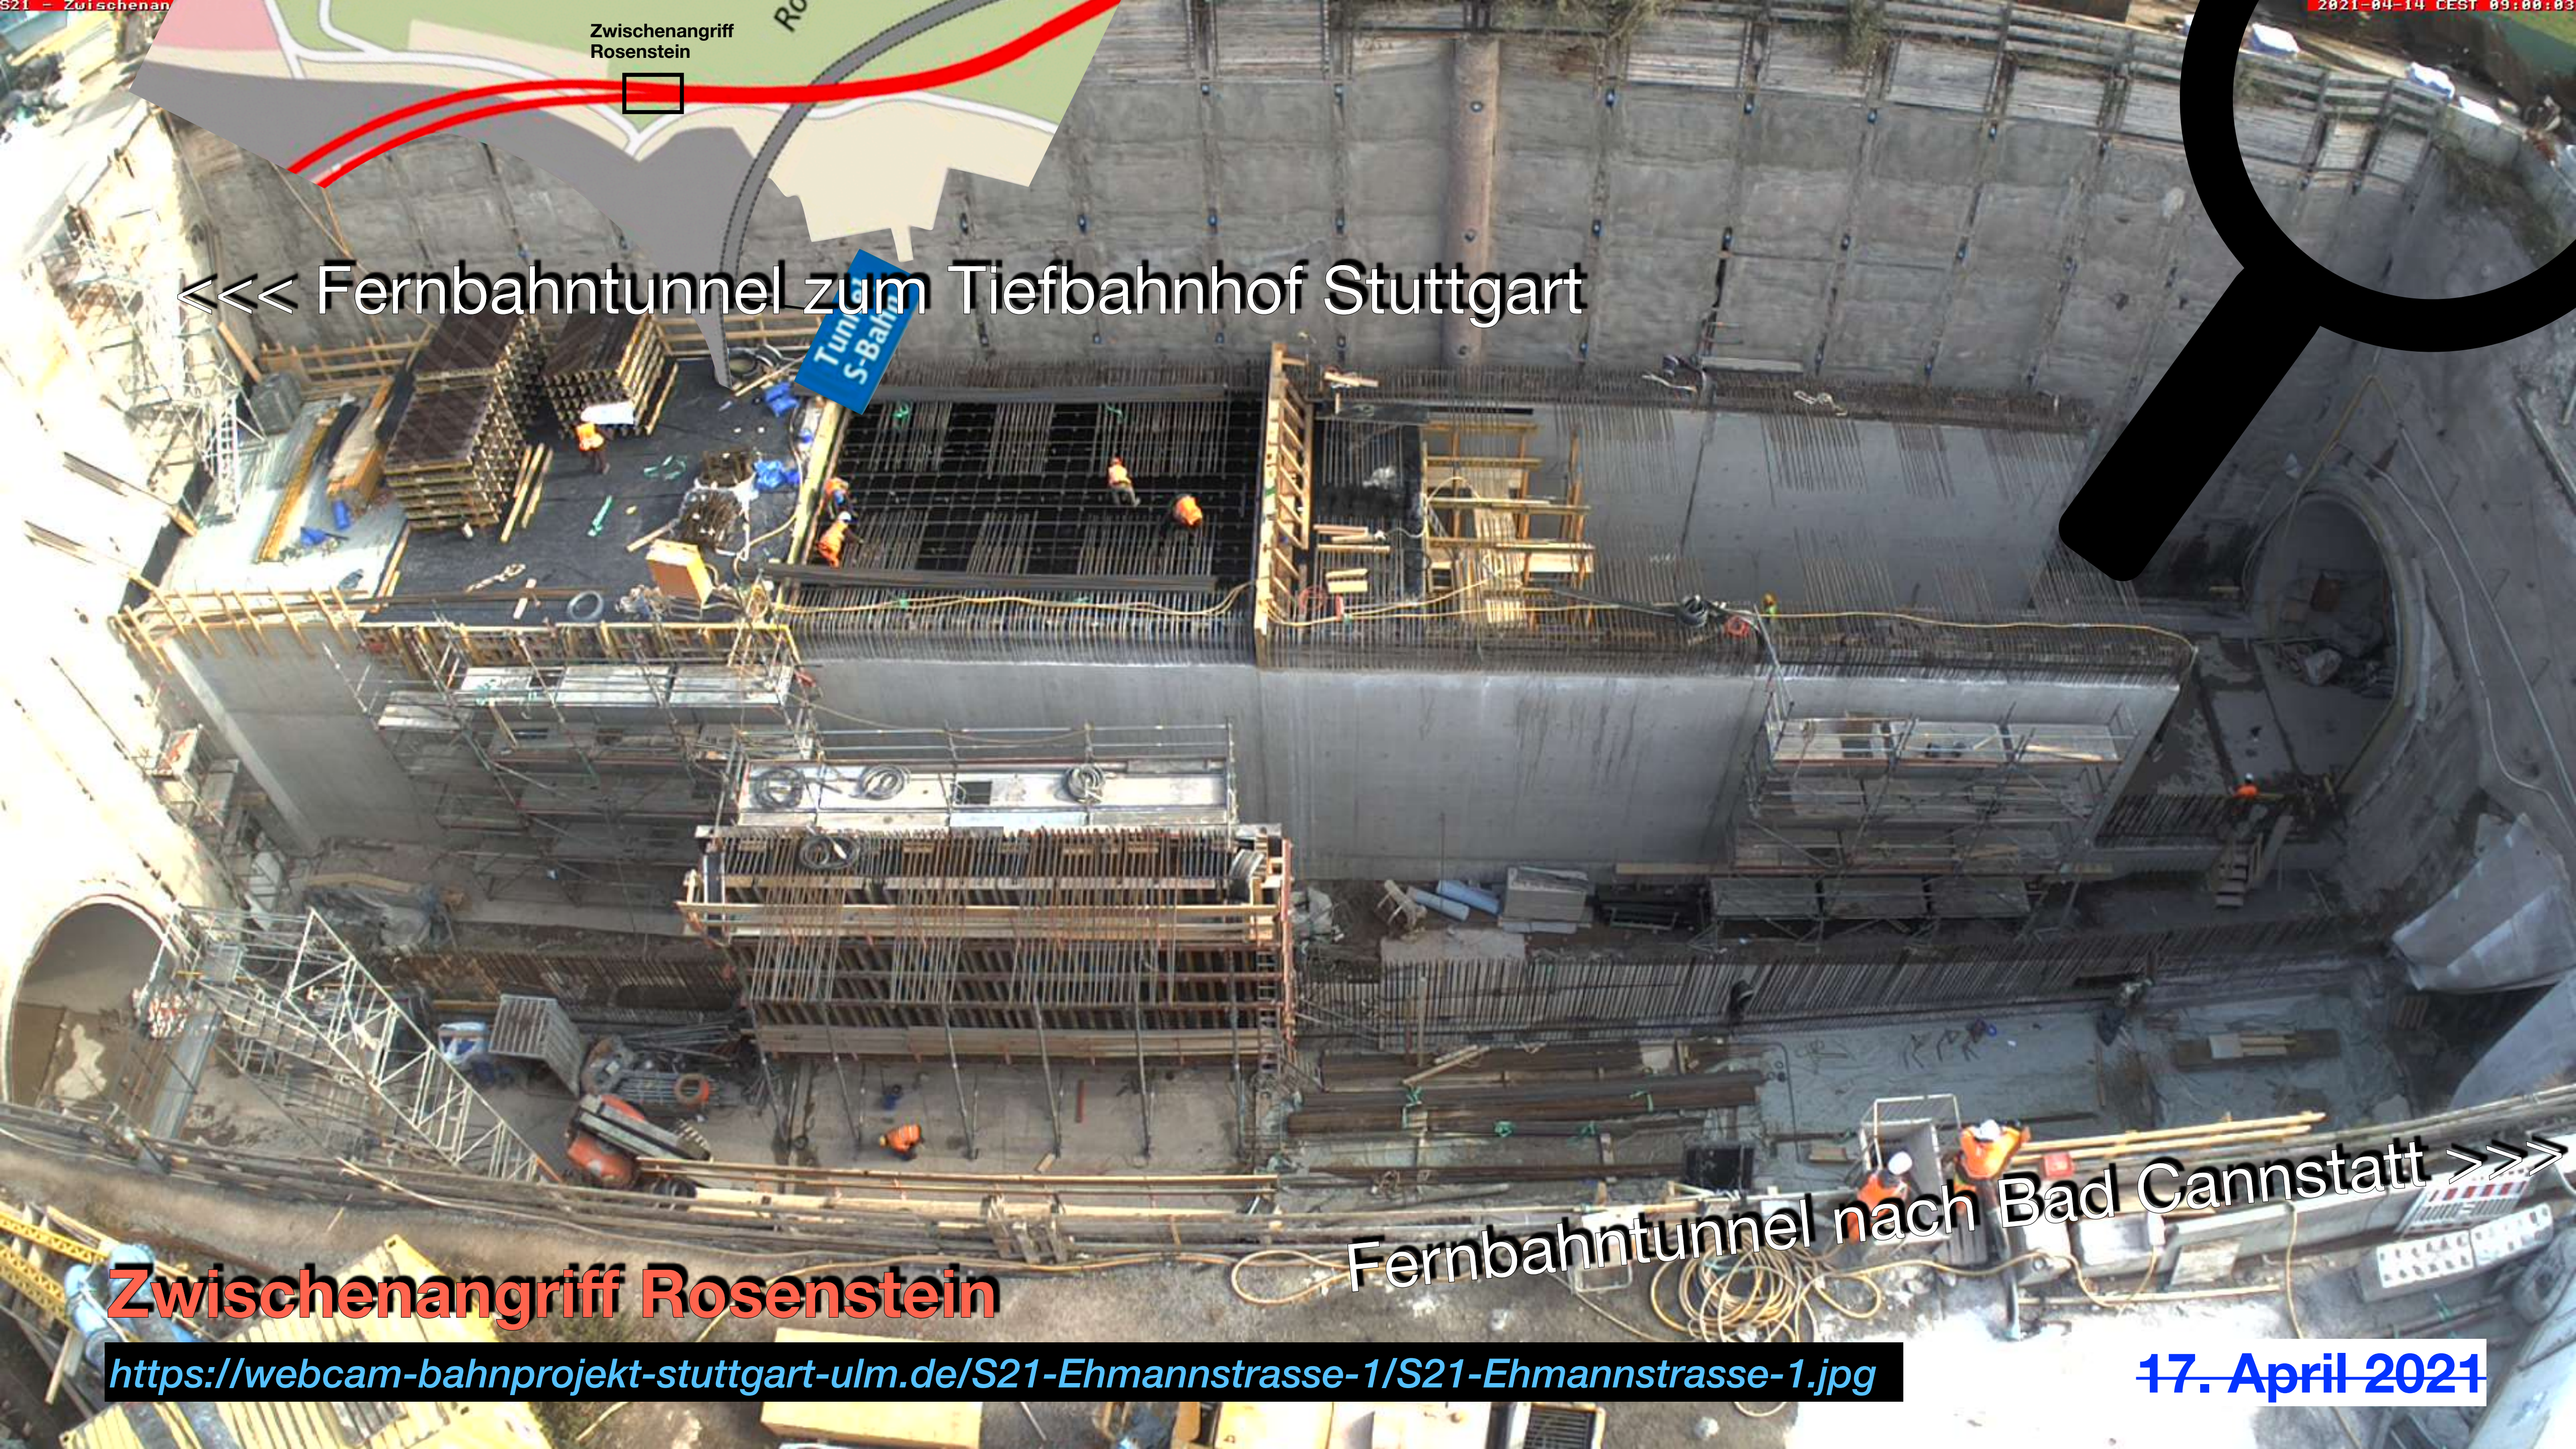

Zwischenangriff
Rosenstein

««« Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart

Tunnel
S-Bahn


Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt >>>

Zwischenangriff Rosenstein

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>

17. April 2021





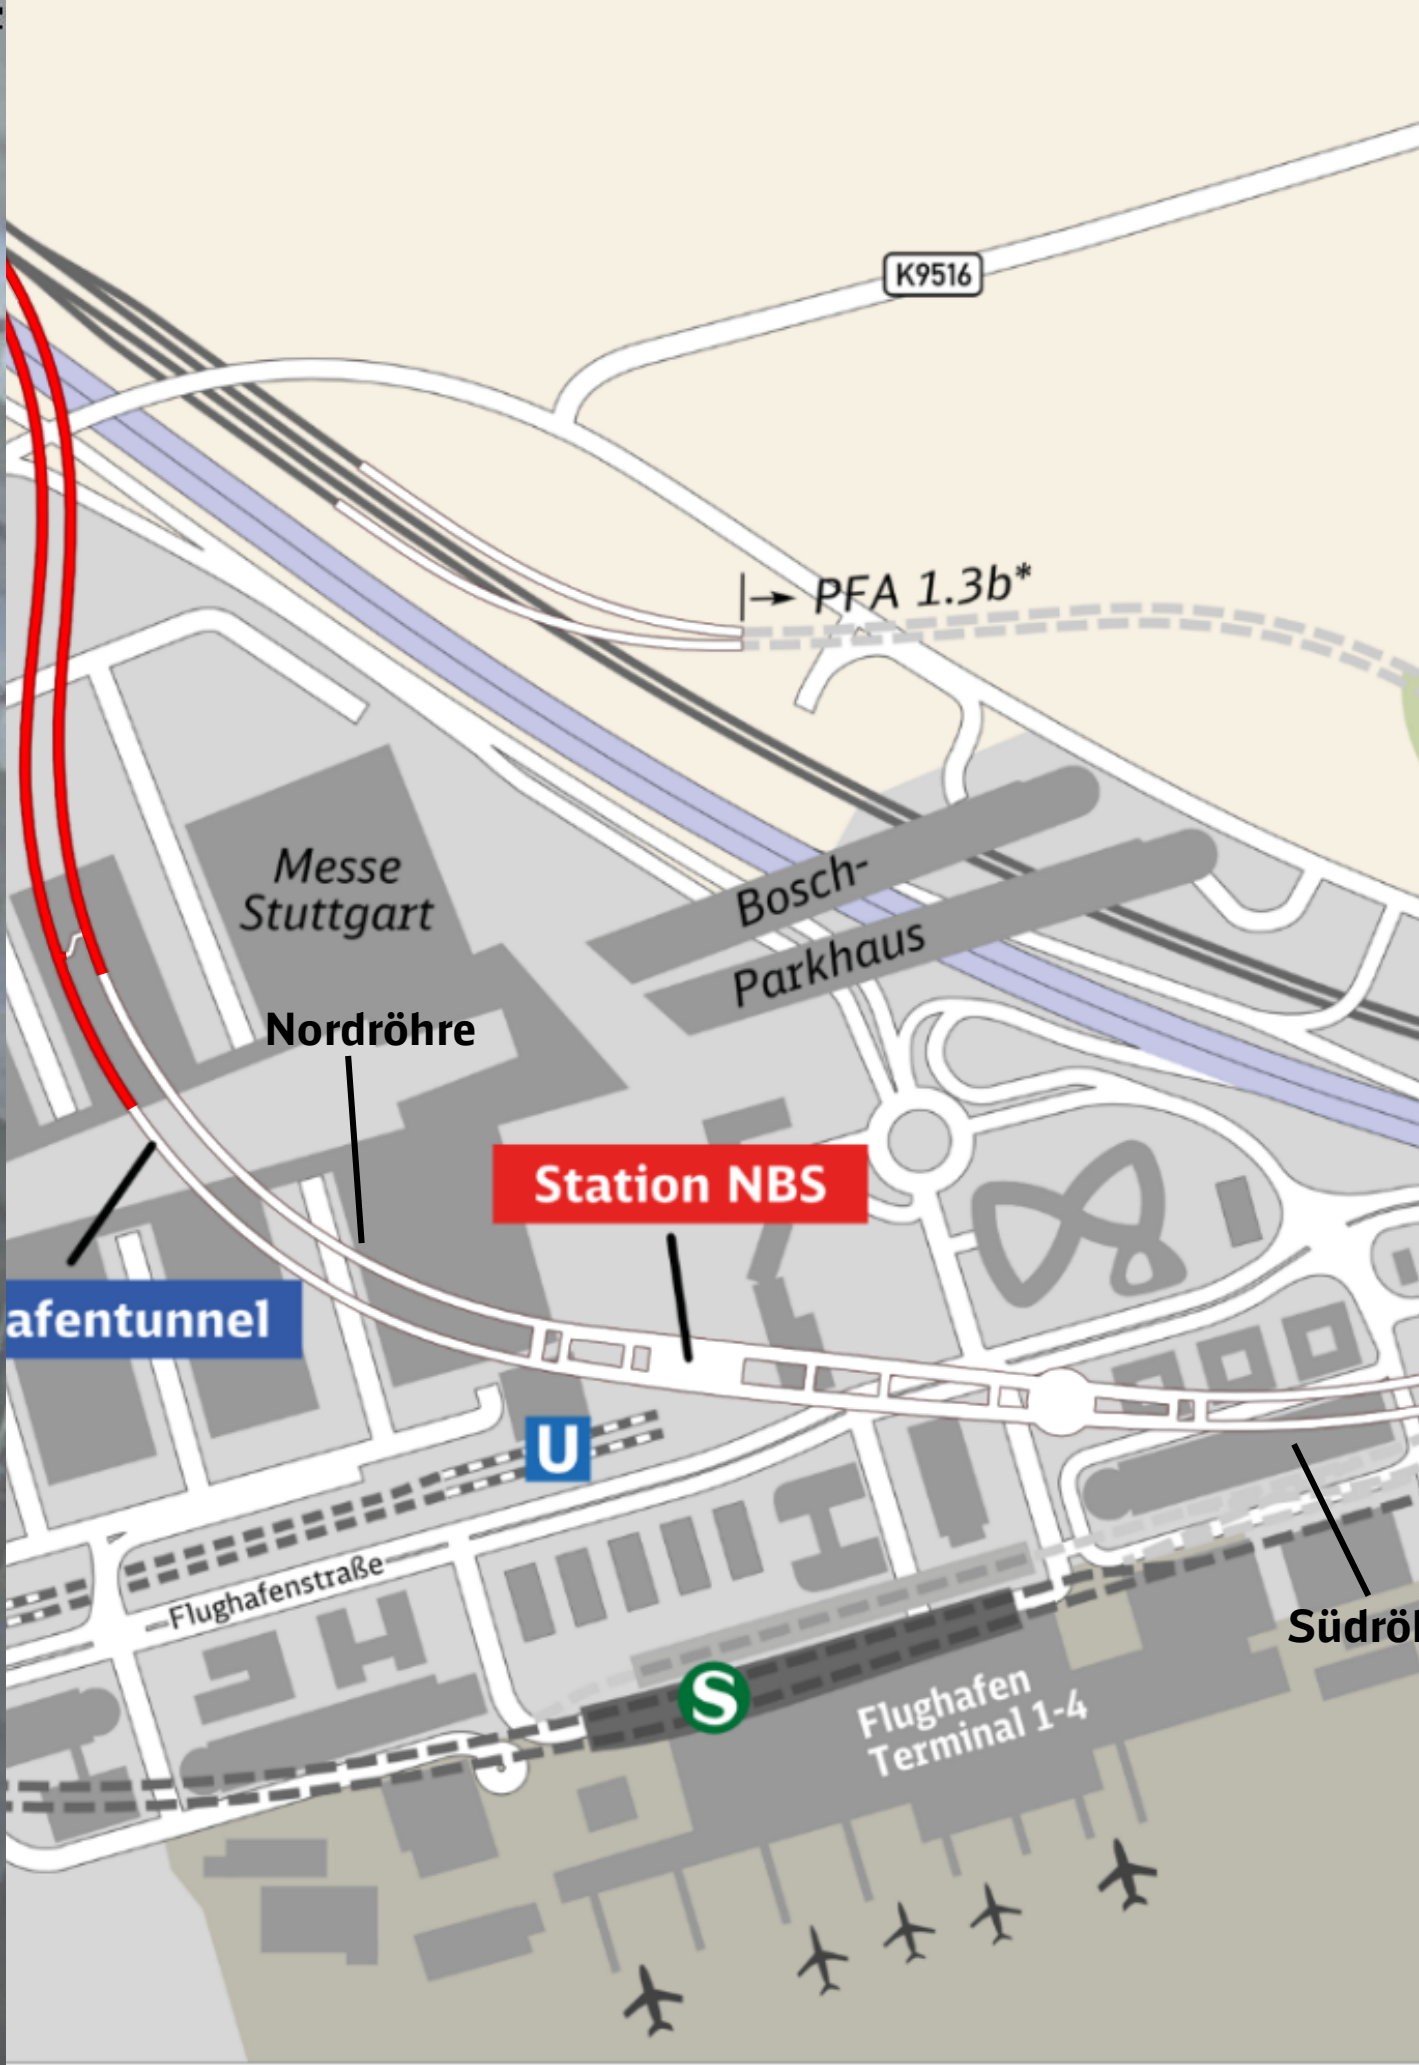

Baubetrieb		Ist**	Gesamt**
		1.605,79	4.394,90
		1.605,79	4.352,00
		749,89	2.130,00
		855,90	2.222,00
		0,00	42,90

17. April 2021

Backup: Original Schalungsfolie

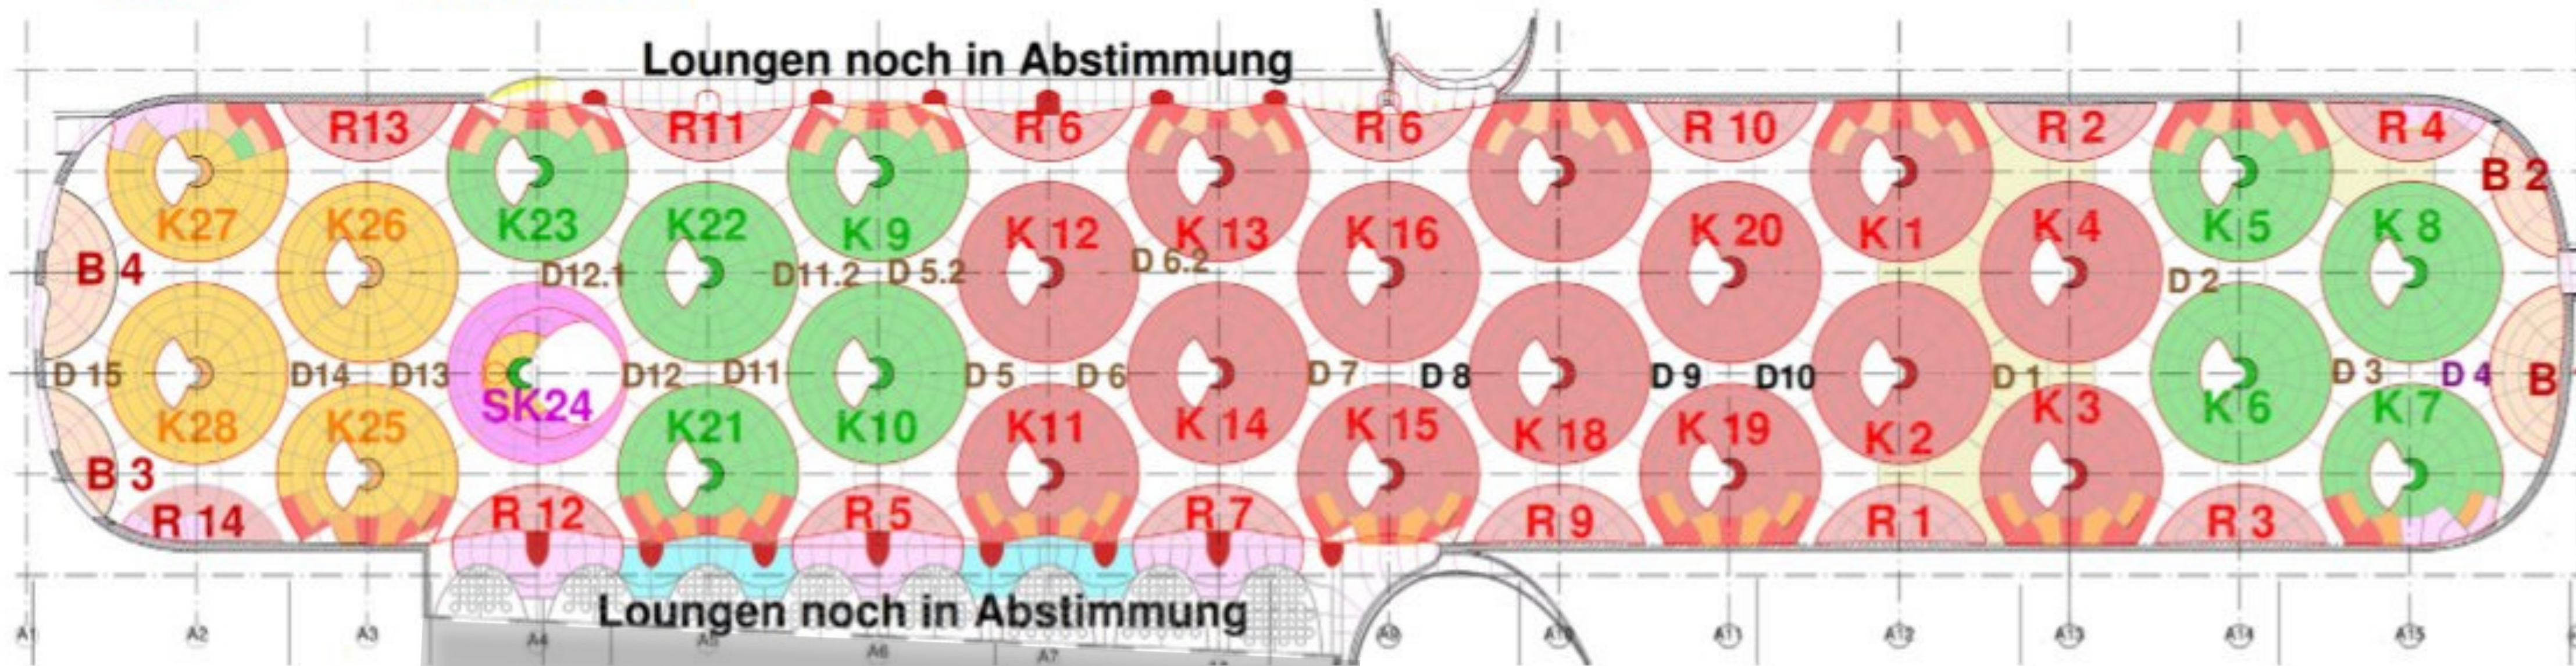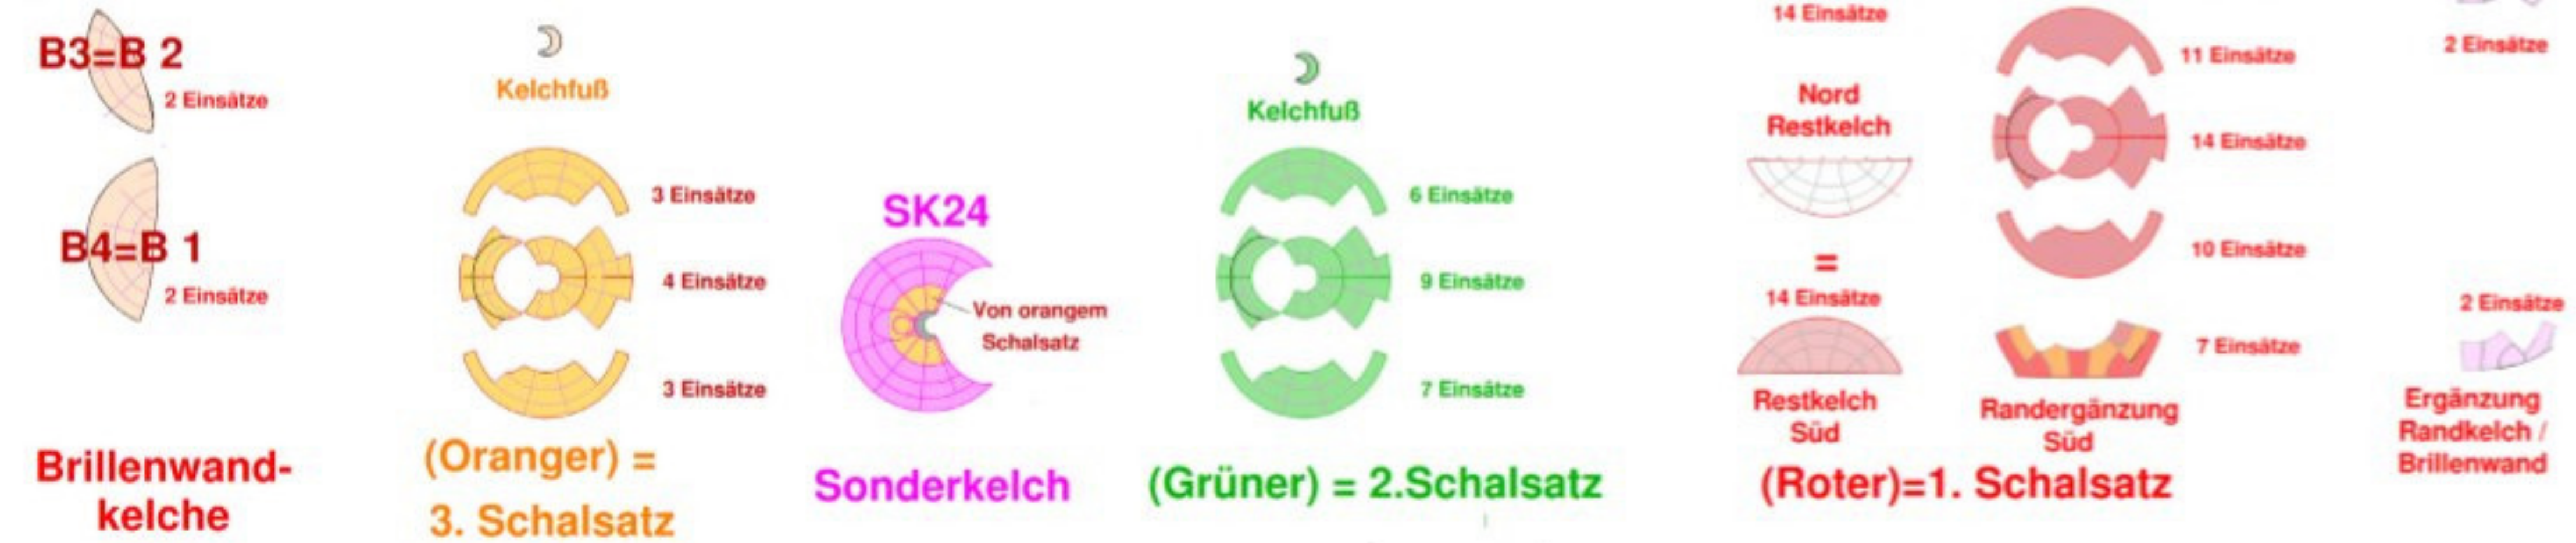

Bonatzbau
