



Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 .... K1-K20 .... R1-R10 .... B1 u. B2

| BA12             |        |                   | BA13   |                   |        | B14 |        |                  | BA15   |                   |         | BA16             |        |                 | BA17   |                 |        | BA18           |        |    |
|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----|--------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|----|
| K9<br>26.10.2019 | D<br>5 | R6<br>15.2.2020   | D<br>6 | K13               | D<br>7 | R8  | D<br>8 | K17              | D<br>9 | R10               | D<br>10 | K1<br>20.10.2018 | D<br>1 | R2<br>8.12.2018 | D<br>2 | K5<br>5.9.2020  | D<br>3 | R4<br>3.3.2021 | D<br>4 | B2 |
| K10<br>9.3.2019  |        | K12<br>30.5.2020  |        | K14<br>14.12.2019 |        | K16 |        | K18<br>27.6.2020 |        | K20<br>18.11.2020 |         | K2<br>16.4.2019  |        | K4<br>1.2.2020  |        | K6<br>27.2.2021 |        | K8<br>2.5.2020 |        |    |
| R5<br>30.10.2020 |        | K11<br>16.12.2020 |        | R7                |        | K15 |        | R9               |        | K19<br>17.04.2021 |         | R1<br>30.6.2018  |        | K3<br>7.9.2019  |        | R3<br>11.7.2020 |        | K7             |        | B1 |

Gesamt: 15 Kelchstützen, 21 Kelchfüße, 6 Restkelche und eine Schwindgasse

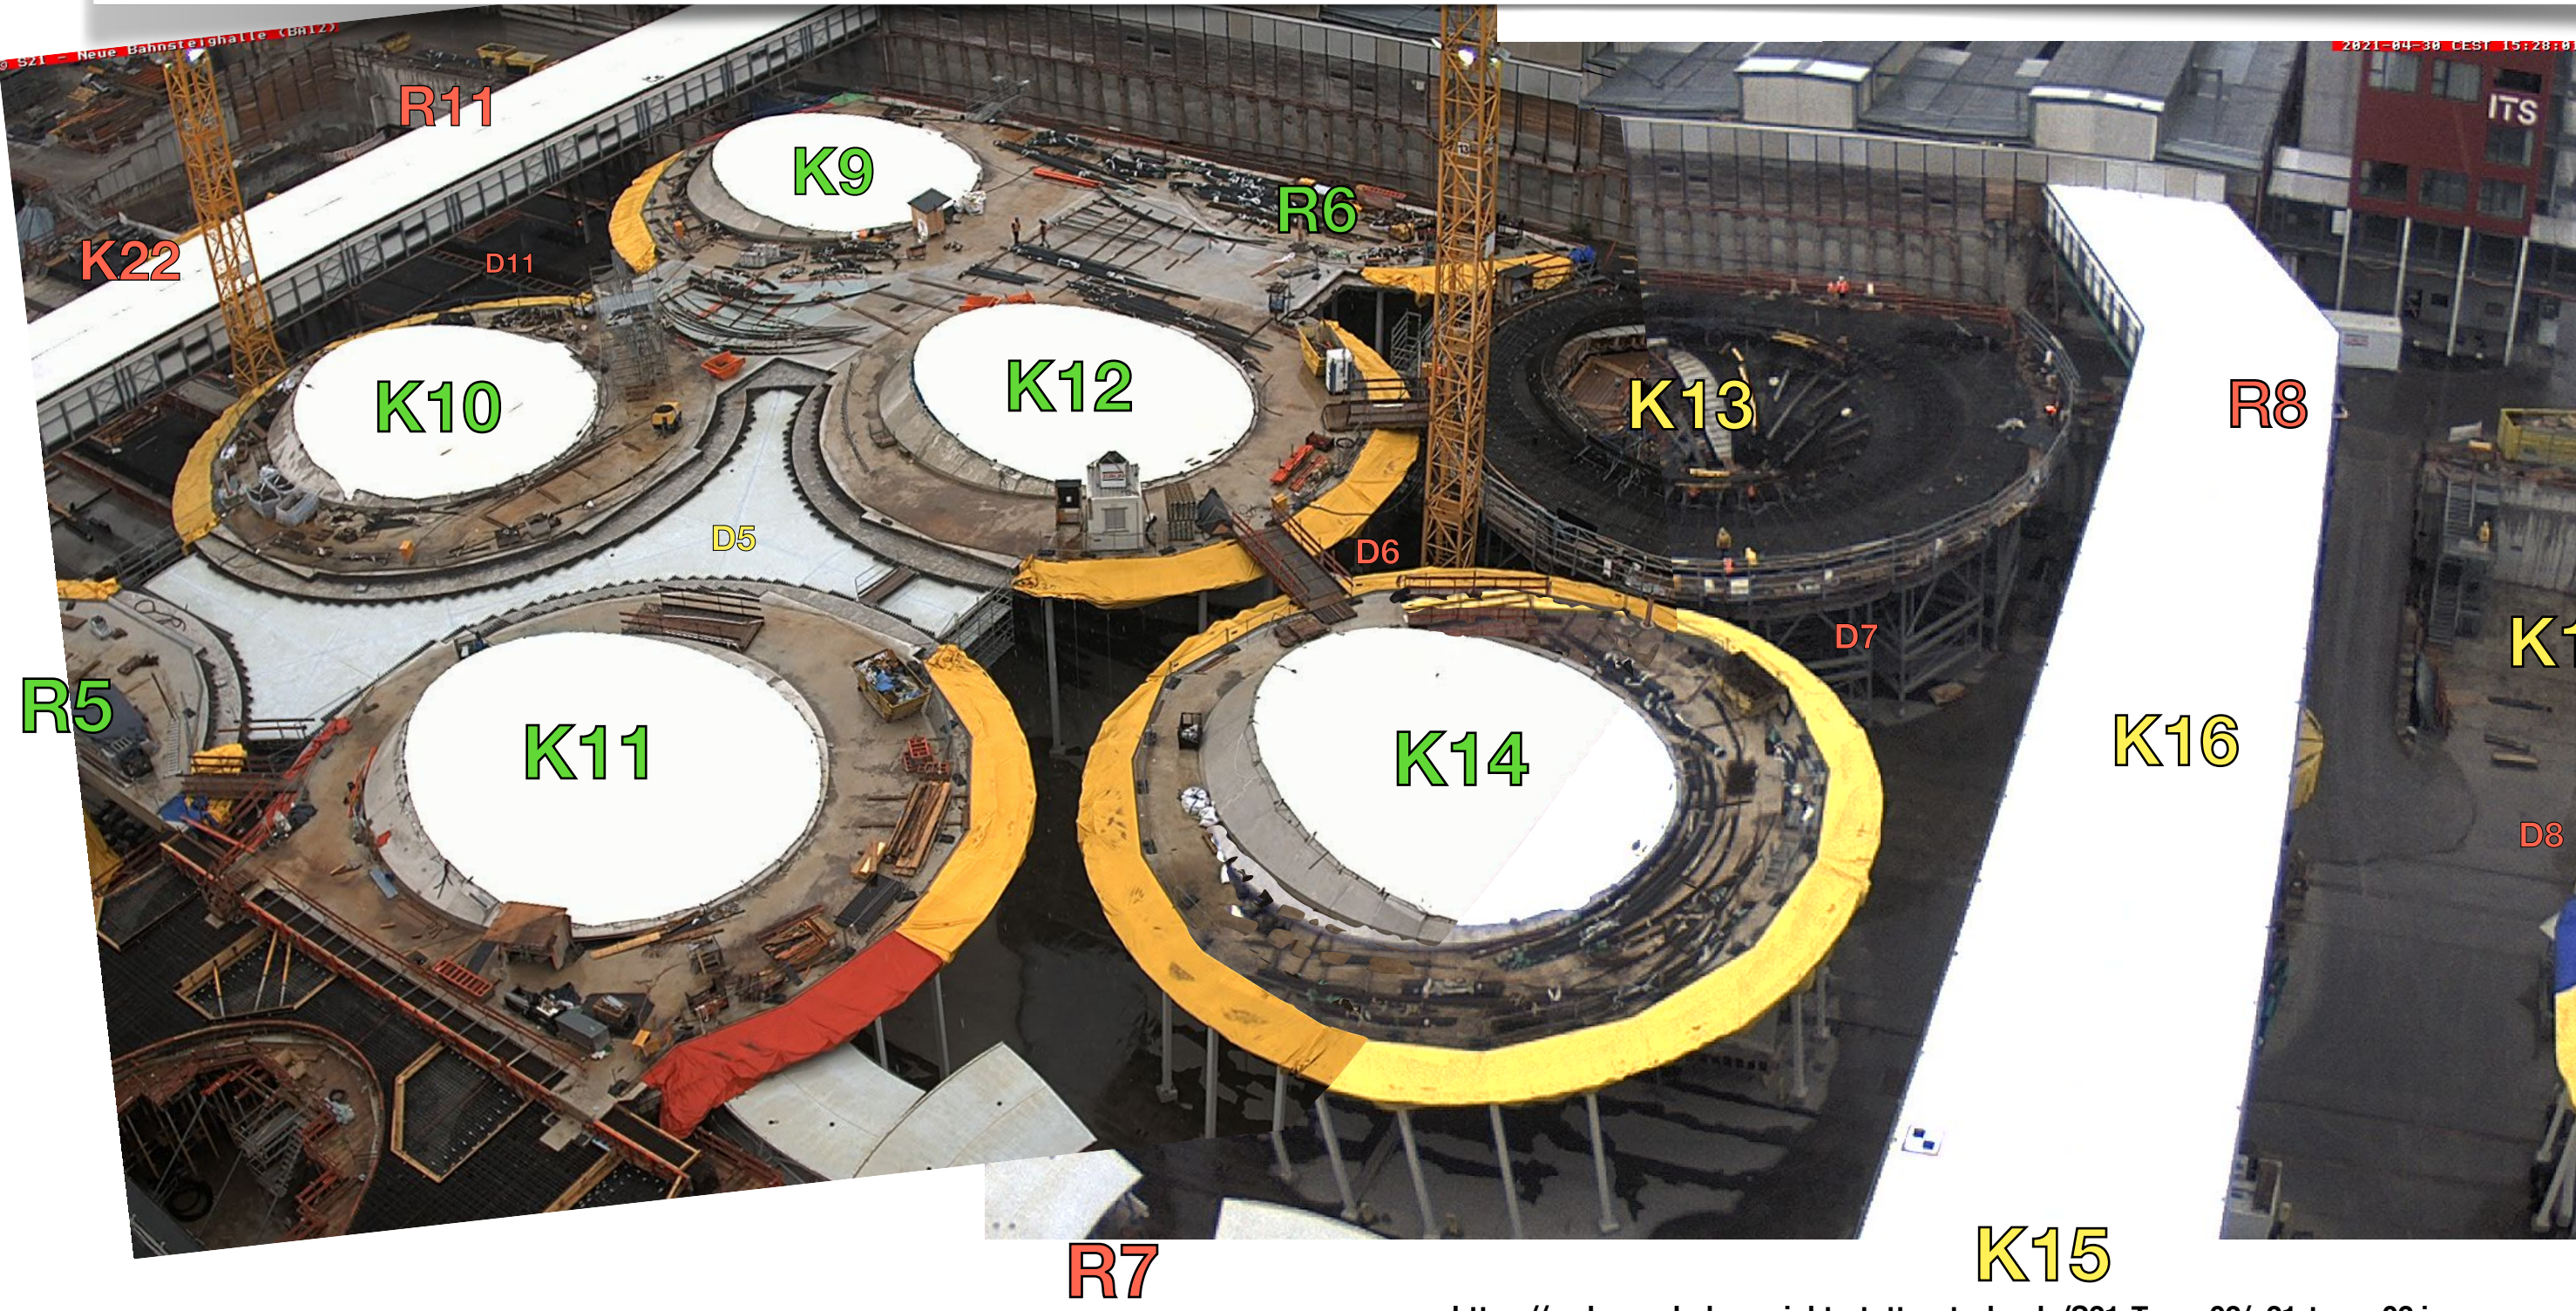

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

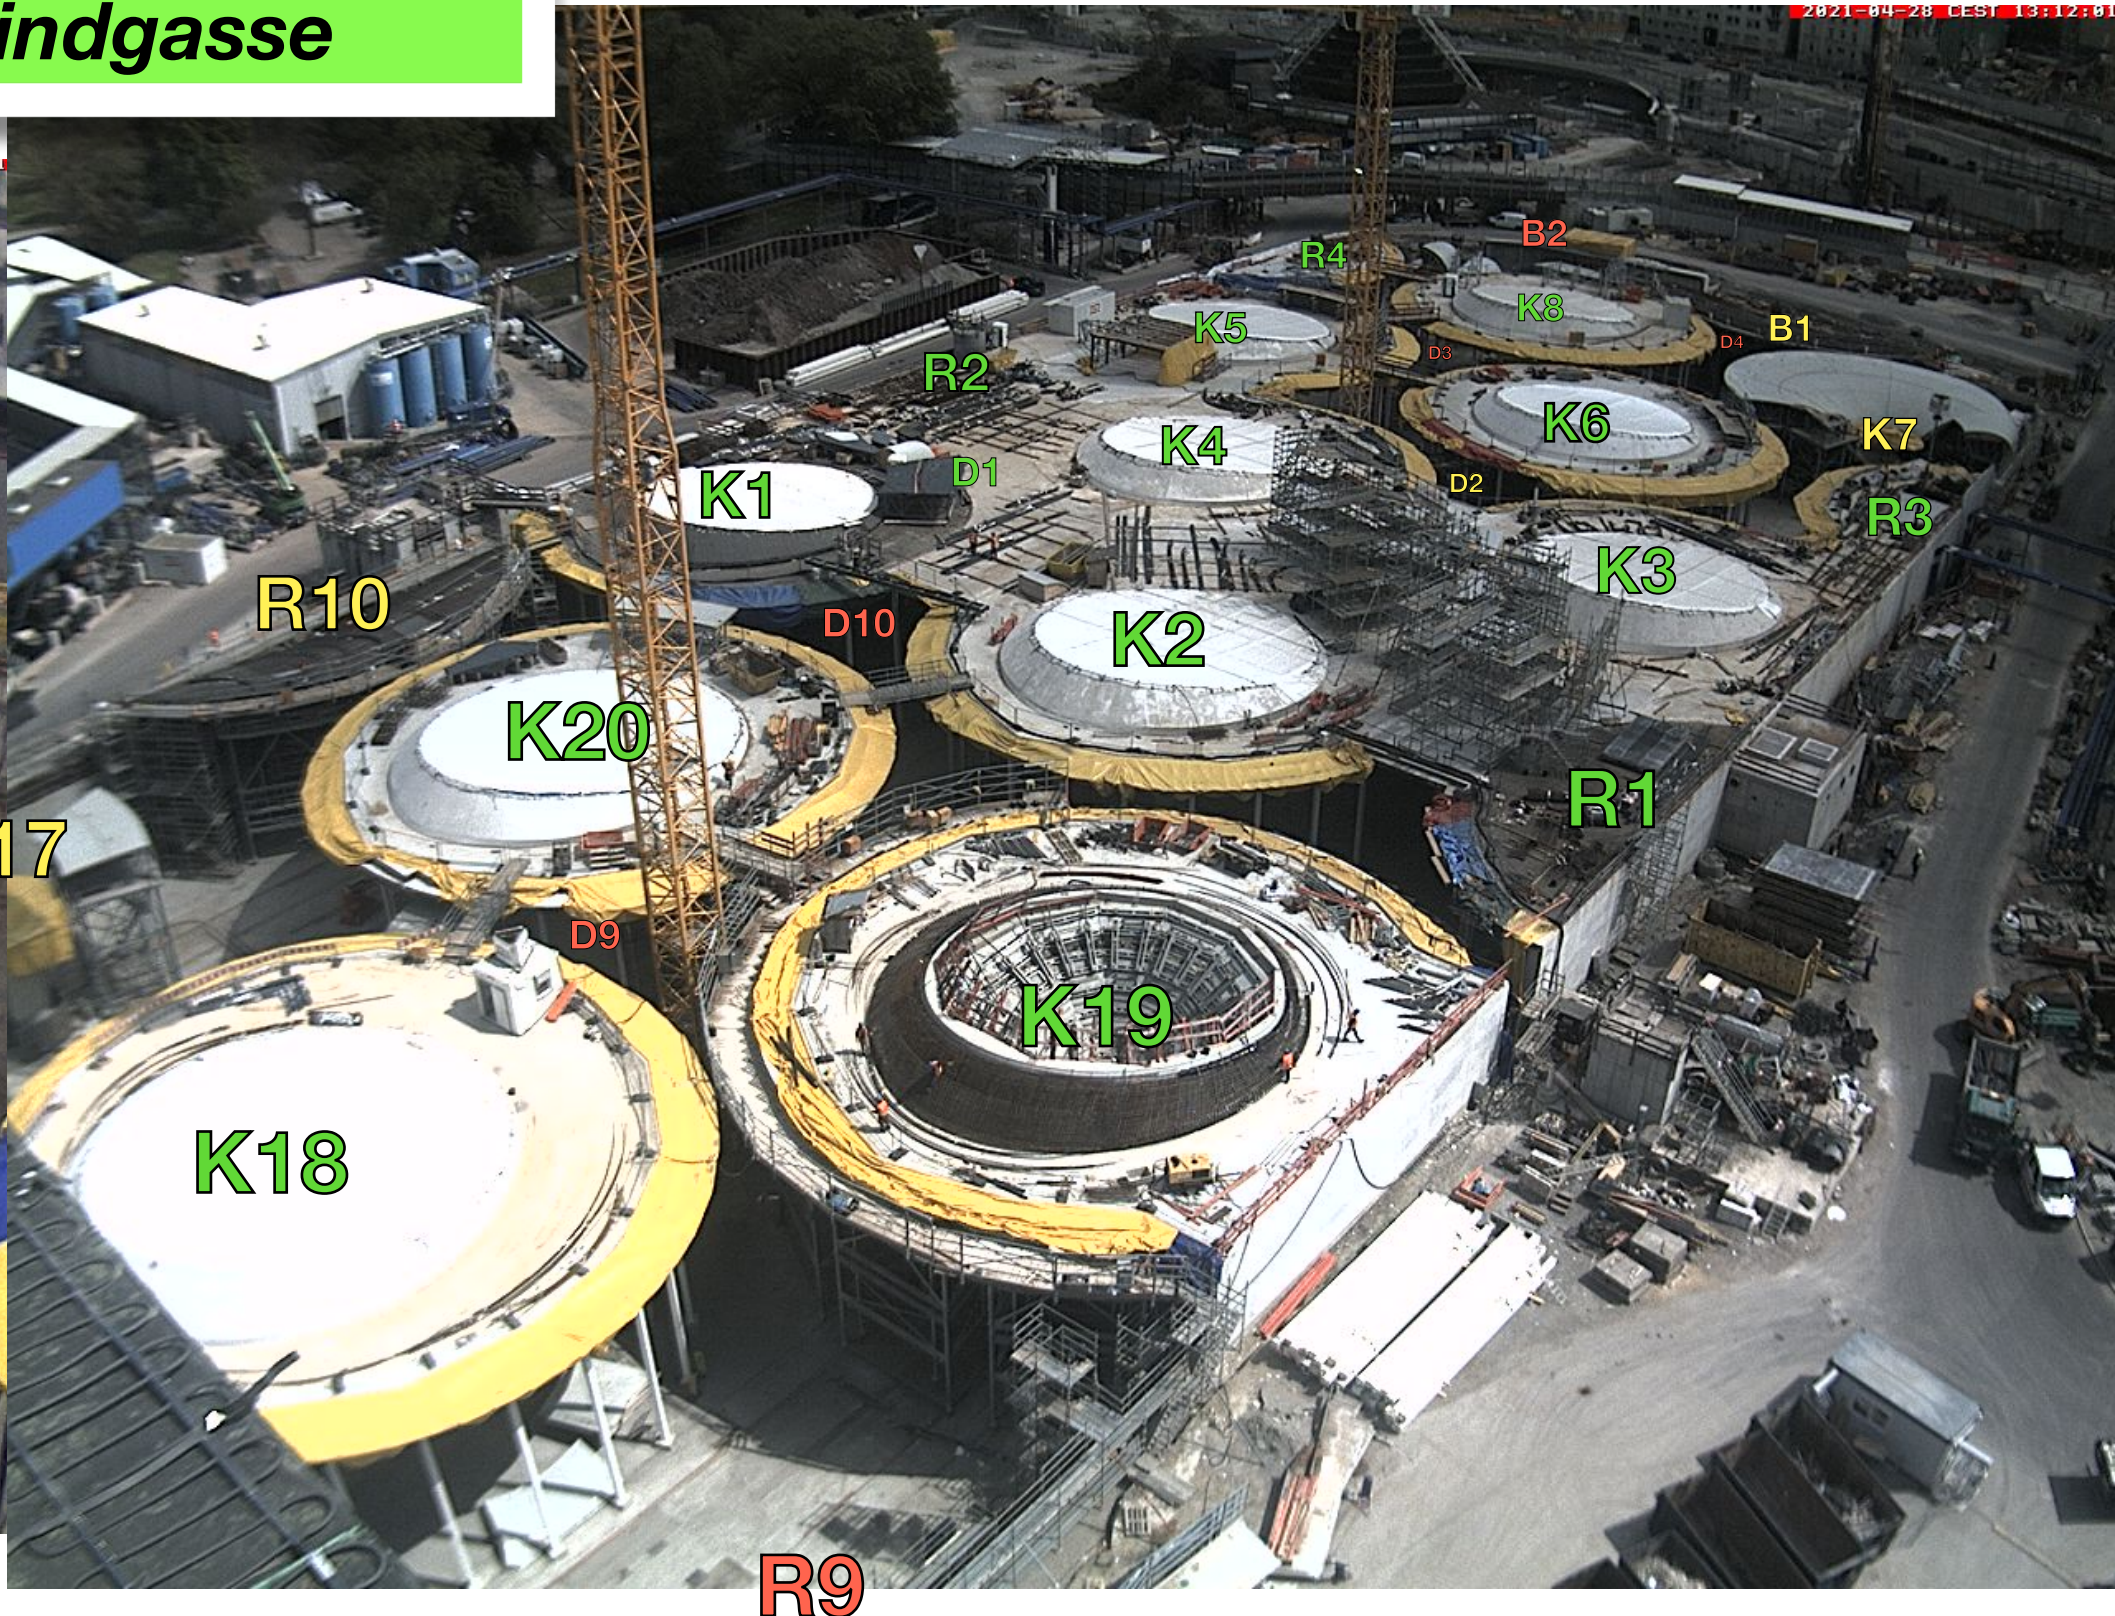

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>




**Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 .... K21-K28 .... R11-R14 .... B3 u. B4**

**Gesamt: 15 Kelchstützen, 21 Kelchfüße, 6 Restkelche und eine Schwindgasse**

# BA11: Spannbetonbrücken

|            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Gleis:     |  | 8 |   | 7 | 6 |   | 5 | 4 |   | 3 | 2 |   | 1 |  |
| Bahnsteig: |  |   | 4 |   |   | 3 |   |   | 2 |   |   | 1 |   |  |

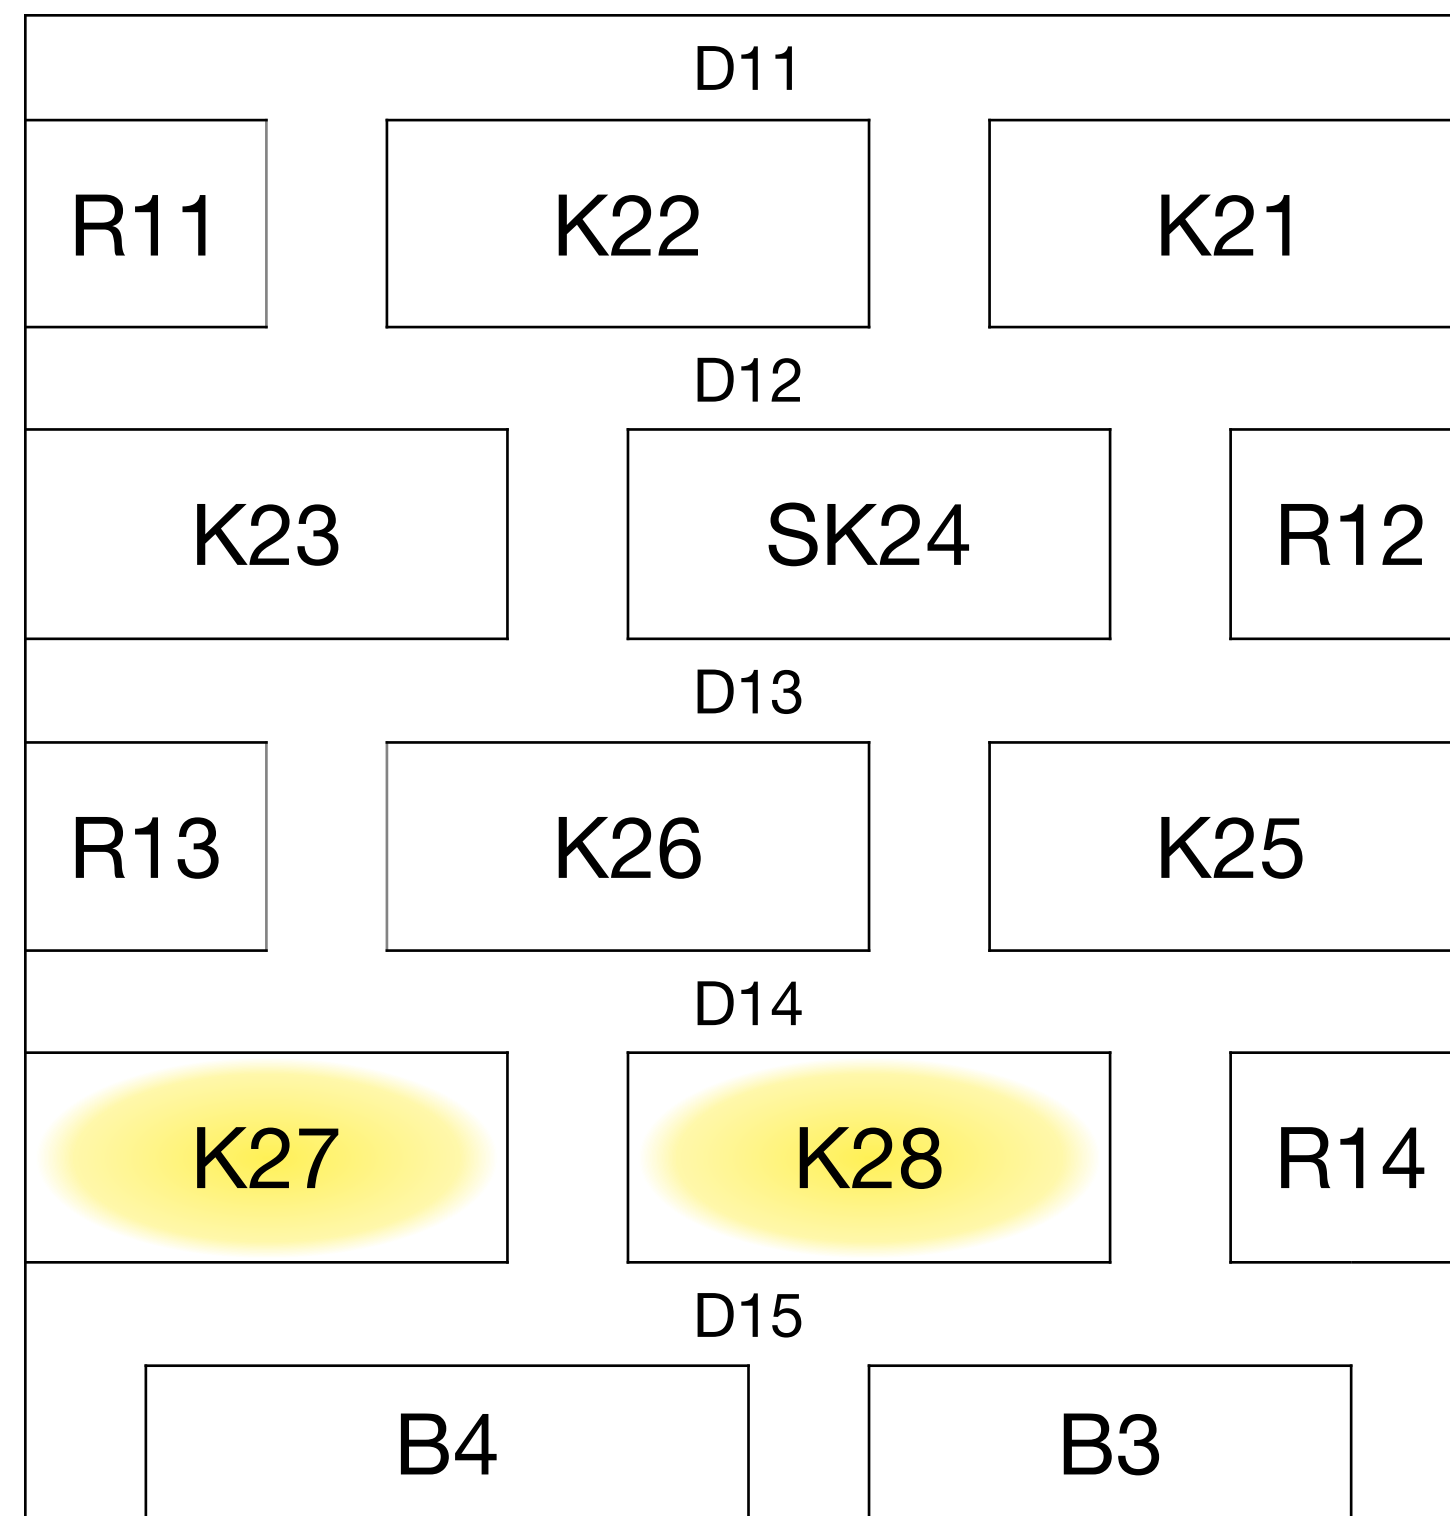

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>

**BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch**

**BA 10 und 11:**  
**Grün: Bahnsteigkante**  
**Blau: Fahrbahnen**

30. April 2021



## Beschriftung durch S21Bau.TV

30. April 2021

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

### ✅ Gebaut:

- ➔ 15 Kelchstützen
- ➔ 6 Restkelche
- ➔ 0 Brillenwandkelche
- ➔ 21 Kelchfüße
- ➔ 9 Galeriestützen
- ➔ 1 Schwindgasse +  $\frac{1}{3}$  D2,  $\frac{1}{2}$  D5
- ➔ 1 Lounge-Deckenplattenabschnitt

### ..muss noch: 🚧 davon im Bau:

- |    |                    |
|----|--------------------|
| 13 | K13 und K7         |
| 8  | R10                |
| 4  | B1                 |
| 7  | K28                |
| 7  | 2, bei K21 und K15 |
| 14 | D5 zweite Hälfte   |
| 8  | 2 bei K11          |



# Betonage der Kelche und Schwindgassen

|    | Kelchblüte |                           | Kelchfuß / Hutze |                  | Restkelch |                  |                                                                                                                                                     | Schwindgasse |                 |
|----|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1  | K1         | 20. Oktober 2018          | ✓ / ✓            | 1                | R1        | 30. Juni 2018    | 1                                                                                                                                                   | D1           | 20. Januar 2021 |
| 2  | K10        | 9. März 2019              | ✓ / ✓ 3.4.2019   | 2                | R2        | 8. Dezember 2018 | 2                                                                                                                                                   | D2           |                 |
| 3  | K2         | 16. April 2019            | ✓ / ✓ 22.5.2019  | 3                | R6        | 15. Februar 2020 | 3                                                                                                                                                   | D5           |                 |
| 4  | K3         | 7. September 2019         | ✓ / ✓            | 4                | R3        | 11. Juli 2020    | 4                                                                                                                                                   | D10          |                 |
| 5  | K9         | 26. Oktober 2019          | ✓ / ✓            | 5                | R5        | 30. Oktober 2020 | 5                                                                                                                                                   |              |                 |
| 6  | K14        | 14. Dezember 2019         | ✓ / ✓            | 6                | R4        | 3. März 2021     | 6                                                                                                                                                   |              |                 |
| 7  | K4         | 1. Februar 2020           | ✓ / ✓            | 7                | R10       |                  | 7                                                                                                                                                   |              |                 |
| 8  | K8         | 2. Mai 2020               | ✓ / ✓ 3.6.2020   | 8                |           |                  | 8                                                                                                                                                   |              |                 |
| 9  | K12        | 30. Mai 2020              | ✓ / ✓            | 9                |           |                  | 9                                                                                                                                                   |              |                 |
| 10 | K18        | 27. Juni 2020             | ✓ / ✓            | 10               |           |                  | 10                                                                                                                                                  |              |                 |
| 11 | K5         | 5. September 2020         | ✓ / ✓ 15.10.2020 | 11               |           |                  | 11                                                                                                                                                  |              |                 |
| 12 | K20        | 18. November 2020         | ✓ / ✓            | 12               |           |                  | 12                                                                                                                                                  |              |                 |
| 13 | K11        | 16. Dezember 2020         | ✓ / ✓ 29.1.2021  | 13               |           |                  | 13                                                                                                                                                  |              |                 |
| 14 | K6         | Bergfest 27. Februar 2021 | ✓ / ✓ 30.3.2021  | 14               |           |                  | 14                                                                                                                                                  |              |                 |
| 15 | K19        | 17. April 2021            | ✓ /              |                  |           |                  | 15                                                                                                                                                  |              |                 |
| 16 | K13        |                           | ✓ /              |                  |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 17 | K7         |                           | ✓ /              |                  |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 18 | K17        |                           | ✓ /              | Brillenwandkelch |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 19 | K27        |                           | ✓ 29.4.2021 /    |                  |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 20 | K28        |                           |                  | 1                | B1        |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 21 | K21        |                           |                  | 2                | B2        |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 22 | K22        |                           |                  | 3                |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 23 | K23        |                           |                  | 4                |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 24 | K24        |                           |                  |                  |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 25 | K25        |                           |                  |                  |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 26 | K26        |                           |                  |                  |           |                  | <div>30. April 2021</div> <div>  <br/>IG BÜRGER         </div> |              |                 |
| 27 | K15        |                           | ✓ /              |                  |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |
| 28 | K16        |                           | ✓ /              |                  |           |                  |                                                                                                                                                     |              |                 |



**Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:**

30. April 2021



|   |        |                                                                                                        |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | BA 1   | Schwallbauwerk Nord wird gebaut.                                                                       |
| ✓ | BA 2   |                                                                                                        |
| ✓ | BA 3   |                                                                                                        |
| ✓ | BA 4-7 | ...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.                                           |
| ✓ | BA 8   | Wiederherstellung der Rampe für den Kehrtunnel Heilbronner Straße und Freilegung der Notausgänge Nord. |

**Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:**

|   |       |                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | BA 9  | Bodenplatte fertig. Eine Seitenwand fehlt noch.                                                                                                                                                     |
|   | BA 10 | Baulogrampe: Bodenplatte auf Seite Bonatzbau wird gebaut.                                                                                                                                           |
|   | BA 11 | liegt über der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig.<br>Die Spannbetonbrücken werden gebaut. Bodenplatte südlicher Teil zur Hälfte fertig. |
|   | BA 12 |                                                                                                                                                                                                     |
|   | BA 13 |                                                                                                                                                                                                     |
|   | BA 14 |                                                                                                                                                                                                     |
|   | BA 15 |                                                                                                                                                                                                     |
| ✓ | BA 16 |                                                                                                                                                                                                     |
|   | BA 17 |                                                                                                                                                                                                     |
|   | BA 18 |                                                                                                                                                                                                     |

**Südkopf: Bauabschnitt 19-25:**

|   |          |                                                                                                         |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | BA 19/20 | Südausgang und Notausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.                                          |
|   | BA 21    |                                                                                                         |
| ✓ | BA 22    | ...liegt unter den Zugangstunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und ist komplett fertig. |
|   | BA 23    | ...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel. Diese werden gerade abgebrochen.           |
| ✓ | BA 24    | Schwallbauwerk Süd wird gebaut.                                                                         |
| ✓ | BA 25    |                                                                                                         |





K5

R4

B2

K8

D4

B1

D3

K6


K7

R3







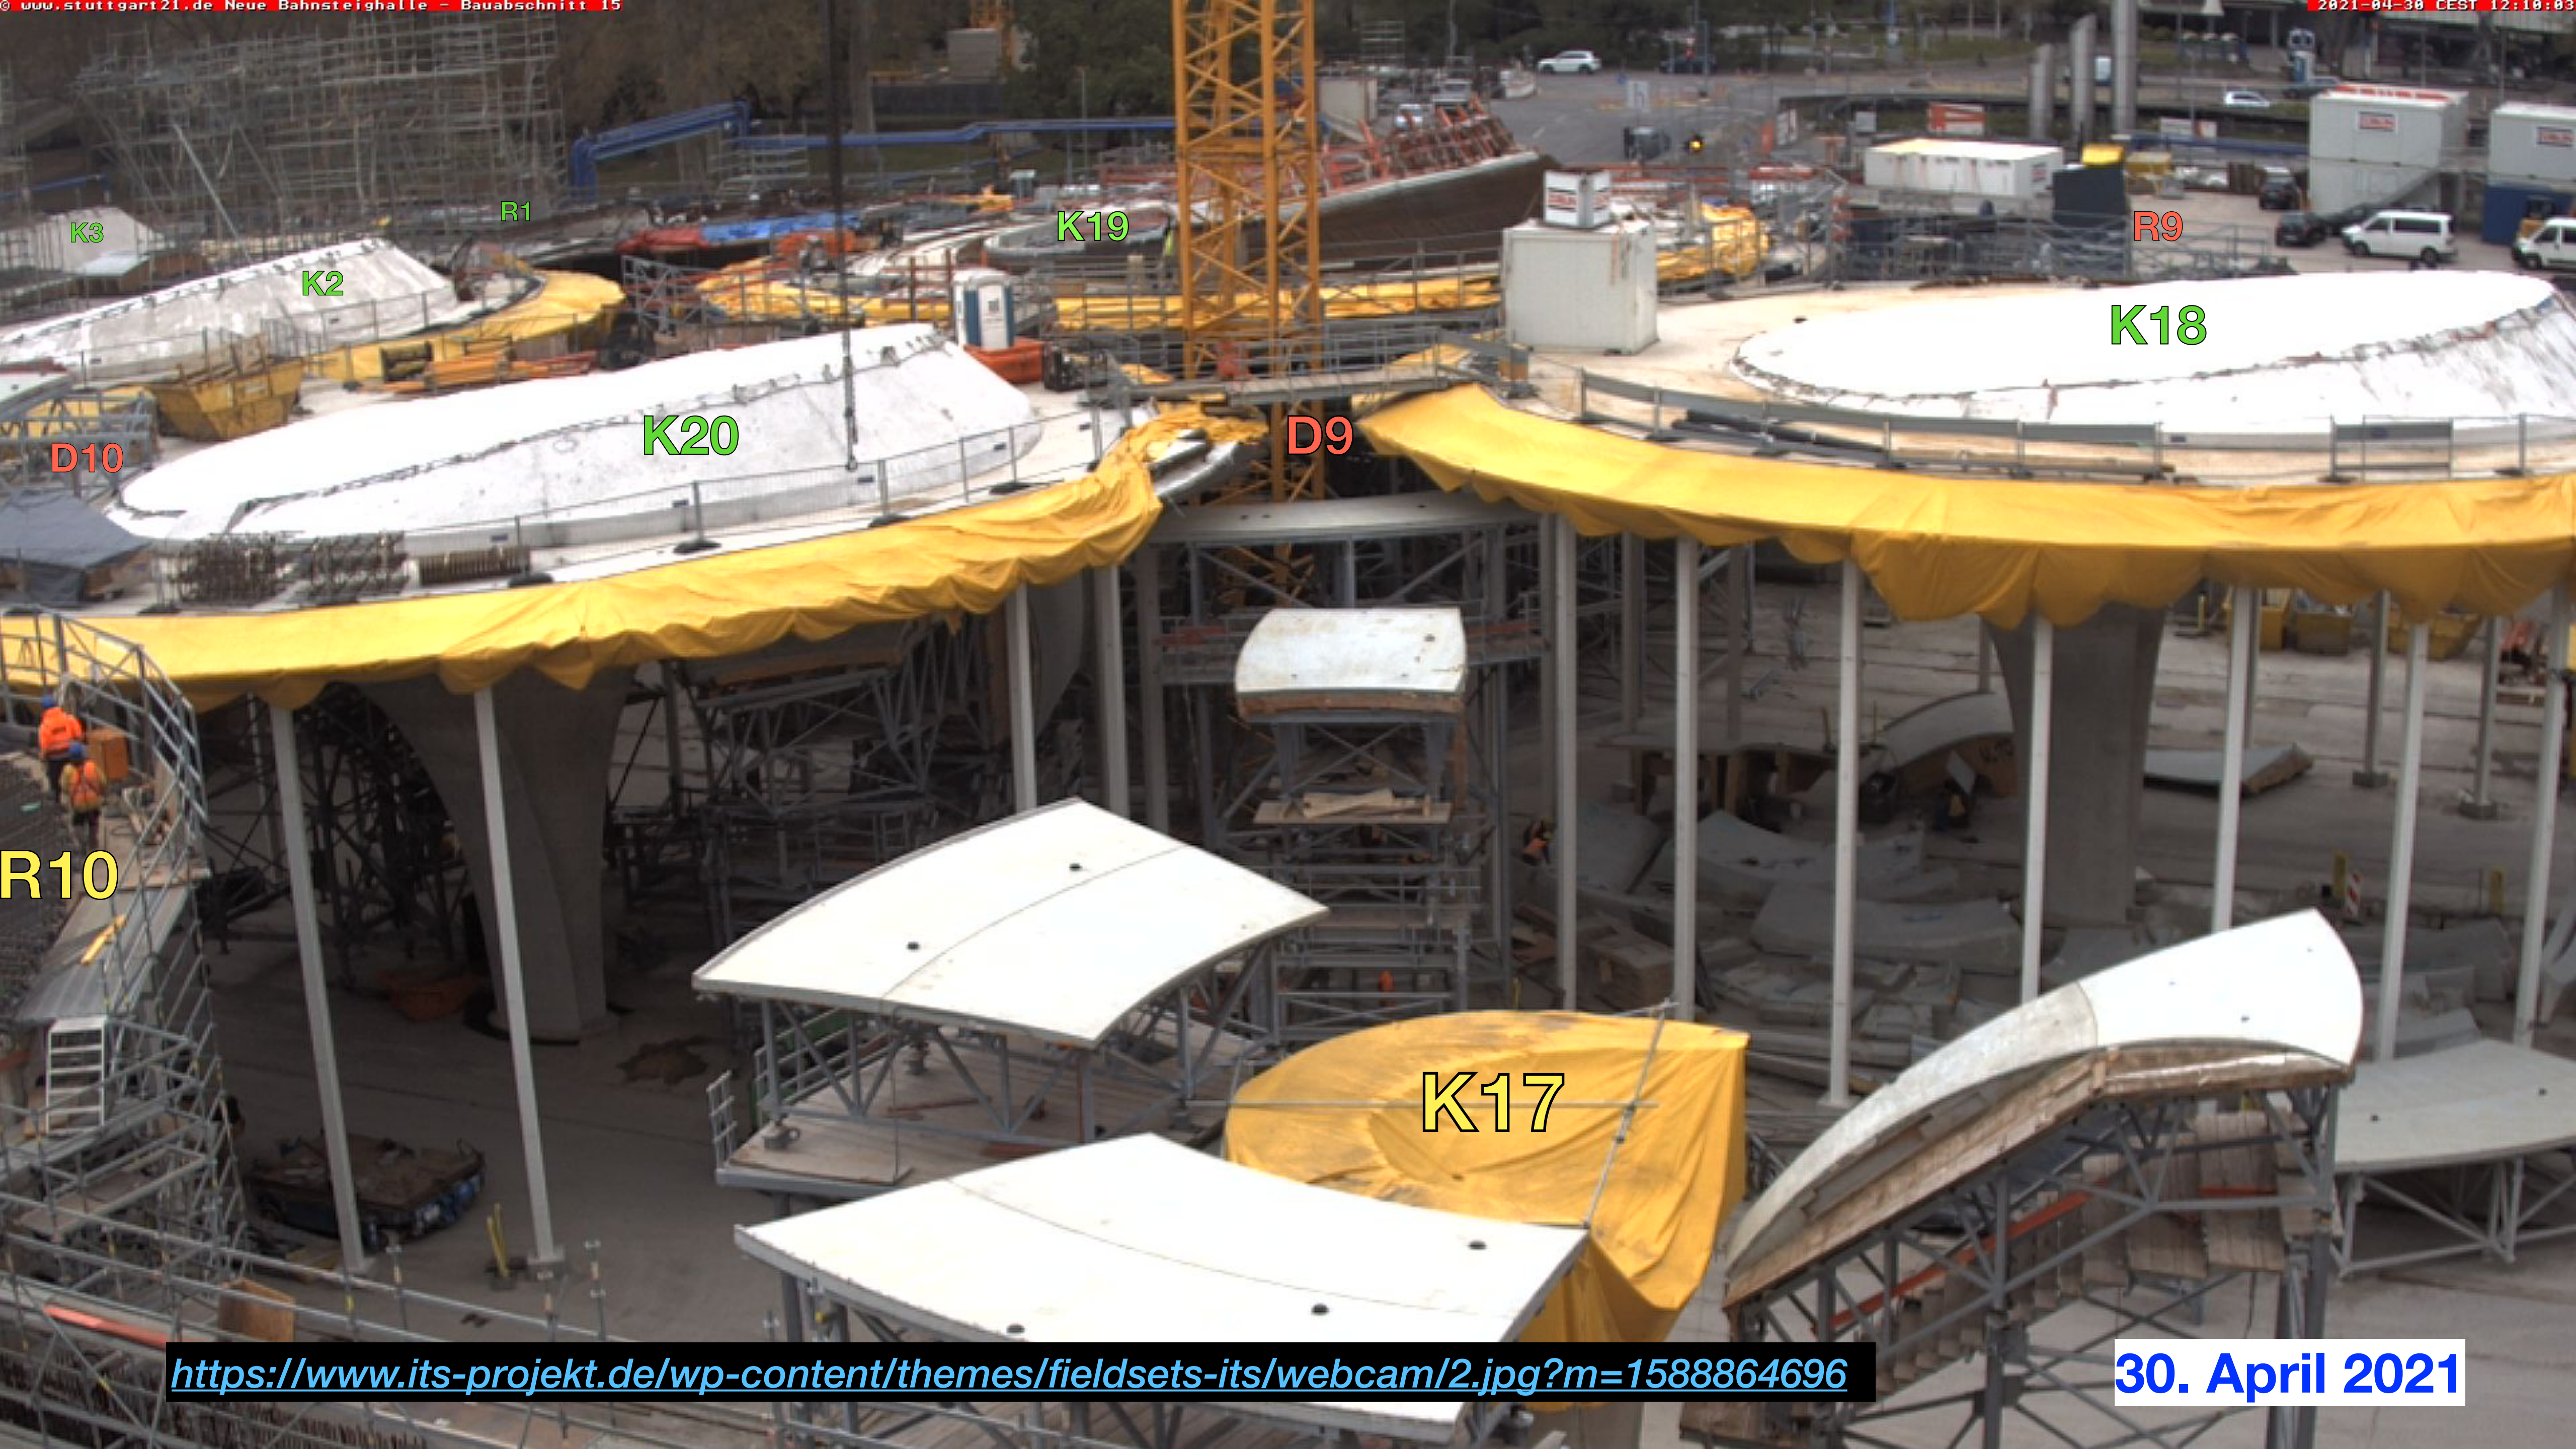

K3

R1

K19

R9

K2

K18

D10


K20

D9

R10

K17



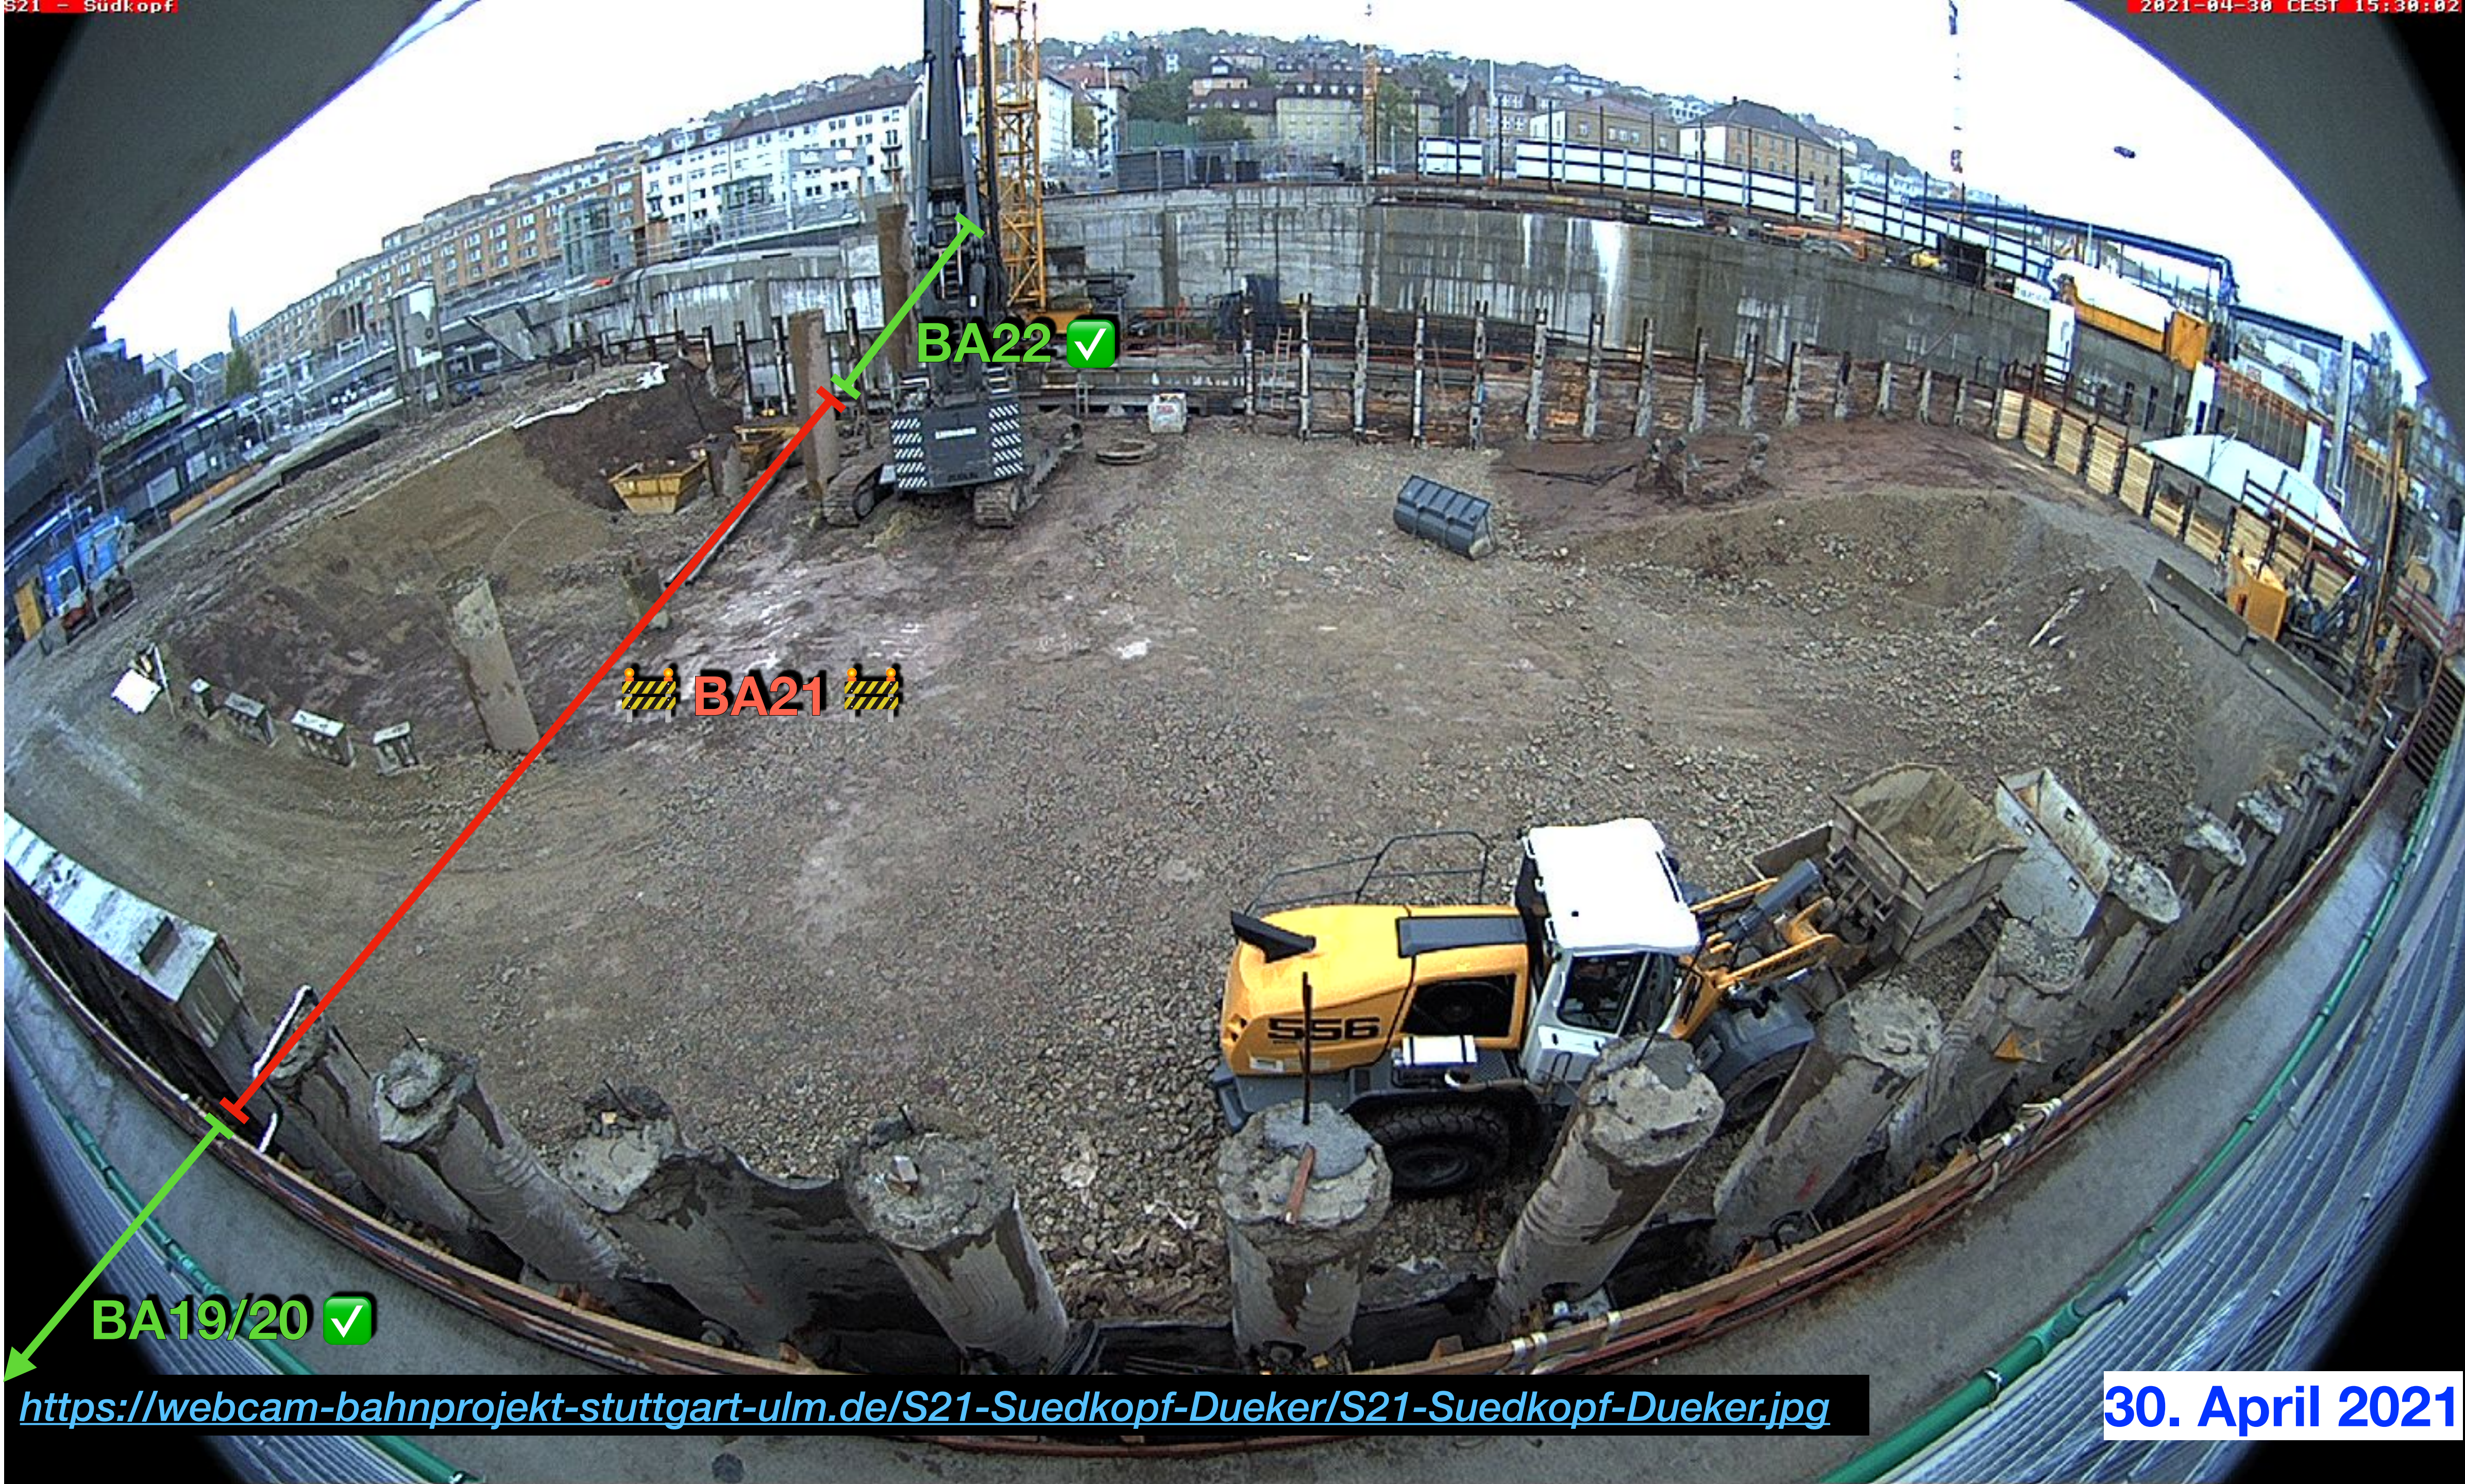

BA22 ✓

⚠ BA21 ⚠

BA19/20 ✓





Kriegsberg

Nordportal

Schwallbauwerk Nord

Jägerstraße (Originalverlauf)

Jägerstraße (verschwenkt)


Verstärkung wegen Stadtbahntunnel

Verstärkung der Deckenplatte im Weichenbereich

**Nordkopf**

**30. April 2021**



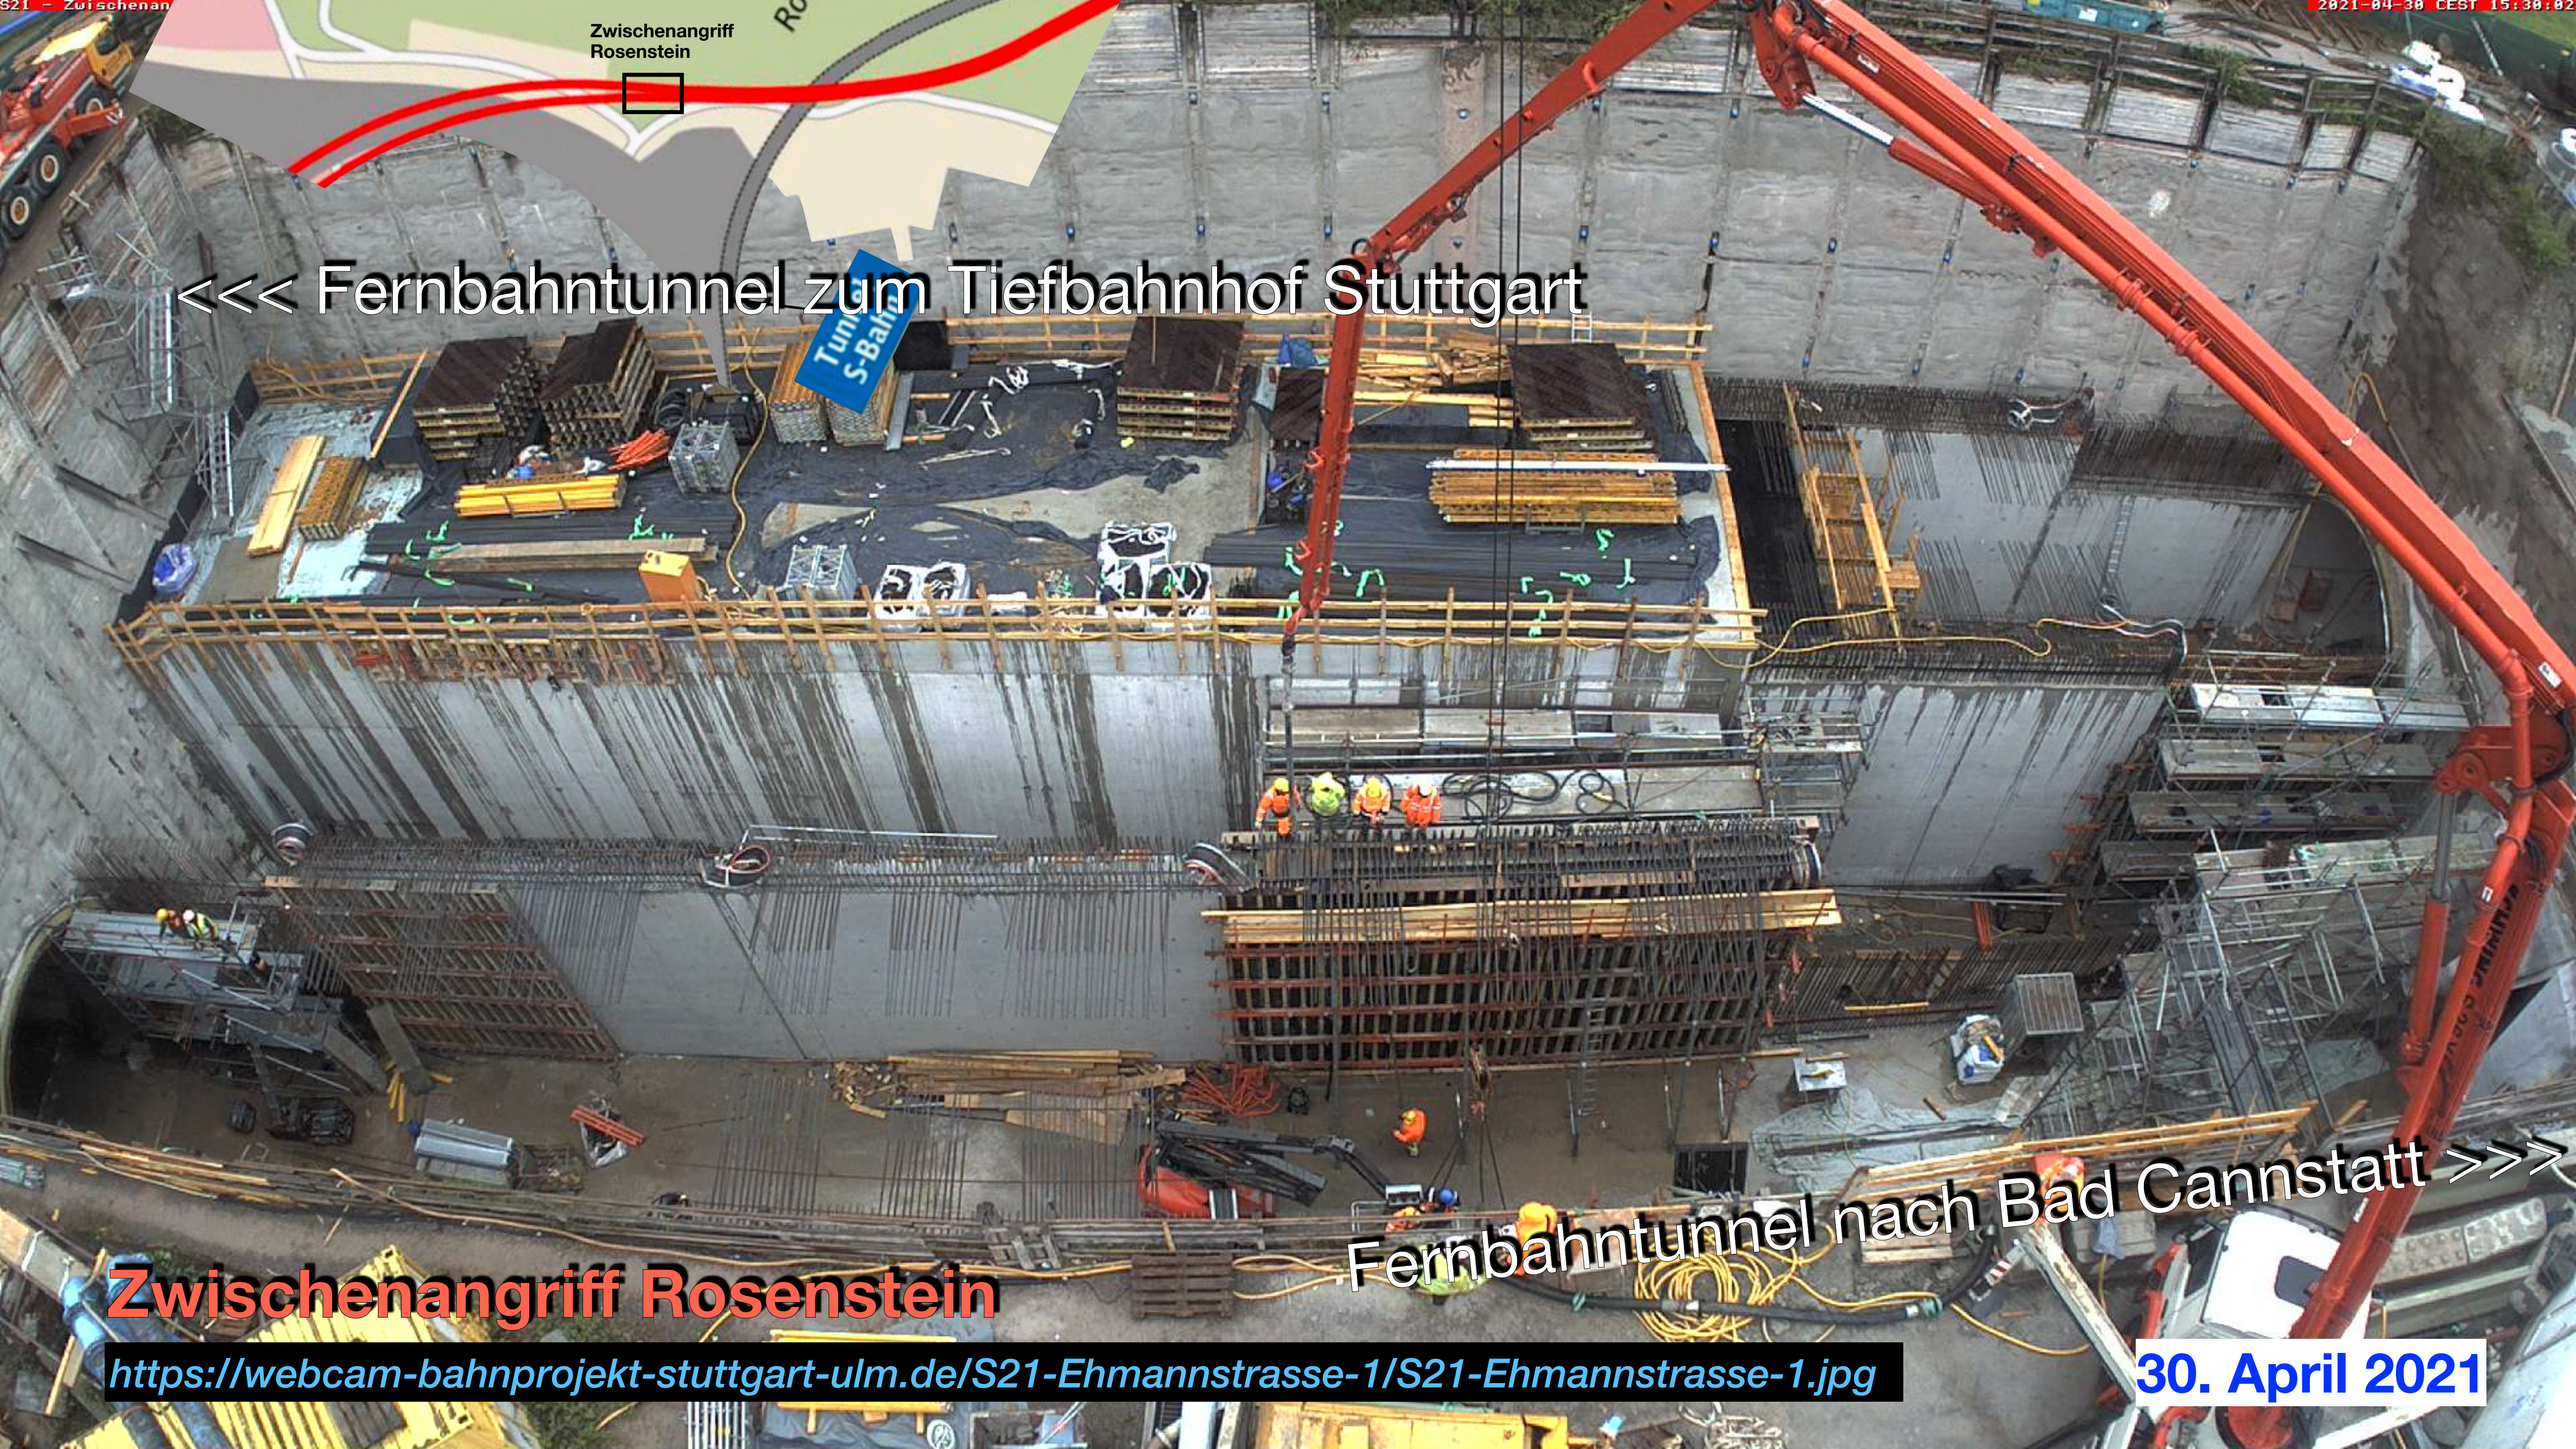

Zwischenangriff  
Rosenstein

<<< Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart

Tunnel  
S-Bahn

Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt >>>

**Zwischenangriff Rosenstein**


<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>

**30. April 2021**







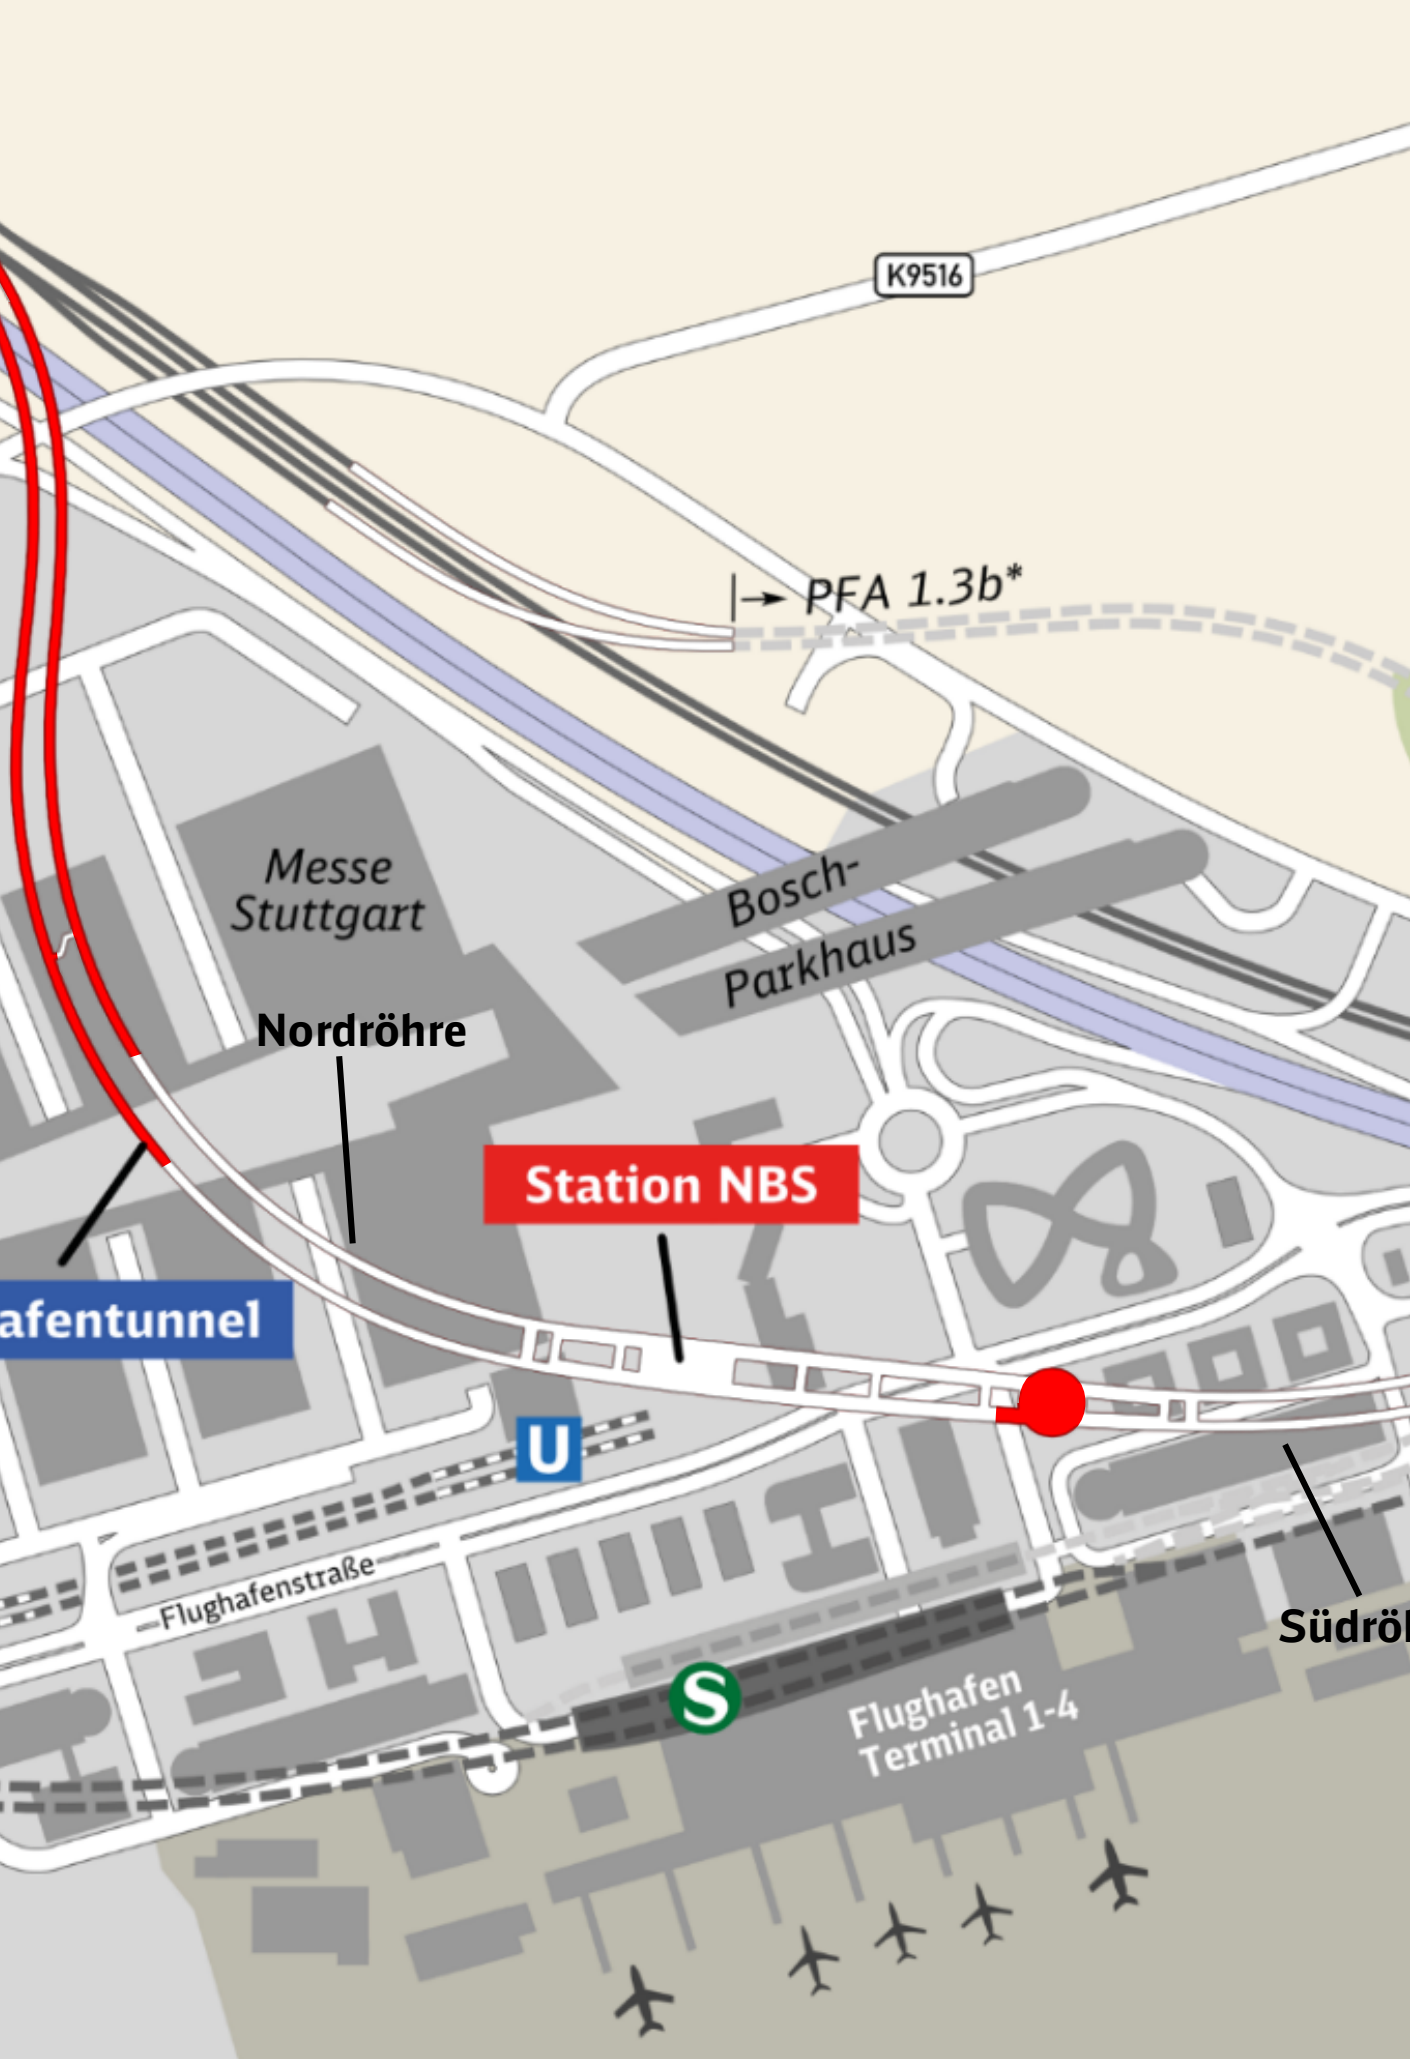


| Vortrieb                   |  | Ist**    | Gesamt** |
|----------------------------|--|----------|----------|
|                            |  | 1.713,02 | 4.394,90 |
|                            |  | 1.713,02 | 4.352,00 |
| Vortriebsstand: 26.04.2021 |  | 796,29   | 2.130,00 |
|                            |  | 916,73   | 2.222,00 |
|                            |  | 0,00     | 42,90    |

30. April 2021



Backup: Original Schalungsfolie

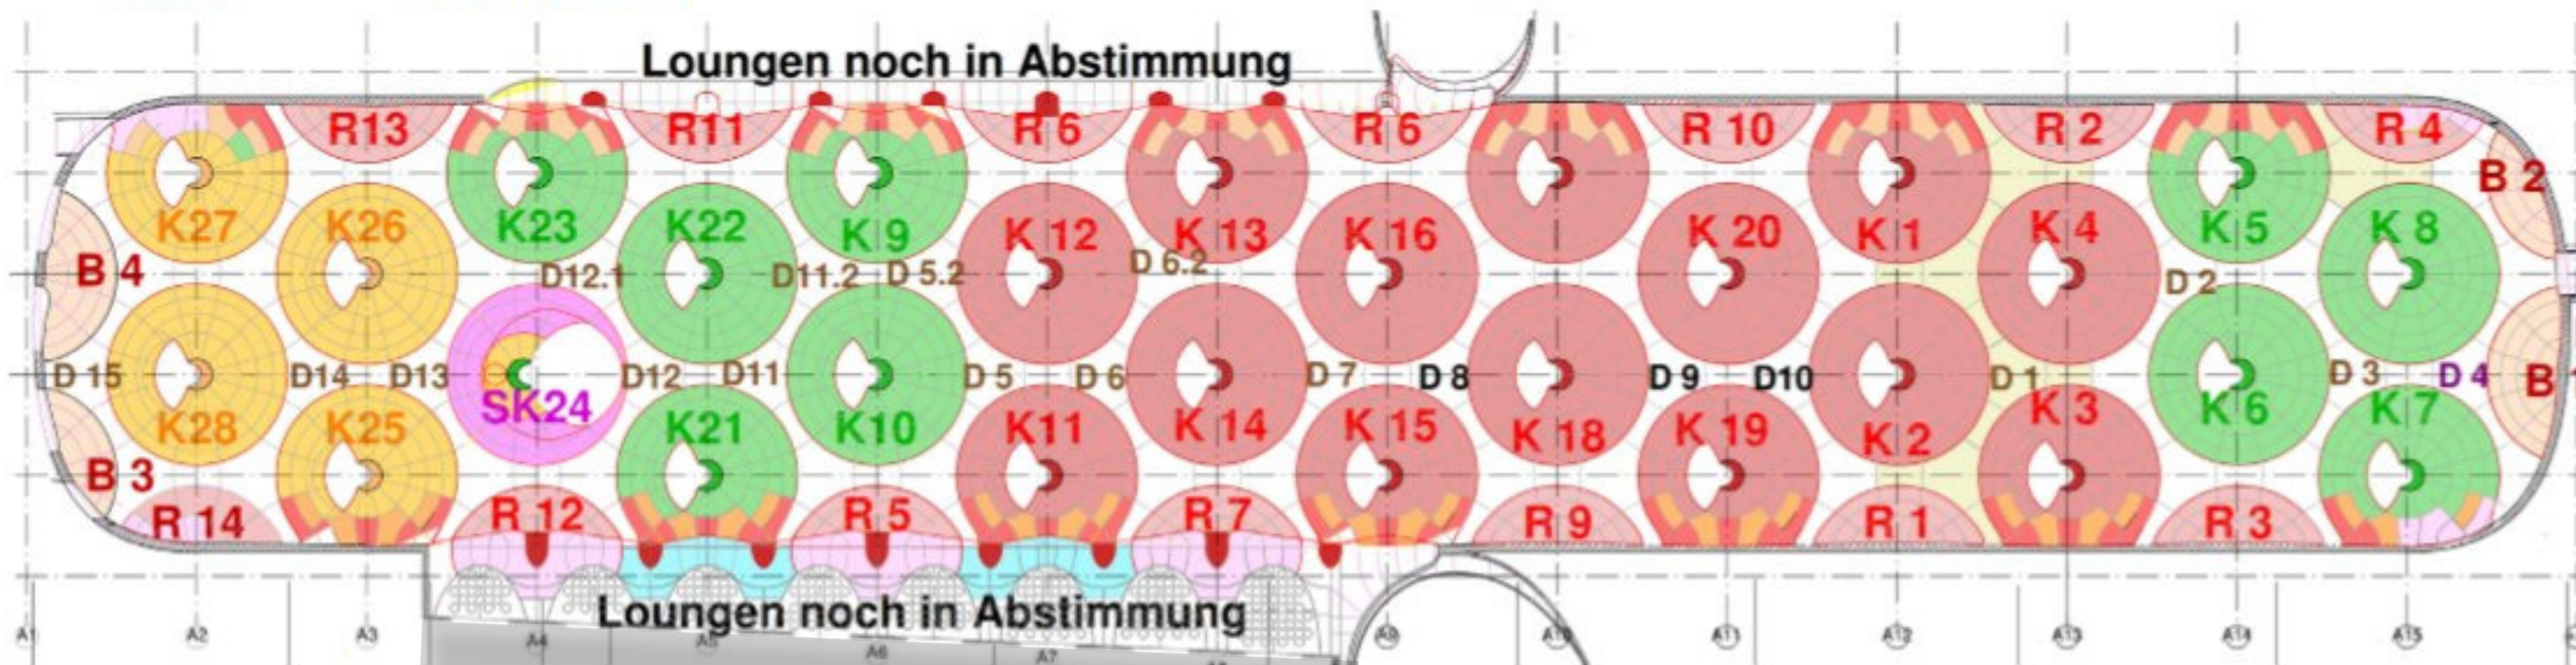

Bonatzbau
