Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 .... K1-K20 .... R1-R10 .... B1 u. B2


BA12			BA13		B14			BA15			BA16			BA17			BA18		
K9 26.10.2019	D 5	R6 15.2.2020		K13 19.6.2021		R8			K17			R10 26.5.2021		K1 20.10.2018		R2 8.12.2018		K5 5.9.2020		R4 3.3.2021		B2
		K12 30.5.2020	Kran		D 7	K16	D 8			D 9		K20 18.11.2020	D 10		D 1	K4 1.2.2020	Kran		D 3	K8 2.5.2020	D 4	
K10 9.3.2019			D 6	K14 14.12.2019					K18 27.6.2020	Kran				K2 16.4.2019			D 2	K6 27.2.2021				B1
		K11 16.12.2020				K15						K19 17.4.2021				K3 7.9.2019				K7		
R5 30.10.2020	D 5 29.6. 2021			R7					R9					R1 30.6.2018	D 1 20.1. 2021			R3 11.7.2020				

Insgesamt fertig: *16 Kelchstützen, 22 Kelchfüße, 7 Restkelche, ein Brillenwandkelch und 2 Schwindgassen*



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg

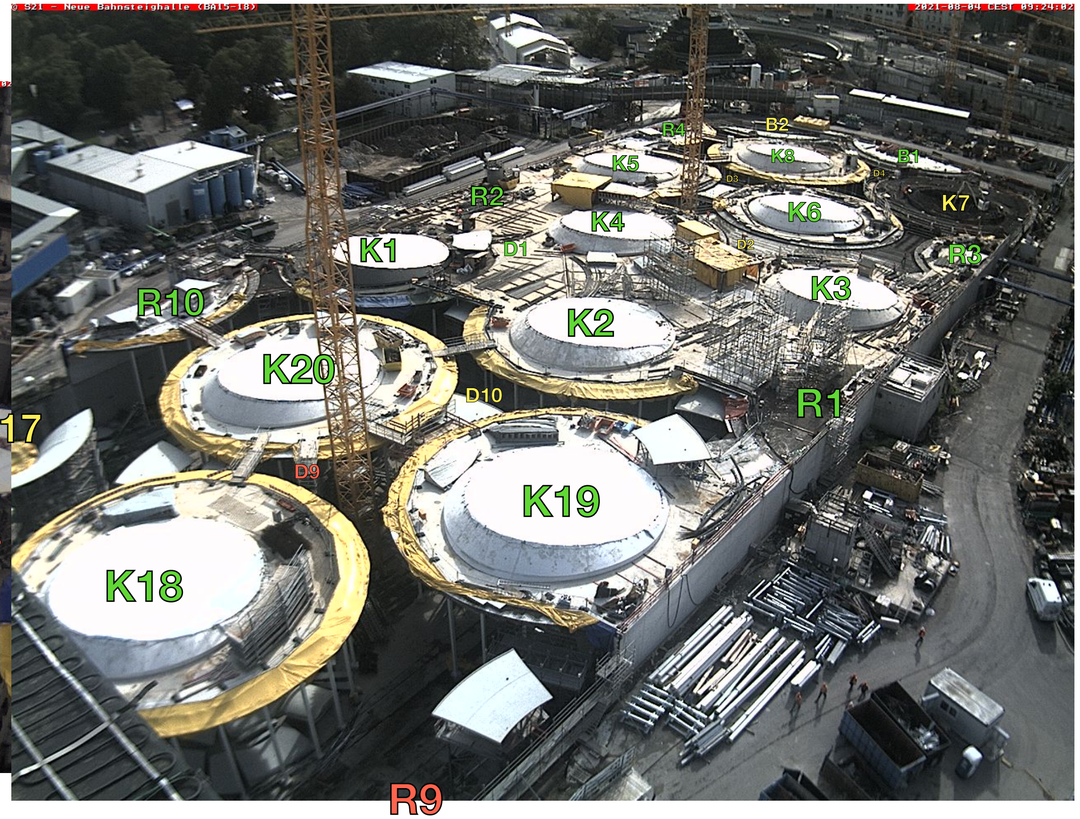


https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg


BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 4. August 2021

IG BÜRGER

Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 .... K21-K28 .... R11-R14 .... B3 u. B4

Insgesamt fertig: *16 Kelchstützen, 22 Kelchfüße, 7 Restkelche, ein Brillenwandkelch und 2 Schwindgassen*

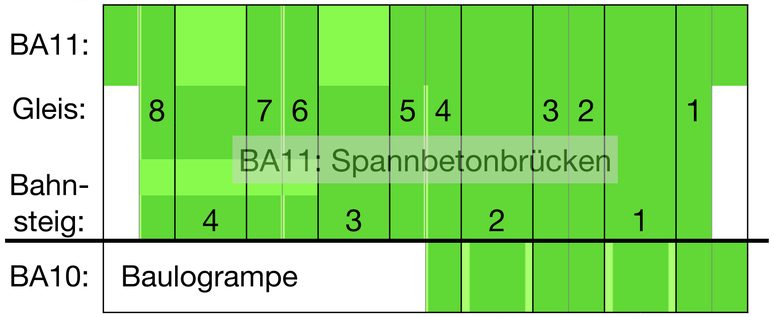

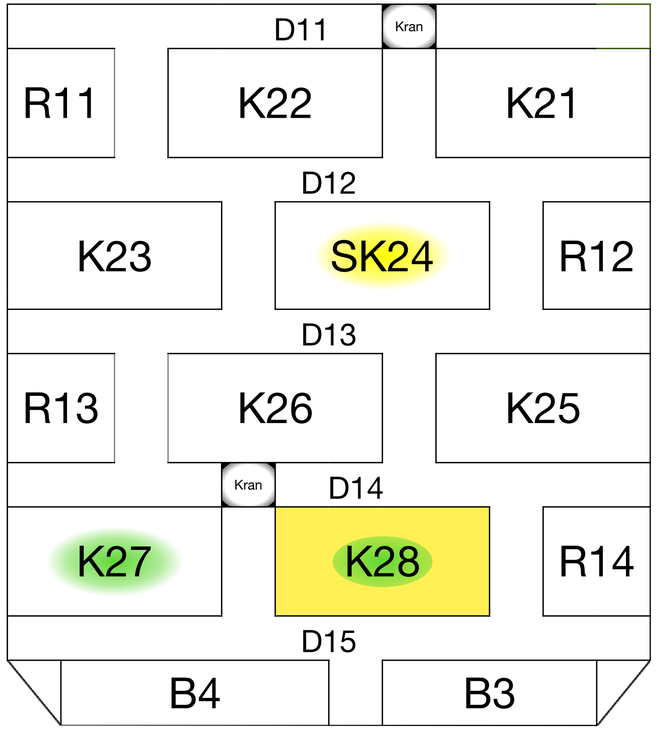



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch

BA 10 und 11:
Grün: Bahnsteigkante
Blau: Fahrbahnen

4. August 2021

IG BÜRGER

Beschriftung durch S21Bau.TV

4. August 2021

😴 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

✅ Gebaut:	...muss noch:	🚧 davon im Bau:
➡ 16 Kelchstützen	12	K7, K17 und K28
➡ 0 Glasgitter auf den Lichtaugen	28	
➡ 7 Restkelche …kleines Bergfest…	7	R7
➡ 1 Brillenwandkelch	3	B2
➡ 22 Kelchfüße	6	SK24
➡ 10 Galeriestützen	6	für K15
➡ 2 Schwindgassen	13	D10, D2, D3 und D4
➡ 3 Lounge-Deckenplattenabschnitte	6	bei R7
➡ 0 Lounge-Oberlichter	8	



Copyright Züblin

Betonage der Kelche und Schwindgassen


	Kelchblüte		Kelchfuß	Hutze		Restkelch		Schwindgasse	
1	K1	20. Oktober 2018	✅ 10.06.2017	✅ 28.11.2018	1	R1	30. Juni 2018	D1	20. Januar 2021
2	K10	9. März 2019	✅ 19.04.2018	✅ 03.04.2019	2	R2	8. Dezember 2018	D2	
3	K2	16. April 2019	✅ 03.08.2017	✅ 22.05.2019	3	R6	15. Februar 2020	D5	29. Juni 2021
4	K3	7. September 2019	✅ 20.12.2017	✅ 02.10.2019	4	R3	11. Juli 2020	D10	
5	K9	26. Oktober 2019	✅ 15.05.2018	✅ 20.11.2019	5	R5	30. Oktober 2020	D4	
6	K14	14. Dezember 2019	✅ 12.11.2018	✅ 03.02.2020	6	R4	3. März 2021	D3	
7	K4	1. Februar 2020	✅ 10.10.2017	✅ 07.03.2020	7	R10	26. Mai 2021		
8	K8	2. Mai 2020	✅ 16.12.2019	✅ 03.06.2020	8	R7			
9	K12	30. Mai 2020	✅ 05.11.2019	✅ 08.07.2020	9				
10	K18	27. Juni 2020	✅ 13.02.2020	✅ 11.08.2020	10				
11	K5	5. September 2020	✅ 01.03.2019	✅ 15.10.2020	11				
12	K20	18. November 2020	✅ 09.07.2020	✅ 05.12.2020	12				
13	K11	16. Dezember 2020	✅ 03.06.2020	✅ 29.01.2021	13				
14	K6	Bergfest 27. Februar 2021	✅ 12.04.2019	✅ 30.03.2021	14	R8			
15	K19	17. April 2021	✅ 27.08.2020	✅ 12.05.2021					
16	K13	19. Juni 2021	✅ 15.12.2018	✅ 16.07.2021					
17	K7		✅ 05.12.2020						
18	K17		✅ 17.05.2020			**Brillenwandkelch**			
19	K28		✅ 08.06.2021						
20	K27		✅ 29.04.2021		1	B1	29. Juli 2021		
21	K21				2	B2			
22	K22				3				
23	K23				4				
24	K24								
25	K25								
26	K26								
27	K15		✅ 09.05.2019						
28	K16		✅ 05.06.2019						

Das Datum kann einige Tage versetzt sein.

4. August 2021

IG BÜRGER

Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:		4. August 2021 IG BÜRGER
✅	BA 1	Rohbau Schwallbauwerk Nord ✅
✅	BA 2	
✅	BA 3	
✅	BA 4-7	…sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.
✅	BA 8	Wiederherstellung der Rampe für den Kehrtunnel Heilbronner Straße und Freilegung der Notausgänge Nord.
Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:		
	BA 9	Letzter Abschnitt der Seitenwand wird gebaut.
	BA 10	Baulogrampe: Bodenplatte und Seitenwand auf Seite Bonatzbau ist gebaut.
	BA 11	liegt über der S-Bahn und wird mit Spannbetonbrücken überspannt. Bahnsteige 2 und 3 sind komplett. Bei den anderen zwei muss noch die Aussparung betoniert werden. Bodenplatte südlicher Teil ist in Beton gegossen und Bahnsteige 1 und 2 sind fertig.
✅	BA 12	
	BA 13	
	BA 14	
	BA 15	
✅	BA 16	
	BA 17	
	BA 18	
Südkopf: Bauabschnitt 19-25:		
✅	BA 19/20	Südausgang und Notausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.
	BA 21	🚧
✅	BA 22	…liegt unter den Zugangstunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und ist komplett fertig.
	BA 23	…ist die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zugangstunneln. Diese werden gerade abgebrochen. 🚧
✅	BA 24	Schwallbauwerk Süd wird gebaut.
✅	BA 25	

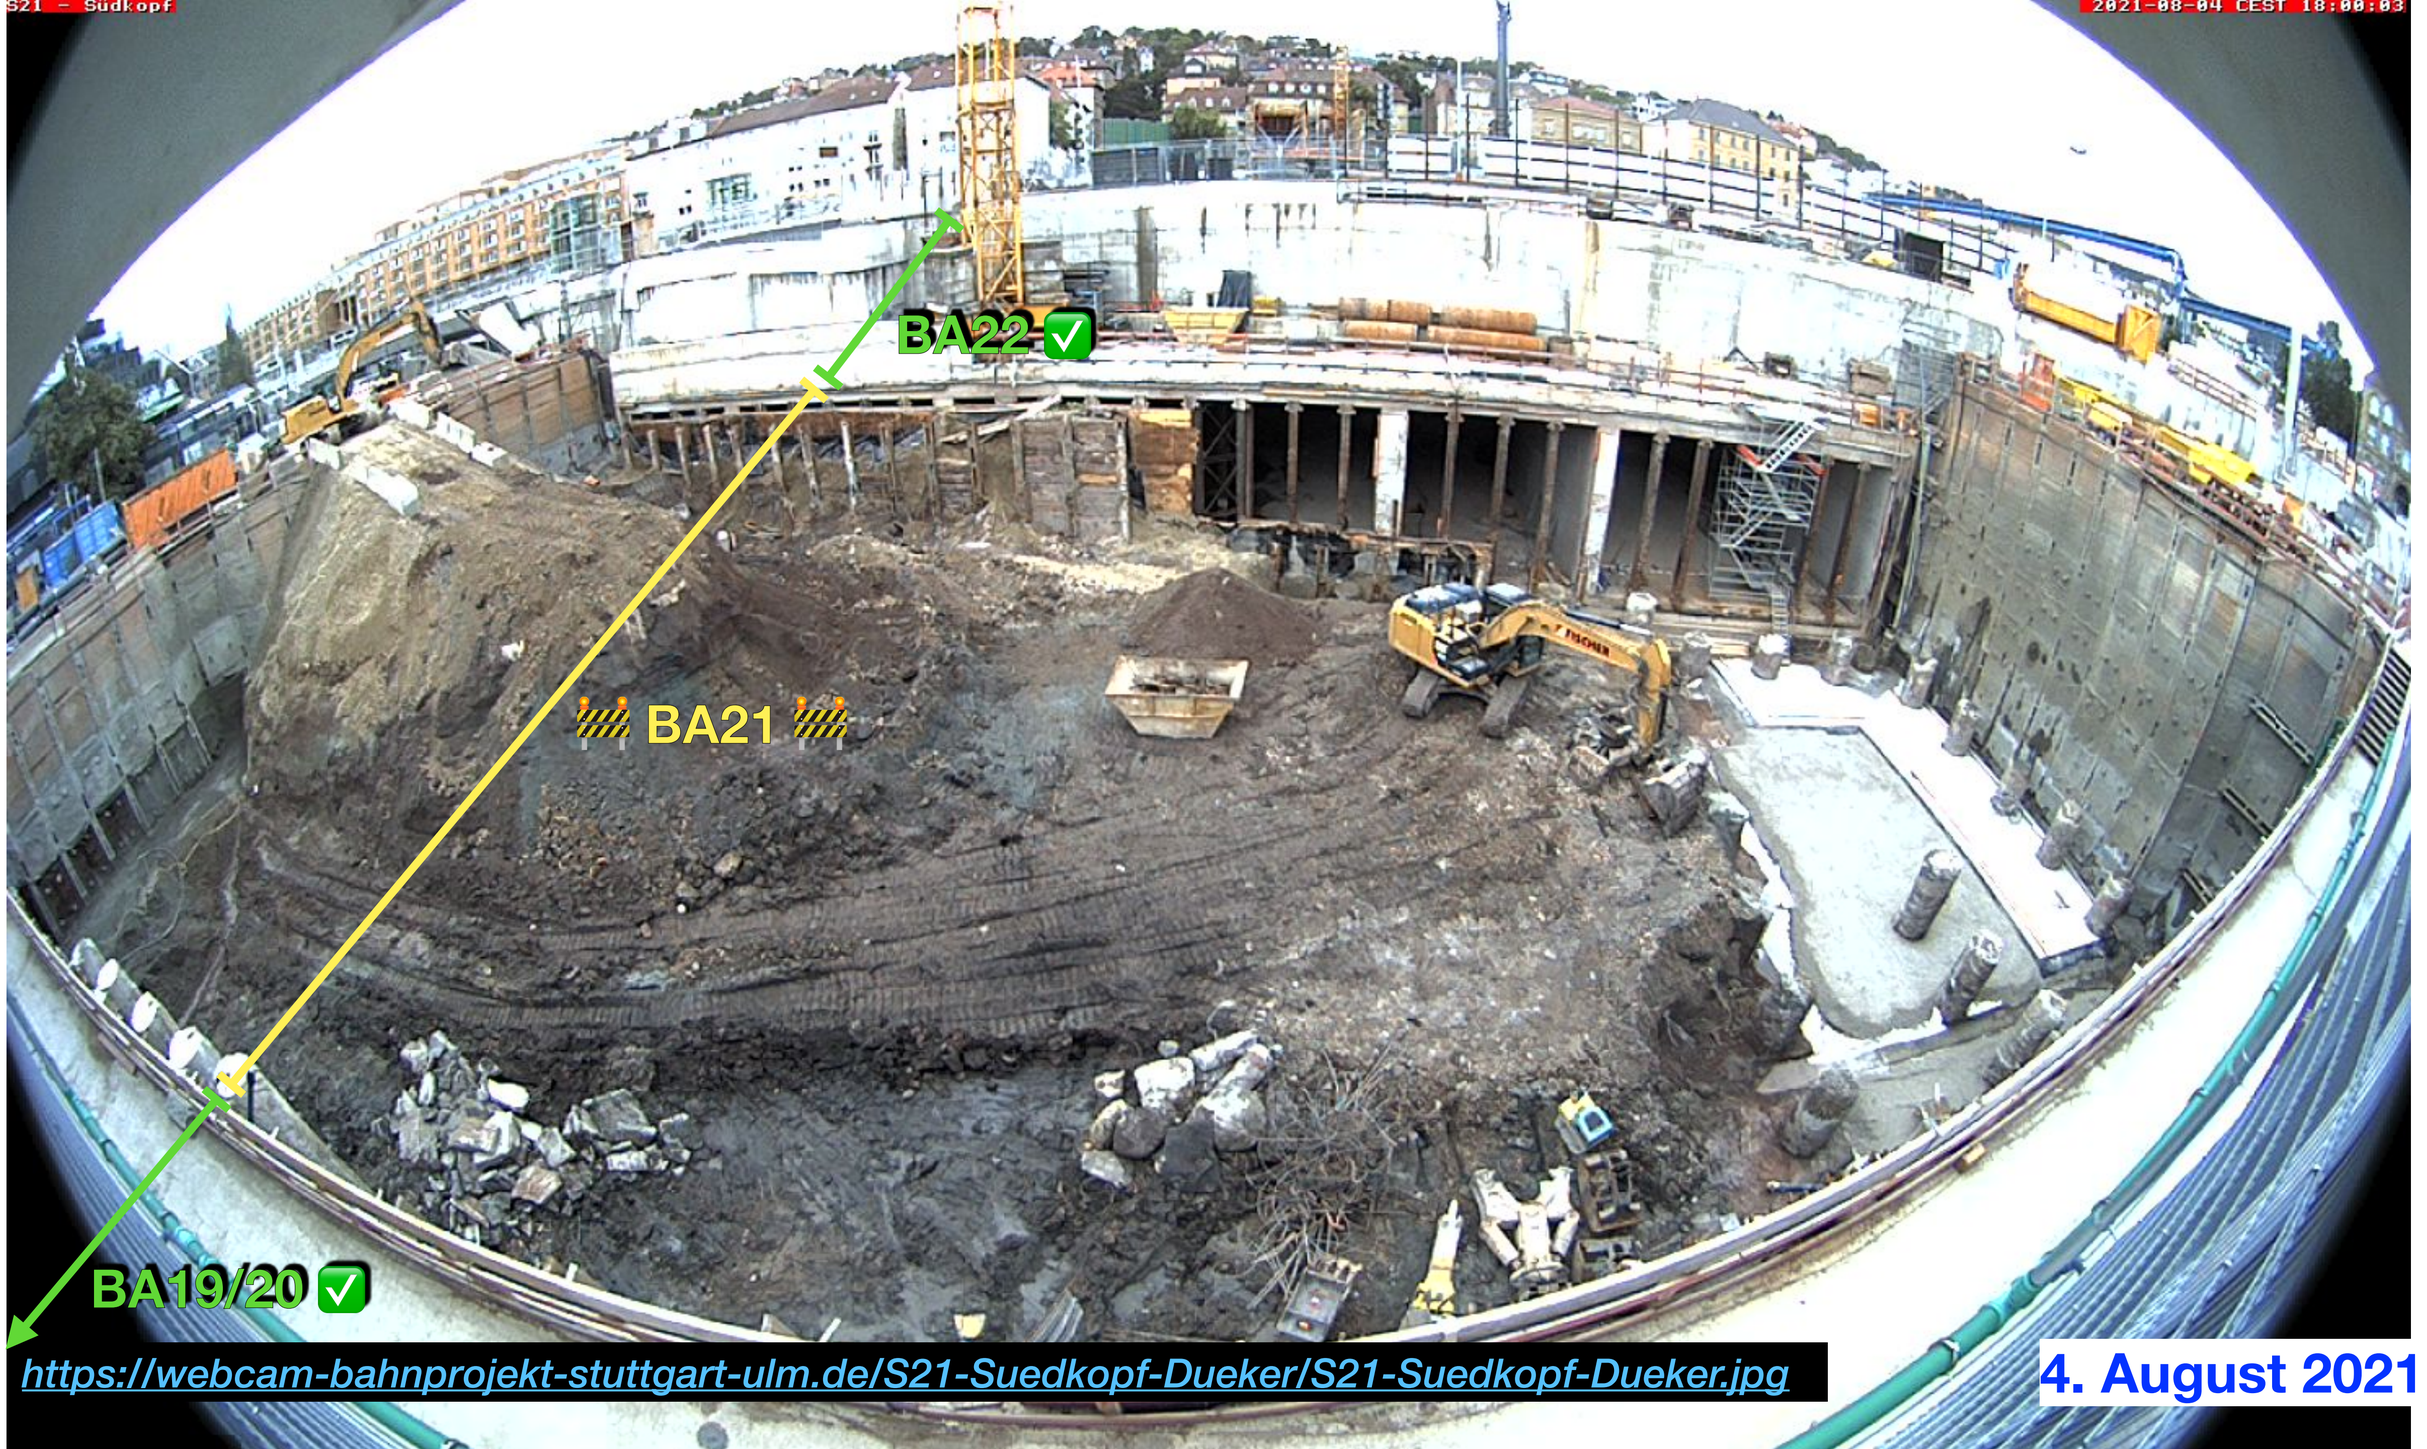
S21 - Südkopf
2021-08-04 CEST 18:00:03
BA22 ✅
BA21 🚧
BA19/20 ✅
https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Suedkopf-Dueker/S21-Suedkopf-Dueker.jpg
4. August 2021



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bonatzbau-Wandelhalle/s21-bonatzbau-wandelhalle.jpg

4. August 2021
