


26 Kelchstützen, 28 Kelchfüße ✅, 12 Restkelche, 3 Brillenwandkelche, 5 Schwindgassen komplett und 3 mit Kranaussparung



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg

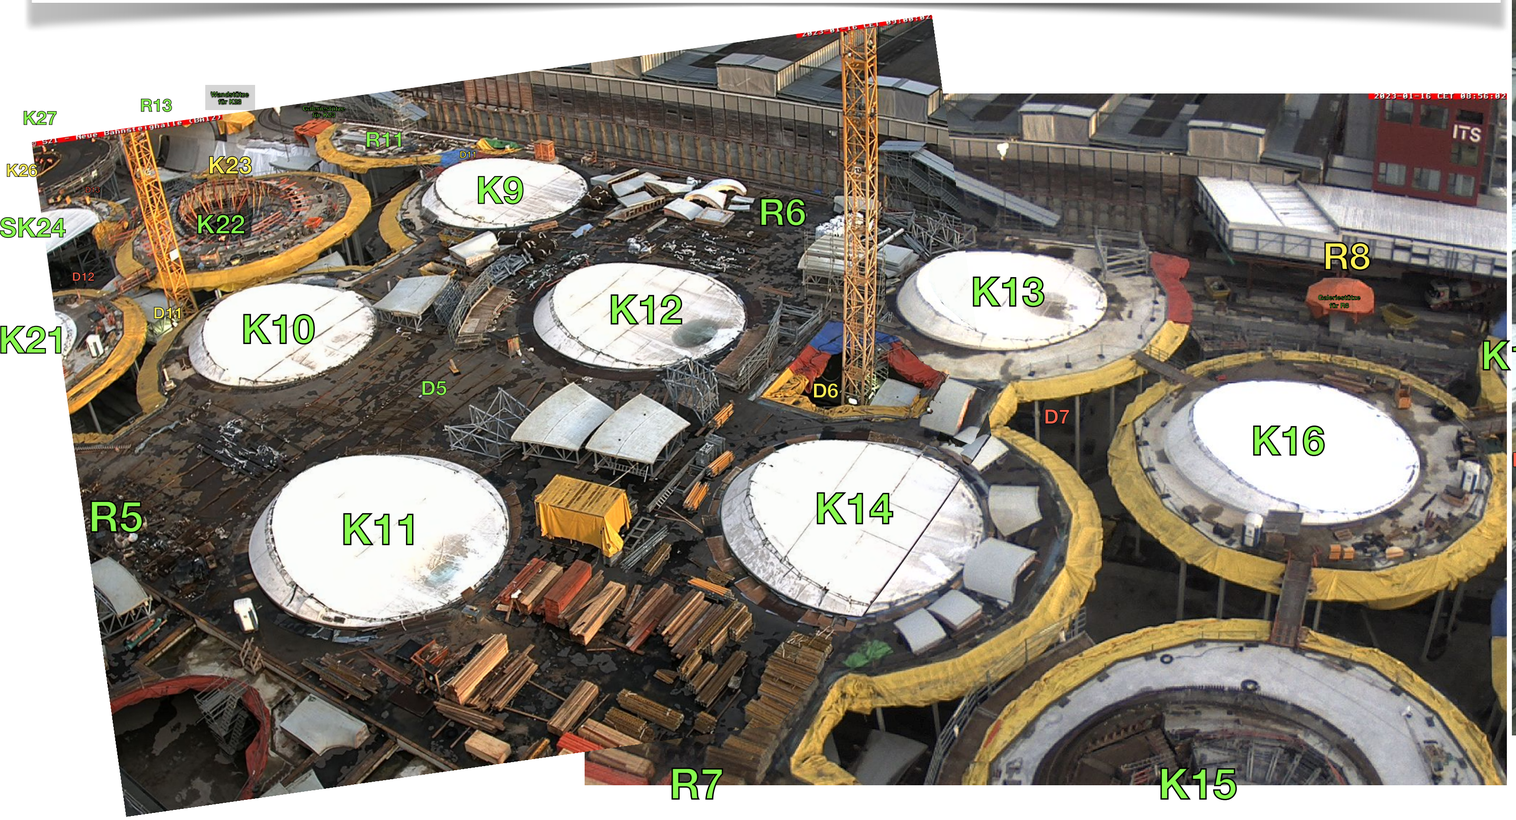


https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg


K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

16. Januar 2023

IG BÜRGER

Fertig: *26 Kelchstützen, 12 Restkelche, 3 Brillenwandkelche und 5 Schwindgassen komplett und 3 mit Kranaussparung*

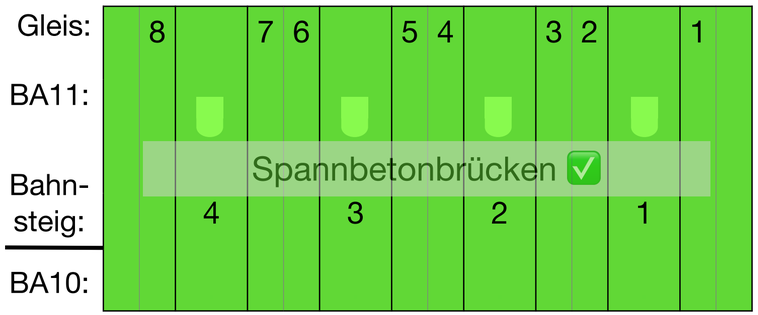

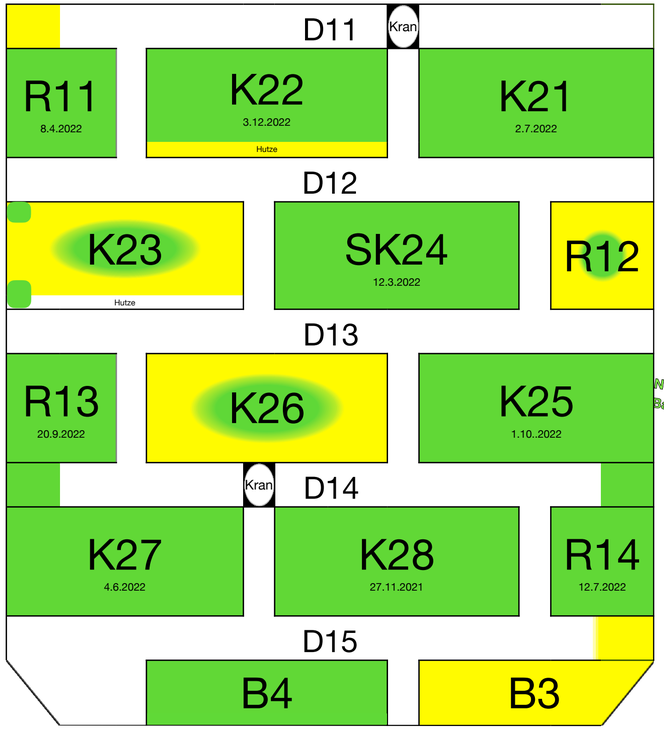



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg

K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

16. Januar 2023

IG BÜRGER

Beschriftung durch S21Bau.TV

16. Januar 2023

😴 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

✅ Gebaut:	...muss noch:	🚧 davon im Bau:
➡ 26 **K**elchstützen	2	**K26 und K23** 😀
➡ 0 Glasgitter	28+3	
➡ 12 **R**estkelche	2	**R12 und R8** 😀
➡ 3 **B**rillenwandkelche	1	**B3** 😀
✓ **28 Kelchfüße**		
✓ **16 Galerie- und 2 Wandstützen**		
➡ 5 Schwindgassen und 3 mit Kranausschnitt	7	Schalung bei: D11, D15
➡ 4 Lounge-Deckenplattenabschnitte	5	**3,** zwei bei **K21**, eine bei **R12**
➡ 2 Lounge-Oberlichtgruppen	6	



Betonage der Kelche und Schwindgassen. Montage der Glasgitter.

	Kelchblüte		Kelchfuß ✅	Hutze	Glasgitter
1	K1	20. Oktober 2018	✅ 10.06.2017	✅ 28.11.2018	
2	K10	9. März 2019	✅ 19.04.2018	✅ 03.04.2019	
3	K2	16. April 2019	✅ 03.08.2017	✅ 22.05.2019	
4	K3	7. September 2019	✅ 20.12.2017	✅ 02.10.2019	
5	K9	26. Oktober 2019	✅ 15.05.2018	✅ 20.11.2019	
6	K14	14. Dezember 2019	✅ 12.11.2018	✅ 03.02.2020	
7	K4	1. Februar 2020	✅ 10.10.2017	✅ 07.03.2020	
8	K8	2. Mai 2020	✅ 16.12.2019	✅ 03.06.2020	
9	K12	30. Mai 2020	✅ 05.11.2019	✅ 08.07.2020	
10	K18	27. Juni 2020	✅ 17.02.2020	✅ 11.08.2020	
11	K5	5. September 2020	✅ 01.03.2019	✅ 15.10.2020	
12	K20	18. November 2020	✅ 09.07.2020	✅ 05.12.2020	
13	K11	16. Dezember 2020	✅ 03.06.2020	✅ 29.01.2021	
14	K6	Berg-fest 27. Februar 2021	✅ 12.04.2019	✅ 30.03.2021	
15	K19	17. April 2021	✅ 27.08.2020	✅ 12.05.2021	
16	K13	19. Juni 2021	✅ 15.12.2018	✅ 16.07.2021	
17	K7	4. September 2021	✅ 05.12.2020	✅ 07.10.2021	
18	K28	27. November 2021	✅ 08.06.2021	—	
19	K17	5. Februar 2022	✅ 17.05.2020	✅ 01.03.2022	
20	SK24	12. März 2022	✅ 28.09.2021	—	
21	K27	4. Juni 2022	✅ 30.04.2021	—	
22	K21	2. Juli 2022	✅ 10.02.2022	✅ 27.07.2022	
23	K16	20. August 2022	✅ 05.06.2019	✅ 09.09.2022	
24	K25	1. Oktober 2022	✅ 12.11.2021	—	
25	K22	3. Dezember 2022	✅ 25.02.2022	🚧	
26	K15	10. Dezember 2022	✅ 09.05.2019		
27	K26	🚧	✅ Letzter Kelchfuß! 28.04.2022	—	
28	K23		✅ 20.01.2022		

	Restkelch		
1	R1	30. Juni 2018	
2	R2	8. Dezember 2018	
3	R6	15. Februar 2020	
4	R3	11. Juli 2020	
5	R5	30. Oktober 2020	
6	R4	3. März 2021	
7	R10	26. Mai 2021	
8	R7	9. September 2021	
9	R9	7. Dezember 2021	
10	R11	8. April 2022	
11	R14	12. Juli 2022	
12	R13	20. September 2022	
13	R12	🚧	
14	R8		

	Schwindgasse		
1	D1	20. Januar 2021	
2	D2	1.9.2021 bis auf die Kranaussparung	
3	D5	29. Juni 2021	
4	D10	16. Dezember 2021	
5	D4	14. Juni 2022	
6	D3	25. Januar 2022	
7	D6	2.8.2022 bis auf die Kranaussparung	
8	D9	27.4.2022 bis auf die Kranaussparung	
9	D11		
10	D15		
11	D14		
12	D8		
13	D7		
14	D13		
15	D12		

	Brillenwandkelch		
1	B1	29. Juli 2021	
2	B2	15. Dezember 2021	
3	B4	16. Januar 2023	
4	B3	🚧	

Glasgitter Süd und Mitte		
1		
2		
3		

16. Januar 2023

IG BÜRGER

Das tatsächliche Datum kann bei alten Daten einige Tage versetzt sein.

✅ Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:







✅	BA 1	Rohbau Schwallbauwerk Nord ✅
✅	BA 2	Die alte Bahndirektion ruht nun auf dem fertigen Tunnel ✅
✅	BA 3	
✅	BA 4-7	…sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12 ✅ https://youtu.be/i_jPqltSn4c
✅	BA 8	…mit den vier Notausgängen Nord ✅

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:


	BA 9	Brillenwandkelch B4 ist fertig und B3 wird gebaut 🚧
	BA 10	Hier wurden die letzten Abschnitte der Bodenplatte vom Tiefbahnhof fertig gestellt ✅
	BA 11	liegt über der S-Bahn und wurde mit Spannbetonbrücken gebaut. ✅ SK24 (Nordeingang) ist betoniert ✅ https://youtu.be/zuSUWow9j8A
✅	BA 12	
	BA 13	Nur noch die Kranaussparung in D6
	BA 14	Noch R8 und die Schwindgassen 😀
	BA 15	Nur noch die Kranaussparung in D9
✅	BA 16	
	BA 17	Nur noch die Kranaussparung in D2
✅	BA 18	Brillenwandkelche B1 und B2 zum Anschluß an Südkopf sind gebaut ✅





Südkopf: Bauabschnitt 19-25:

	BA 19/20	BA20 ist der Nesenbachdüker unter BA19 ✅
	BA 21	Südeingang und Notausgänge auf BA19 und BA21 müssen noch gebaut werden
✅	BA 22	…liegt unter den Zulauftunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie ✅
✅	BA 23	…war die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zulauftunneln. Betonage letzter Abschnitt 2.9.2022 ✅ (Deckenverstärkung am 8.9.2022) ➡️ Alle Zulauftunnel ✅✅✅
✅	BA 24	Rohbau Schwallbauwerk Süd ✅
✅	BA 25	



16. Januar 2023

IG BÜRGER



16. Januar 2023


https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg

S21-Bonatzbau-Wandelhalle
2023-01-16 CET 09:00:0

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bonatzbau-Wandelhalle/s21-bonatzbau-wandelhalle.jpg

16. Januar 2023

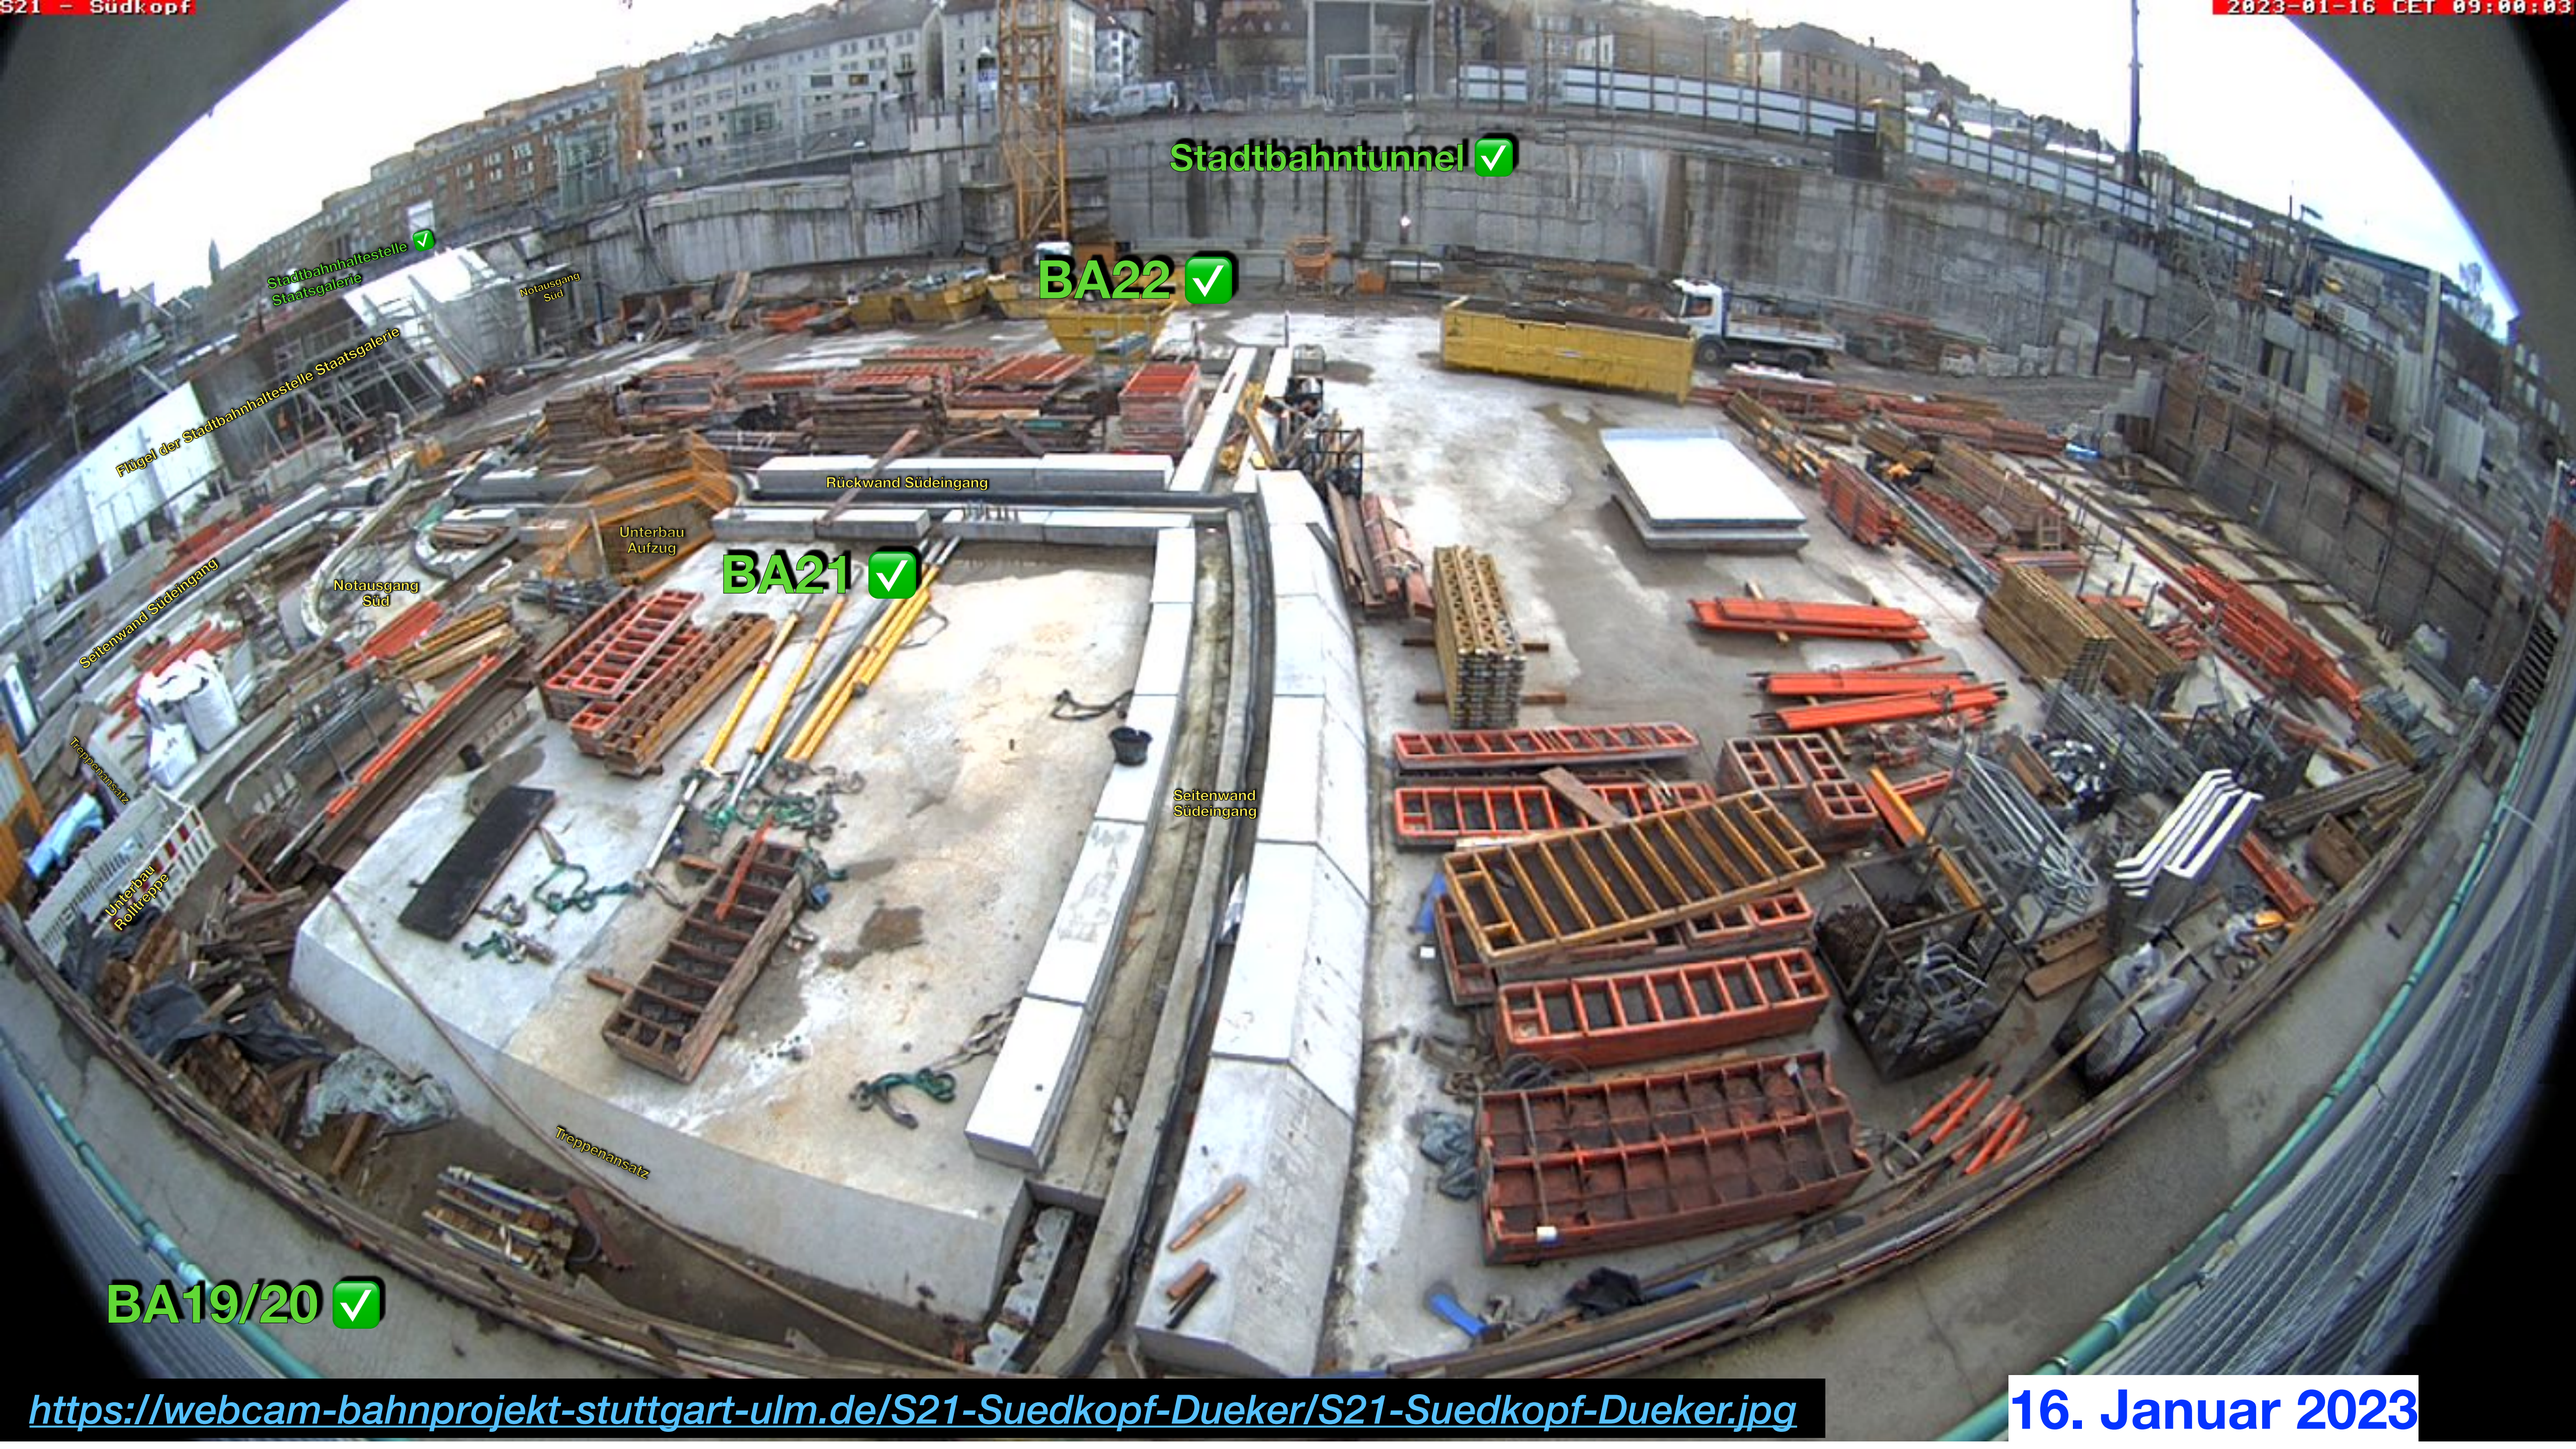



S21 - Südkopf
2023-01-16 CET 09:00:0
Stadtbahntunnel ✅
BA22 ✅
BA21 ✅
BA19/20 ✅
Stadtbahnhaltestelle ✅ Staatsgalerie
Notausgang Süd
Flügel der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie
Rückwand Südeingang
Unterbau Aufzug
Notausgang Süd
Seitenwand Südeingang
Treppenansatz
Unterbau Rolltreppe
Seitenwand Südeingang
Treppenansatz
https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Suedkopf-Dueker/S21-Suedkopf-Dueker.jpg
16. Januar 2023





16. Januar 2023

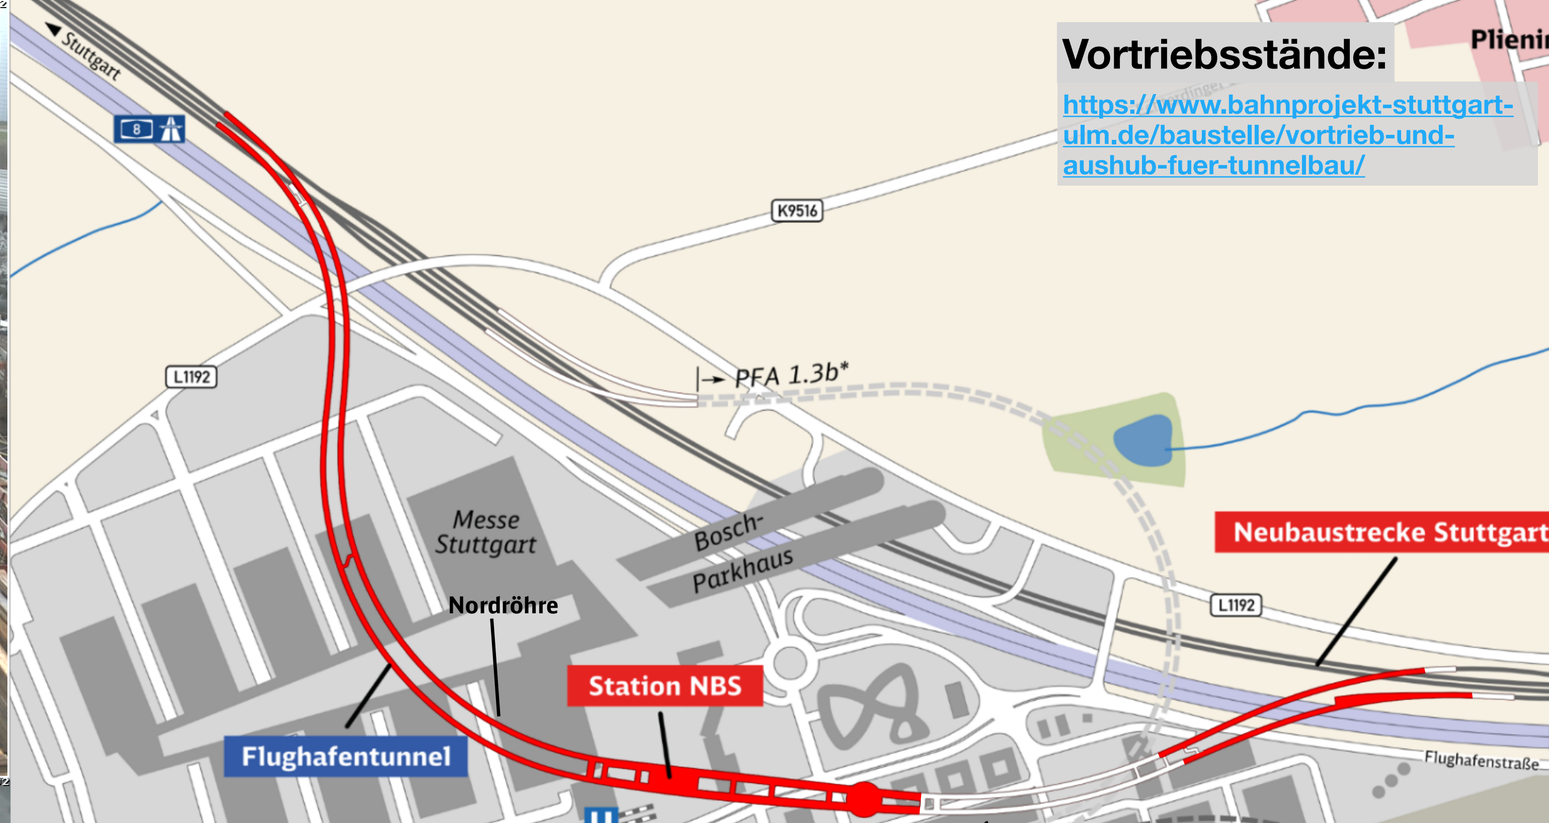

Vortriebsstände:

https://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/baustelle/vortrieb-und-aushub-fuer-tunnelbau/

Name des Tunnels / Vortrieb	Ist**	Gesamt**
Flughafentunnel (PFA 1.3a)	**3.953,04**	**4.394,89**
Tunnel für Bahngleise	**3.921,94**	**4.351,99**
Nordröhre	1.928,01	2.130,00
Südröhre	1.993,93	2.221,99
Sonstige Tunnel	**31,10**	**42,90**

Vortriebsstand: 9.1.2023

In der Nordröhre verläuft
das Streckengleis Flugha
Hauptbahnhof.
In der Südröhre verläuft s
das Streckengleis
Hauptbahnhof–Flughafe
