



# Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 .... K1-K20 .... R1-R10 .... B1 u. B2

| BA12             |        | BA13              |        | B14               |        | BA15 |        | BA16             |        | BA17              |         | BA18             |        |                 |        |                 |        |                |        |    |
|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|------|--------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|----|
| K9<br>26.10.2019 | D<br>5 | R6<br>15.2.2020   | D<br>6 | K13               | D<br>7 | R8   | D<br>8 | K17              | D<br>9 | R10               | D<br>10 | K1<br>20.10.2018 | D<br>1 | R2<br>8.12.2018 | D<br>2 | K5<br>5.9.2020  | D<br>3 | R4             | D<br>4 | B2 |
| K10<br>9.3.2019  |        | K12<br>30.5.2020  |        | K14<br>14.12.2019 |        | K16  |        | K18<br>27.6.2020 |        | K20<br>18.11.2020 |         | K2<br>16.4.2019  |        | K4<br>1.2.2020  |        | K6              |        | K8<br>2.5.2020 |        | B1 |
| R5<br>30.10.2020 |        | K11<br>16.12.2020 |        | R7                |        | K15  |        | R9               |        | K19               |         | R1<br>30.6.2018  |        | K3<br>7.9.2019  |        | R3<br>11.7.2020 |        | K7             |        |    |

✓ 13 Kelchstützen, 20 Kelchfüße, 5 Restkelche und ein Bauabschnitt ✓

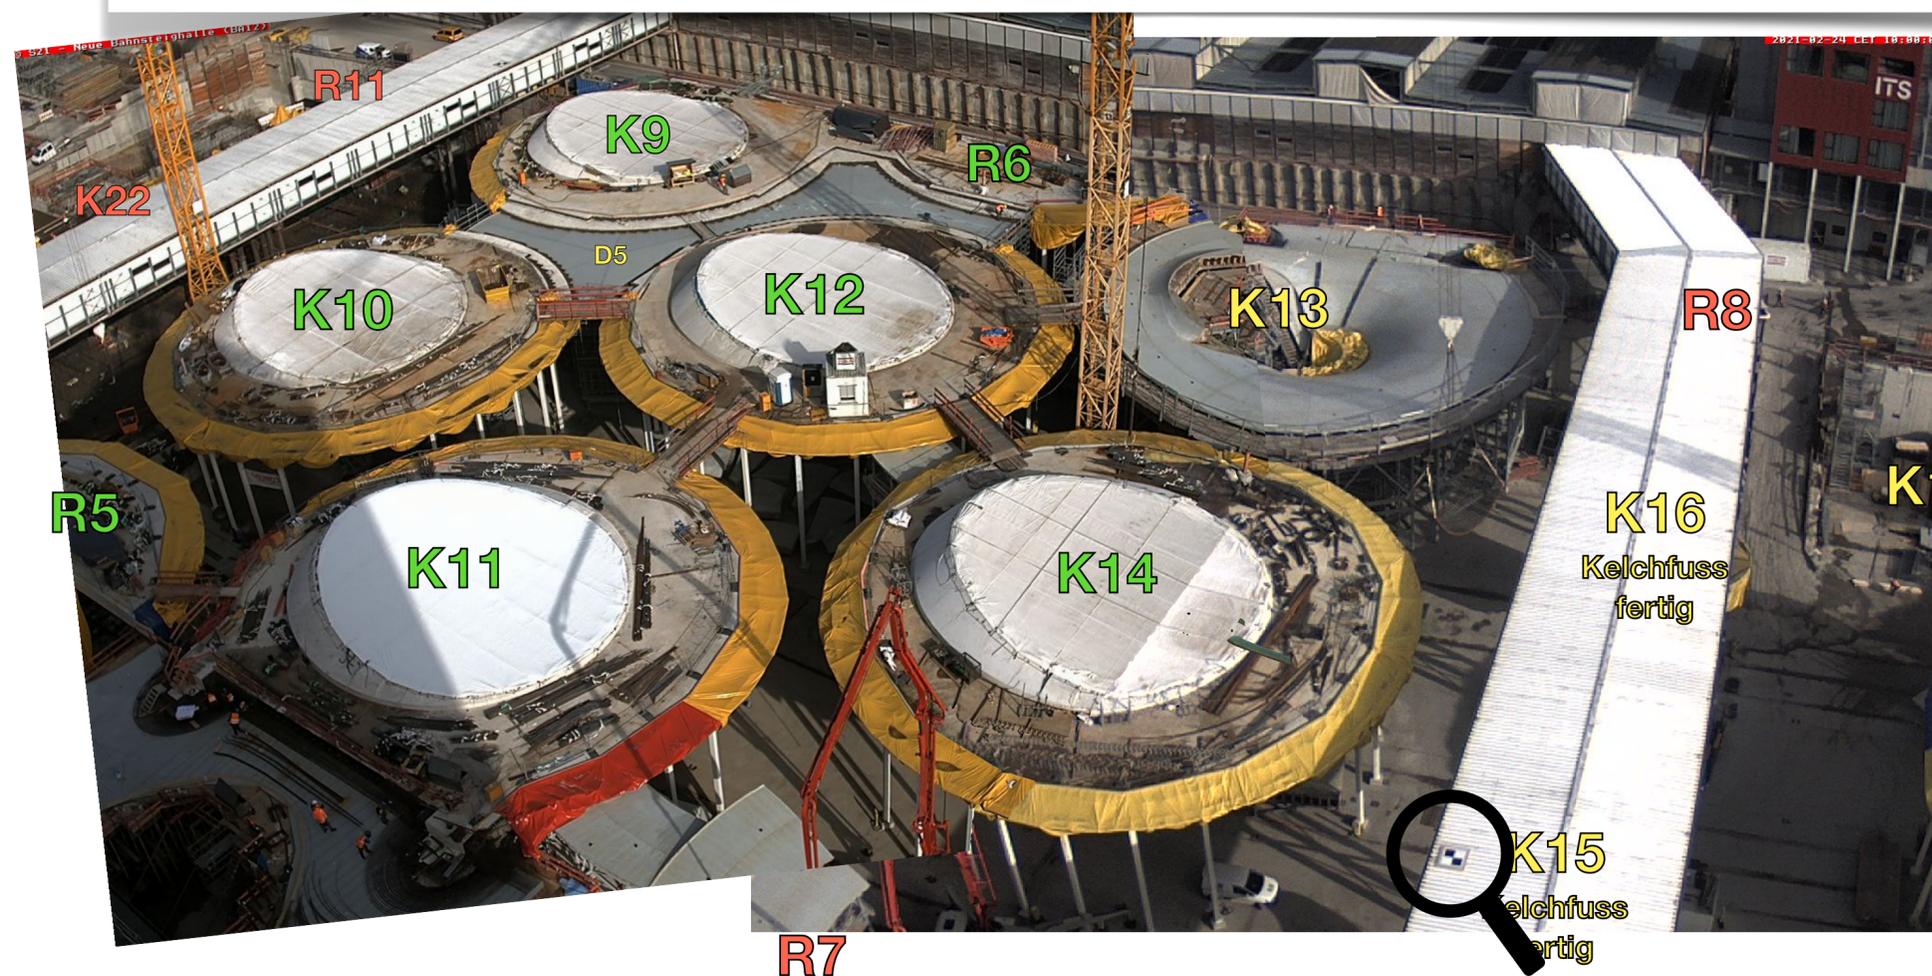

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>

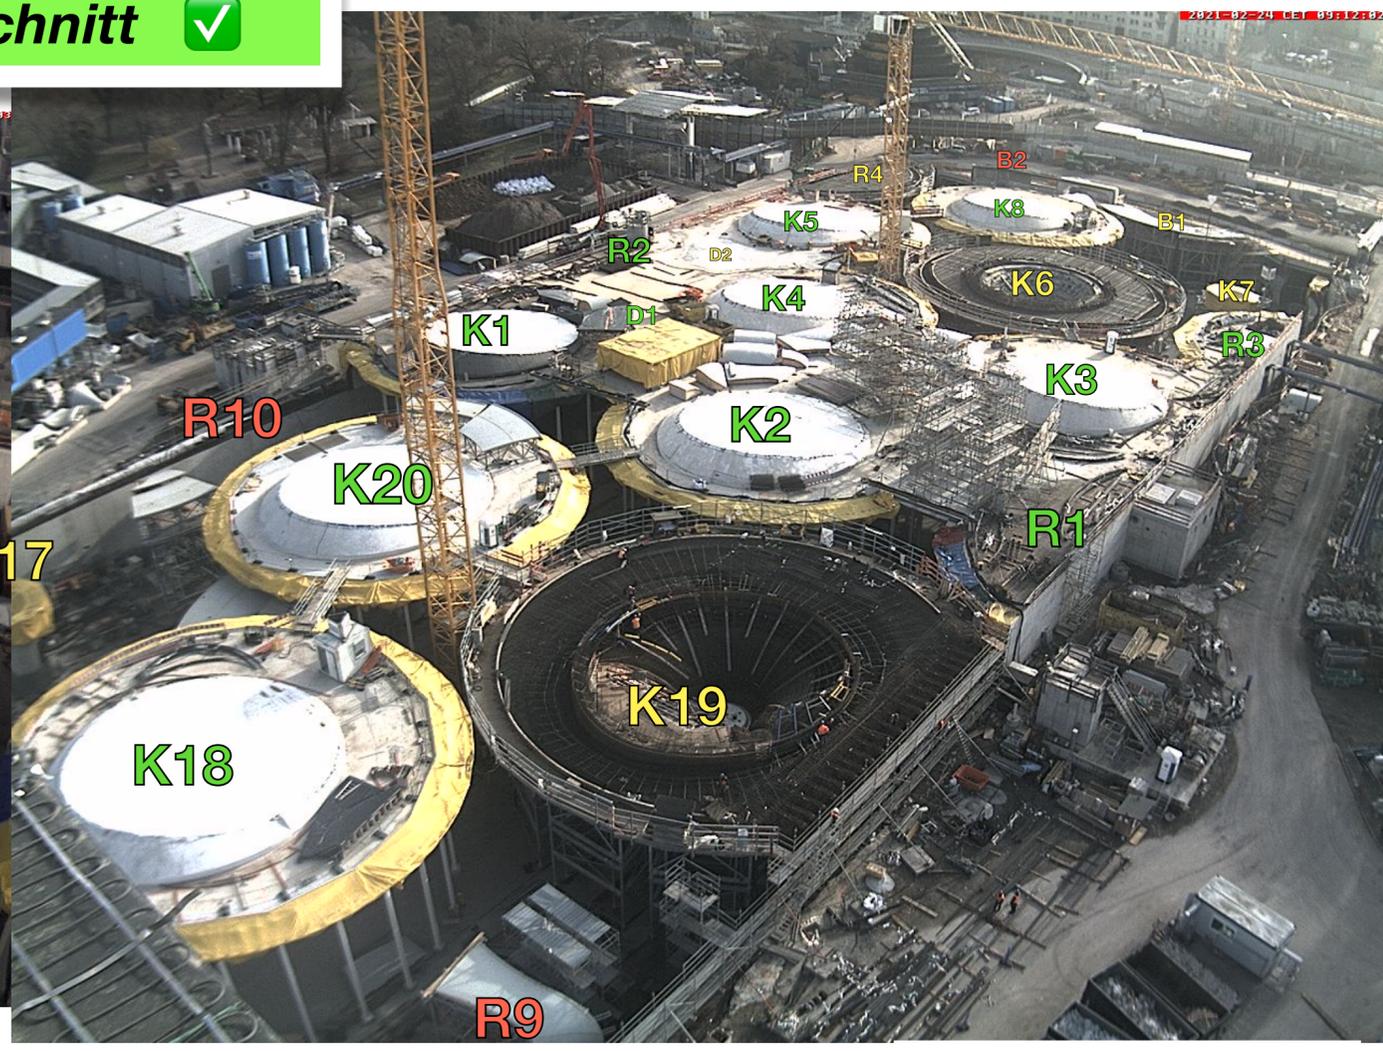

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch

24. Februar 2021



# Übersicht Bahnsteighalle: BA9-BA11 .... K21-K28 .... R11-R14 .... B3 u. B4

| BA11: Spannbetonbrücken |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleis:                  | 8 |   | 7 | 6 |   | 5 | 4 |   | 3 | 2 |   | 1 |
| Bahnsteig:              |   | 4 |   |   | 3 |   |   | 2 |   |   | 1 |   |

|      |     |      |    |     |
|------|-----|------|----|-----|
| BA11 | D11 |      |    |     |
|      | R11 | K22  |    | K21 |
| BA10 | D12 |      |    |     |
|      | K23 | SK24 |    | R12 |
| BA9  | D13 |      |    |     |
|      | R13 | K26  |    | K25 |
| BA8  | D14 |      |    |     |
|      | K27 | K28  |    | R14 |
|      | D15 |      |    |     |
|      | B4  |      | B3 |     |




<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg>

BA8

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch

24. Februar 2021

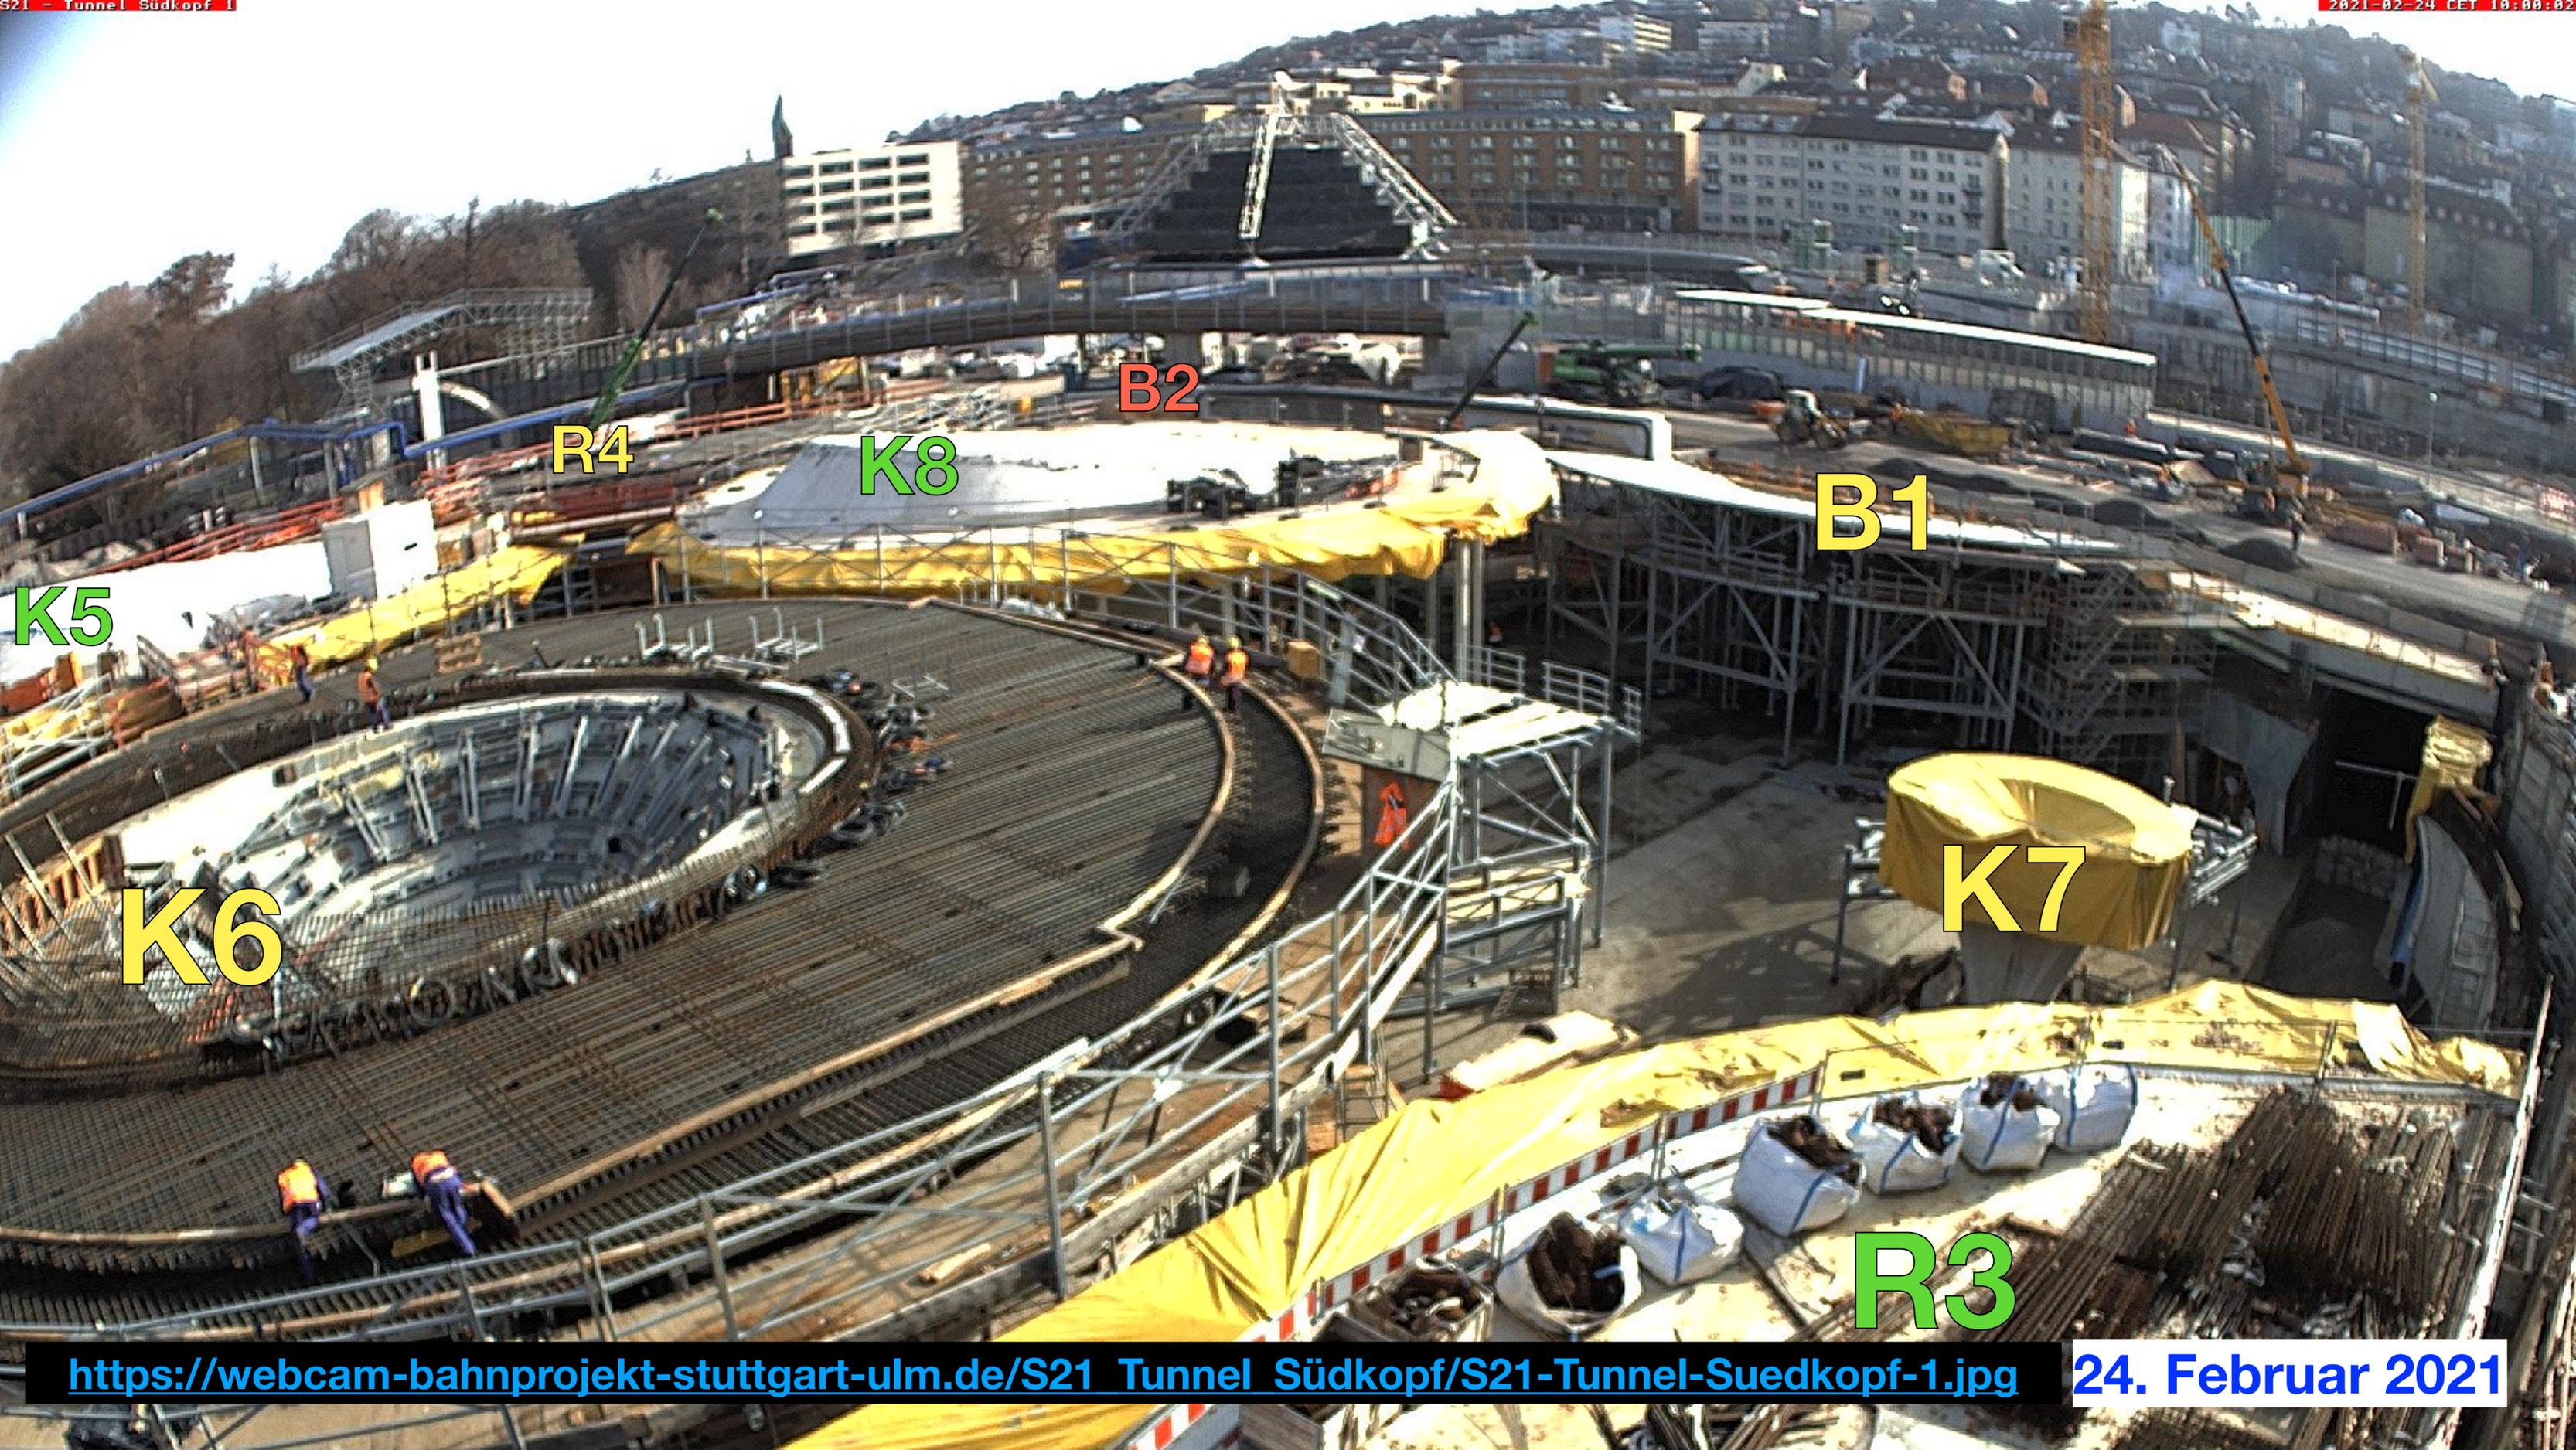

K5

R4

K8

B2

B1

K6

K7

R3

# Beschriftung durch S21Bau.TV

24. Februar 2021

🤔 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**



# Betonage der Kelchblüten, Restkelche und Schwindgassen

|    | Kelchblüte |                      | Kelchfuß / Hutze |    | Restkelch            |                  |    | Schwindgasse |                 |
|----|------------|----------------------|------------------|----|----------------------|------------------|----|--------------|-----------------|
| 1  | K1         | 20. Oktober 2018     | ✓ / ✓            | 1  | R1                   | 30. Juni 2018    | 1  | D1           | 20. Januar 2021 |
| 2  | K10        | 9. März 2019         | ✓ / ✓            | 2  | R2                   | 8. Dezember 2018 | 2  | D2           |                 |
| 3  | K2         | 16. April 2019       | ✓ / ✓            | 3  | R6                   | 15. Februar 2020 | 3  | D5           |                 |
| 4  | K3         | 7. September 2019    | ✓ / ✓            | 4  | R3                   | 11. Juli 2020    | 4  |              |                 |
| 5  | K9         | 26. Oktober 2019     | ✓ / ✓            | 5  | R5                   | 30. Oktober 2020 | 5  |              |                 |
| 6  | K14        | 14. Dezember 2019    | ✓ / ✓            | 6  | R4                   |                  | 6  |              |                 |
| 7  | K4         | 1. Februar 2020      | ✓ / ✓            | 7  |                      |                  | 7  |              |                 |
| 8  | K8         | 2. Mai 2020          | ✓ / ✓            | 8  |                      |                  | 8  |              |                 |
| 9  | K12        | 30. Mai 2020         | ✓ / ✓            | 9  |                      |                  | 9  |              |                 |
| 10 | K18        | 27. Juni 2020        | ✓ / ✓            | 10 |                      |                  | 10 |              |                 |
| 11 | K5         | 5. September 2020    | ✓ / ✓            | 11 |                      |                  |    |              |                 |
| 12 | K20        | 18. November 2020    | ✓ / ✓            | 12 |                      |                  |    |              |                 |
| 13 | K11        | 16. Dezember 2020    | ✓ / ✓ 29.1.2021  | 13 |                      |                  |    |              |                 |
| 14 | K6         | Bergfest am Samstag! | ✓                | 14 |                      |                  |    |              |                 |
| 15 | K19        |                      | ✓                |    |                      |                  |    |              |                 |
| 16 | K13        |                      | ✓                |    |                      |                  |    |              |                 |
| 17 | K7         |                      | ✓                |    |                      |                  |    |              |                 |
| 18 | K17        |                      | ✓                |    | Brillenwandrestkelch |                  |    |              |                 |
| 19 | K27        |                      | →<br>SOON        |    |                      |                  |    |              |                 |
| 20 | K16        |                      | ✓                | 1  | B1                   |                  |    |              |                 |
| 21 | K15        |                      | ✓                | 2  | B2                   |                  |    |              |                 |
| 22 | K28        |                      |                  | 3  |                      |                  |    |              |                 |
| 23 | K25        |                      |                  | 4  |                      |                  |    |              |                 |
| 24 |            |                      |                  |    |                      |                  |    |              |                 |
| 25 |            |                      |                  |    |                      |                  |    |              |                 |
| 26 |            |                      |                  |    |                      |                  |    |              |                 |
| 27 |            |                      |                  |    |                      |                  |    |              |                 |
| 28 |            |                      |                  |    |                      |                  |    |              |                 |

24. Februar 2021

**Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:**

24. Februar 2021



|                                     |        |   |
|-------------------------------------|--------|---|
|                                     | BA 1   | Südliche Hälfte fertig <input checked="" type="checkbox"/> . Nördlicher Teil: Deckenplatte wird / ist gebaut. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 2   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 3   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 4-7 | ...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 8   |   |

**Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:**

|                                     |       |   |
|-------------------------------------|-------|---|
|                                     | BA 9  | Bodenplatte, eine Seitenwand und drei Bahnsteige sind betoniert.  |
|                                     | BA 10 | Baulogrampe   |
|                                     | BA 11 | liegt über der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig. Die Spannbetonbrücken werden gebaut. Bodenplatte südlicher Teil wird armiert. |
|                                     | BA 12 |   |
|                                     | BA 13 |   |
|                                     | BA 14 |   |
|                                     | BA 15 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 16 |   |
|                                     | BA 17 |   |
|                                     | BA 18 |   |

**Südkopf: Bauabschnitt 19-25:**

|                                     |          |  |
|-------------------------------------|----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 19/20 | Ausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden. (Südausgang und Notausgänge)                                      |
|                                     | BA 21    | Im Aushub.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 22    | ...liegt unter der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (und deren Zugangstunnel) und komplett ist fertig. |
|                                     | BA 23    | ...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel. Diese werden gerade abgebrochen.                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 24    | Zugangstunnel sind fertig. Schwallbauwerk fehlt noch.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA 25    |  |
